Gestión de los Interesados



GESTIÓN DE INTERESADOS EN EL PROYECTO

"El área de conocimiento de Gestión de Interesados incluye los procesos necesarios para identificar las personas, grupos, u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, analizar sus expectativas, su nivel de impacto en los objetivos del proyecto y para desarrollar estrategias para su adecuado involucramiento en la toma de decisiones y ejecución"*

Involucra una comunicación continua con los interesados a fin de atender los siguientes aspectos:

- Entender necesidades y expectativas
- Atender inconvenientes cuando ocurran
- Gestionar conflictos de intereses
- Integrar a los interesados en la dinámica del proyecto

Cada proyecto tendrá interesados que impactarán positiva o negativamente en sus objetivos. Algunos tendrán bajo nivel de influencia pero otros podrán comprometer su continuidad.


UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

INTERESADOS EN EL PROYECTO

*"Individuos y organizaciones activamente involucrados en el proyecto, y que pueden influir en sus objetivos"**

Los interesados en el proyecto son:

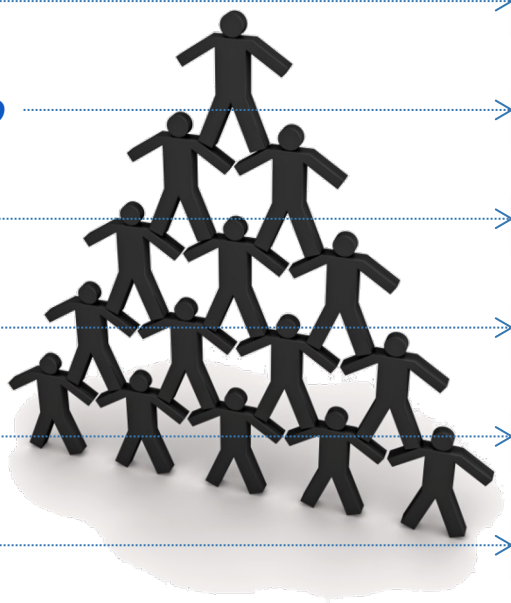

PATROCINADOR	*Proporciona recursos*
DIRECTOR DEL PROYECTO	*Responsable de dirigir*
EQUIPO DEL PROYECTO	*Realiza el trabajo de proyecto, incluye al PM. Los miembros del equipo pueden tener dedicación exclusiva o parcial*
CLIENTE	*Accede al producto o servicio del proyecto*
USUARIO	*Es el destinatario final del producto o servicio*
OTROS INTERESADOS	*Personas u Organizaciones afectadas en sus intereses por el proyecto y que pueden influir sobre él*

Un interesado puede ocupar más de un rol en el proyecto. Así, por ejemplo, el cliente puede ser la misma persona que el usuario o el patrocinador.
Es importante diferenciar la dinámica que implica el rol que está ejerciendo en cada caso.

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Gestión de Interesados en el Proyecto

Identificación de Interesados — Inicio

Planificación del Involucramiento de los Interesados — Planificación

Gestionar Involucramiento de Interesados — Ejecución

Monitorear el Involucramiento de los Interesados — Seg. & Ctrol

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

GESTIÓN DE INTERESADOS EN EL PROYECTO

Identificación de Interesados

Inicio

Planificación del Involucramiento de los Interesados

Planificación

Gestionar Involucramiento de Interesados

Ejecución

Monitorear el Involucramiento de los Interesados

Seg. & Ctrol

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS

Entradas

1.Acta de const. del proyecto

2.Documentos de Negocio

- Caso de Negocio
- Plan de Gestión de Beneficios

3.Plan de Gestión de Proyecto

- Comunicaciones
- Involucramiento de interesados

4.Documentos del Proyecto

- Registro cambios
- Registro incidentes
- Documentación de requisitos

5.Acuerdos

6.Factores ambientales

7.Activos de los procesos

H. & T.

1.Análisis de datos

- Análisis de interesados
- Análisis de documentos

2.Juicio de expertos

3.Reuniones

4.Recopilación de datos

- Cuestionarios y encuestas
- Tormenta de ideas

5.Representación de datos

- Mapeo / Representación de interesados

Salidas

1.Registro de interesados

2.Solicitudes de cambio

3.Actualizaciones para el plan de gestión de proyecto

4.Actualiaciones para los documentos del proyecto

Implica la identificación de todas las personas, grupos u organizaciones a las cuales puede afectar el proyecto y la documentación de sus intereses, nivel de participación y de impacto sobre el éxito del proyecto

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS

H. & T.

1.Análisis de datos
- Análisis de interesados
- Análisis de documentos


2.Juicio de expertos

3.Reuniones

4.Recopilación de datos
- Cuestionarios y encuestas
- Tormenta de ideas

5.Representación de datos
- Mapeo / Representación de interesados

- Identificar los interesados potenciales y su información relevante (roles, departamentos, intereses, nivel de experiencia e influencia, etc.).
- Investigar cómo los interesados clave reaccionarían o responderían ante distintas situaciones.

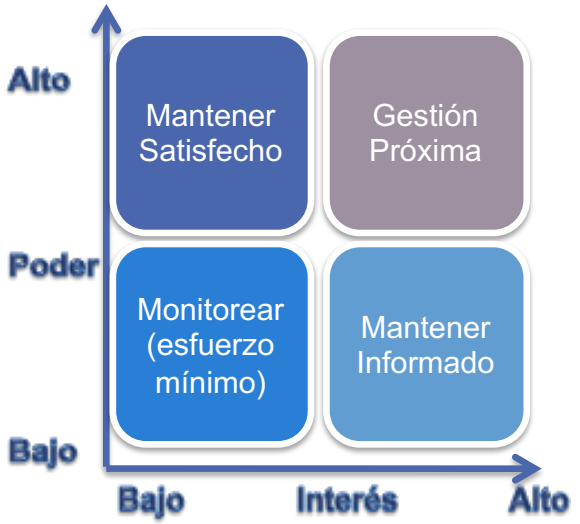

Ejemplo de grilla "Poder / Nivel de Interés"

Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (*PMBOK® Guide*) – Sixth Edition. Página 507

Usted es el director de proyectos para la construcción de una línea de transporte, su cliente es:



1. El organismo público que lo contrató.
2. El ciudadano que tomará el transporte.
3. El Ministerio de Transporte quien operará el servicio.
4. Su jefe directo dentro de la estructura.

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

GESTIÓN DE INTERESADOS EN EL PROYECTO

Identificación de Interesados

Inicio

Planificación del Involucramiento de los Interesados

Planificación

Gestionar Involucramiento de Interesados

Ejecución

Monitorear el Involucramiento de los Interesados

Seg. & Ctrol

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE INTERESADOS

Es el proceso de definir estrategias adecuadas para involucrar a los interesados en la dinámica del proyecto

Entradas

1.Plan de Gestión del Proyecto

- Plan de Gestión de los Recursos
- Plan de Gest. de las Comunicaciones
- Plan de Gestión de los Riesgos

2.Documentos del proyecto

- Registros de Supuestos
- Registros de Cambios
- Registros de Incidentes
- Cronograma
- Registros de Riesgos
- Registros de Interesados

3.Factores amb. de la empresa

4.Activos de los proc. de la org.

5.Acta de Constitución

6.Acuerdos

H. & T.

1.Juicio de expertos

2.Reuniones

3.Análisis de datos

- Análisis de Supuestos y Restricciones
- Análisis de Causa Raíz

4.Recopilación de datos

- Estudios comparativos

5.Toma de decisiones

- Priorización / Clasificación

6.Representación de datos

- Mapeo Mental
- Matriz de evaluación participación interesados

Salidas

1.Plan de Involucramiento de Interesados.

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE INTERESADOS

H. & T.

1.Juicio de expertos

2.Reuniones

3.Análisis de datos

- Análisis de Supuestos y Restricciones
- Análisis de Causa Raíz

4.Recopilación de datos

- Estudios comparativos

5.Toma de decisiones

- Priorización / Clasificación

6.Representación de datos

- Mapeo Mental
- Matriz de evaluación participación interesados

El nivel de involucramiento de los interesados se puede clasificar utilizando el siguiente esquema:

- Desconoce: no percibe al proyecto y su impacto
- Resiste: resiste el cambio
- Neutral: indiferente hacia el proyecto y sus objetivos
- Apoya: ayuda el cambio
- Lidera: activamente involucrado en la cotidianeidad del proyecto para potenciar las probabilidades de éxito.

Interesado	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder
Interesado 1	C			D	
Interesado 2			C	D	
Interesado 3				D C	

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (*PMBOK® Guide*) – Sixth Edition. Página 516

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE INTERESADOS

Es el proceso de definir estrategias adecuadas para involucrar a los interesados en la dinámica del proyecto

Salidas

1.Plan de Involucramiento de Interesados.

- Niveles de involucramiento real y deseado de los interesados
- Alcance e impacto de cambios sobre los interesados
- Relaciones identificadas y eventuales superposiciones entre interesados
- Información a ser distribuida
- Motivos para la distribución de la información
- Frecuencia y formato de la información a distribuirse
- Mecanismos de actualización del plan

GESTIÓN DE INTERESADOS EN EL PROYECTO

Identificación de Interesados

Inicio

Planificación del Involucramiento de los Interesados

Planificación

Gestionar Involucramiento de Interesados

Ejecución

Monitorear el Involucramiento de los Interesados

Seg. & Ctrol

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

GESTIONAR INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS

"Implica comunicarse y trabajar con los interesados para cubrir sus necesidades y expectativas, resolver inconvenientes y generar una adecuada integración ."*

Entradas

1.Plan de gestión de proyecto
- Comunicaciones
- Riesgos
- Involucramiento Interesados
- Cambios

2.Documentos del Proyecto
- Registro de Cambios
- Registro de Incidentes
- Registro de Lecciones Aprendidas
- Registro de Interesados

3.Factores Ambientales

4.Activos de los procesos de la organización

H. & T.

1.Juicio de Expertos

2.Habilidades de comunicación
- Retro-alimentación

3.Habilidades interpersonales
- Gestión de Conflictos
- Conciencia Cultural
- Negociación
- Observación / Conversación
- Conciencia Política

4.Reglas Básicas

5.Reuniones

Salidas

1.Solicitudes de cambio

2.Actualización a Plan de Gestión del Proyecto
- Comunicaciones
- Involucramiento interesados

3.Actualización a documentación del proyecto
- Registro de Cambios
- Registro de Incidentes
- Registro de Lecciones Aprendidas
- Registro de interesados

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

GESTIÓN POSITIVA DEL CONFLICTO

Método	Mecanismo	Orden de Preferencia y Situación que Genera	
Solucionar el Problema (Problem Solving)	Resolver la causa de fondo del problema hasta que el mismo desaparezca	1	Ganar - Ganar
Llegar a un acuerdo (Compromising)	Considerar distintos enfoques, proponer tratos y buscar soluciones que procuren satisfacer de alguna manera a las partes involucradas	2	Ganar – Ganar Perder – Perder
Retirarse – Ceder (Withdrawal)	Postergar la resolución del desacuerdo para el futuro	3	Perder - Perder
Apaciguar – Suavizar (Smoothing)	Desacentuar diferencias y acentuar acuerdos	3	Perder - Perder
Forzar (Forcing)	Imponer un punto de vista a expensas del resto de las partes	4	Perder - Ganar

Ver el video "godfather meeting 5 families":


- *¿Qué técnica de resolución de conflicto se aplica?.*
- *¿Cuán sostenible se percibe la solución en el tiempo?.*

https://www.youtube.com/watch?v=6Gm9p8zNMKc

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (*PMBOK® Guide*) – Sixth Edition. Página 352

Usted es el director de proyectos para la construcción de una planta de celulosa para la industria papelera, los planos y normativas de la obra ya han sido aprobados por todos los organismos internos y externos. Un grupo de vecinos de la zona ha iniciado protestas por temas de contaminación. Usted debería:




1. Avanzar con la construcción ya que todo se encuentra en regla y es legal.
2. Informar al área de relaciones institucionales respecto de la situación.
3. Identificar a los líderes de la moviización e invitarlos a participar de la dinámica del proyecto.
4. Convocar una reunión de equipo de proyecto para analizar alternativas y definir un curso de acción.

EVOLUCIÓN TEORÍAS MOTIVACIONALES

MECANICISTAS

¿Cómo hay que organizar?

- Dan por supuesto que la gente hará lo que se les dice




- Lo único que se debe definir es por cuánto lo harán
- Incentivos se relacionan con la producción
- Quedó claro que el dinero no mueve a las personas siempre
- Conciencia de tomar en cuenta las dimensiones psicológicas del trabajador
- Estudios (Hawthorne /Mayo GE) motivación no procedía de incentivos sino del entorno social y su interacción

PSICOSOCIOLÓGICOS

La empresa es un Organismo Social

- Las personas participan para conseguir otras necesidades además de los incentivos que le ofrece la empresa

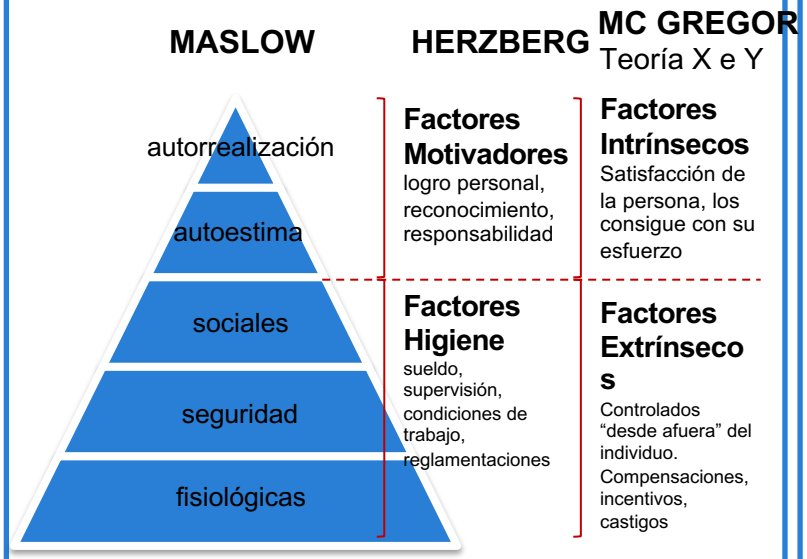

ANTROPOLÓGICOS

Existe otro tipo de motivos

- Aparece la motivación <u>trascendente</u>

Motivos Trascendentes
Resultado que la acción provoca en otras personas distintas de quien ejecuta la acción
Ej: alimentar a tu hijo, ayudar a un compañero

Motivos Intrínsecos
Resultado de la ejecución de la acción para la persona que la realiza y que depende tan sólo del hecho de realizarla
Ej: aprendizaje, gusto por perfeccionarme

Motivos Extrínsecos
Incentivo que se atribuye a la realización de la acción por parte de otra persona distinta de aquella que ejecuta la acción
Ej: retribución en un trabajo, felicitaciones que se reciben


UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Fuente: Juan Antonio Perez López, Las Motivaciones Humanas, NT de la División de Investigación del IESE, Marzo 1985

VÍNCULOS DE PERTENENCIA Y COMPROMISO

MTp = *ƒ*(ME, MI, MTR)

La motivación de una persona a pertenecer a determinada organización viene dada por el peso conferido de cada motivación y de la alineación de dicha organización con esos

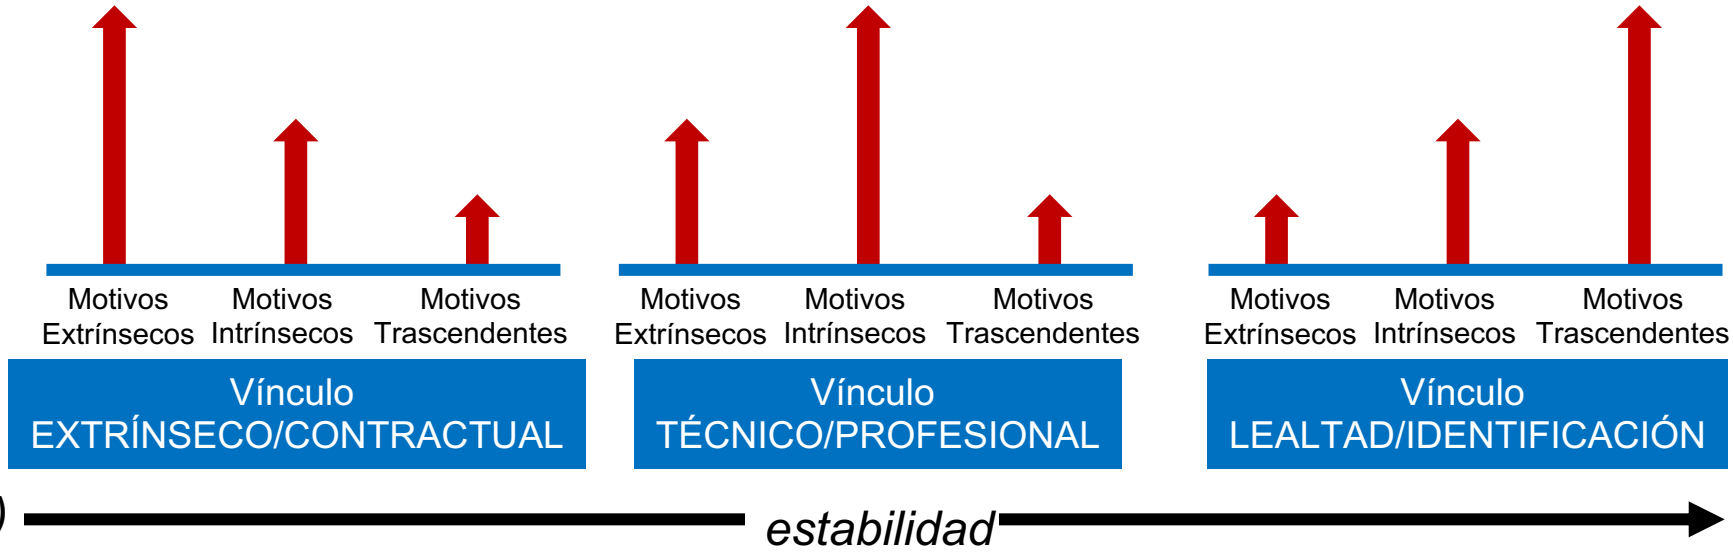

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

Fuente: Nuria Chinchilla, Vínculos de pertenencia y compromiso con la organización, NT de la División de Investigación del IESE, Marzo 2000


EJERCICIO

Video Horrible Bosses

- *Identificar en cada caso el tipo de vínculo de pertenencia establecido*
- *¿Son todos mecanismos motivacionales?*

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

LIDERAZGO EQUIPO DE PROYECTO

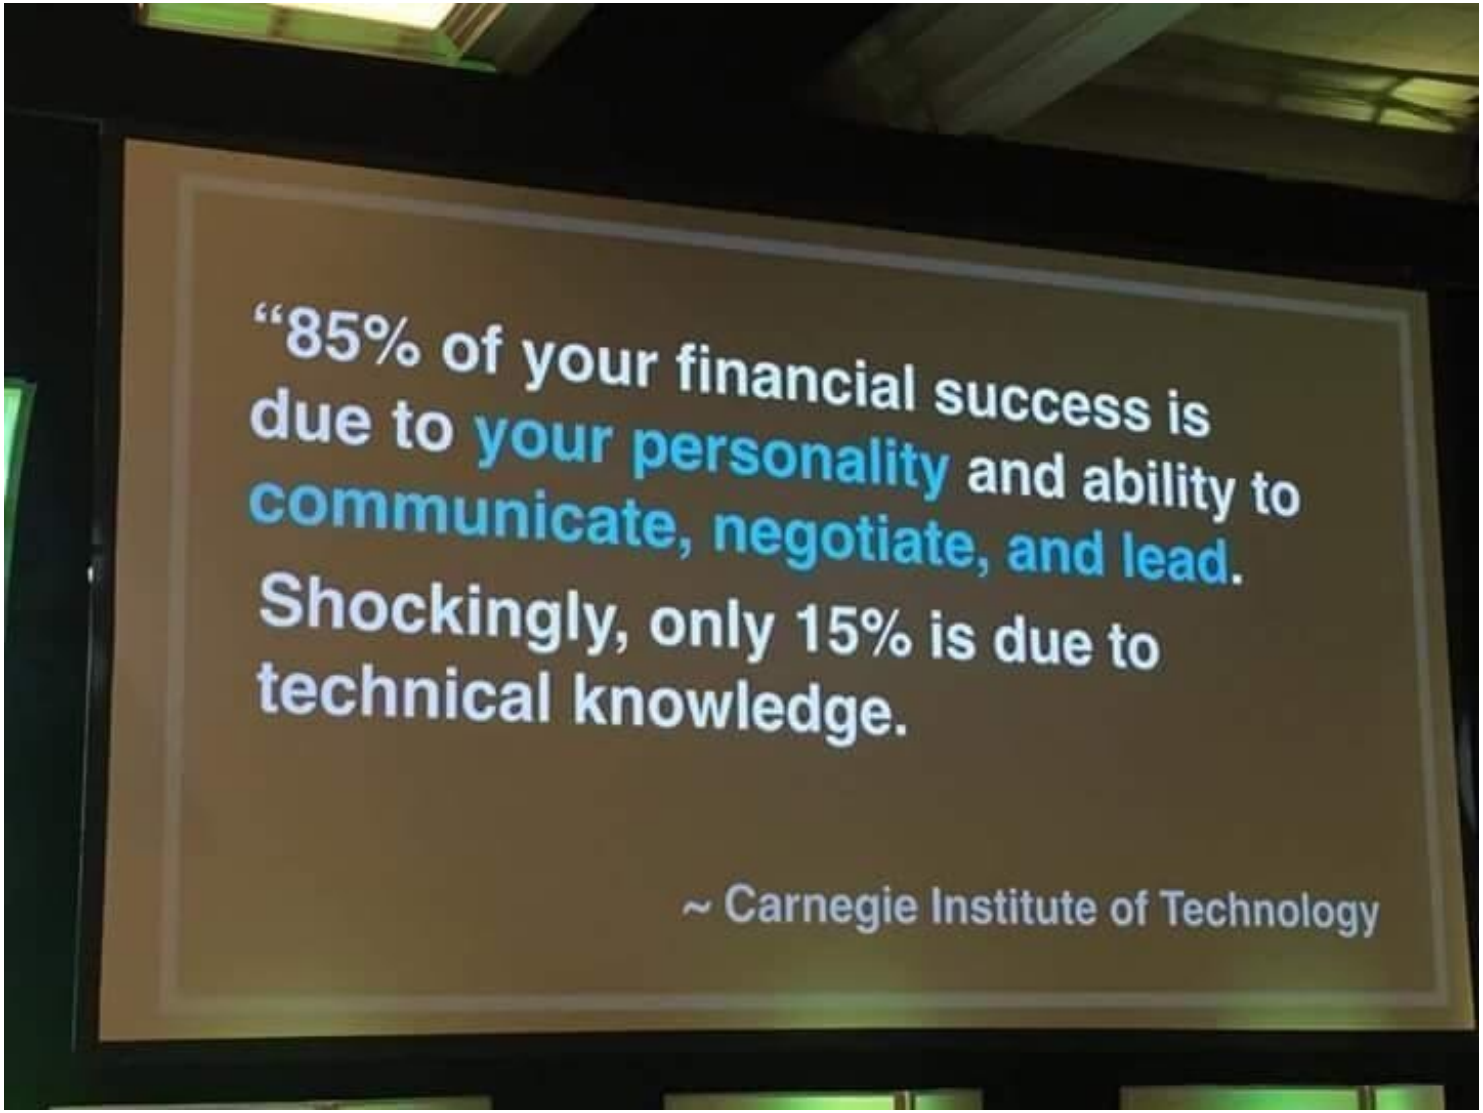

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

GESTIÓN DE INTERESADOS EN EL PROYECTO

Identificación de Interesados

Inicio

Planificación del Involucramiento de los Interesados

Planificación

Gestionar Involucramiento de Interesados

Ejecución

Monitorear el Involucramiento de los Interesados

Seg. & Ctrol

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Monitorear el Involucramiento de los Interesados

Implica monitorear a los interesados del proyecto, sus interrelaciones y ajustar estrategias y planes para mantenerlos involucrados

Utiliza información de cómo se utilizan los recursos del proyecto para alcanzar sus objetivos, respecto al:

- Alcance
- Cronograma
- Costos
- Calidad
- Riesgo (dependiendo del proyecto)
- Adquisiciones (dependiendo del proyecto)

Monitorear el Involucramiento de los Interesados

Identificación de Interesados | Planificación de Gestión de Interesados. | Gestionar Involucr. De Interesados | **Controlar Involucr. De Interesados**

Entradas

1.Plan de Gestión del Proyecto

- Comunicaciones
- Riesgos
- Interesados
- Cambios

2.Documentos del proyecto

- Registro de Cambios
- Registro de Incidentes
- Registro de Lecciones Aprendidas
- Registro de Interesados

3.Factores Ambientales

4.Activos de los Proc. de la Organización

5.Datos de Desempeño

H. & T.

1.Análisis de datos

- Análisis de Alternativas
- Análisis de Causa Raíz
- Análisis de Interesados

2.Toma de decisiones

- Criterios Múltiples
- Votación

3.Representación de datos

- Matriz de evaluación participación interesados

4.Habilidades de comunicación

- Retro-Alimentación
- Presentaciones

5.Habilidades interpersonales y de equipo

6.Reuniones

Salidas

1.Información de Desempeño

2.Cambios solicitados

2.Actualizaciones para el plan de gestión del proyecto

3.Actualizaciones para documentos del proyecto

- Registro de Incidentes
- Registro de Lecciones Aprendidas
- Registro de Interesados
- Registro de Riesgos

UNIVERSIDAD DEL CEMA UCEMA

EJERCICIO

Ver videos "Conflicto Papelera Botnia" y comparar con "Hospital de Niños Alberta":

- *¿Qué reflexión despierta cada caso respecto a la gestión de interesados?.*
- *¿Cuán importante es para el éxito de un proyecto?.*

https://www.youtube.com/watch?v=MdYktOZrqHA

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA
