

Programa Ejecutivo en Project Management

Clase 9 - Gestión de la Comunicación


gestión de la comunicación
teamwork
share
idea
vision
Like
ok
Like!
project
Big Idea
Strategy!
plan
target
@ planing
team work
IDEA
@ Success!
growth
idea
team
think
work
talk
network
OK!
mail
plan
think


¿quién arma un plan
de comunicación en
su proyecto?

¿Cuándo comunicamos?

¿Cuáles son los elementos que intervienen en la gestión de la Comunicación?



¿Qué cosas debemos tener en cuenta para gestionarla exitosamente en nuestros proyectos?

el mensaje




- Recado
- Nuevas = Información
- Adecuado, exacto, modo

el contexto



- Lugar
- Momento
- Cultura (emisor y receptor)


el modelo

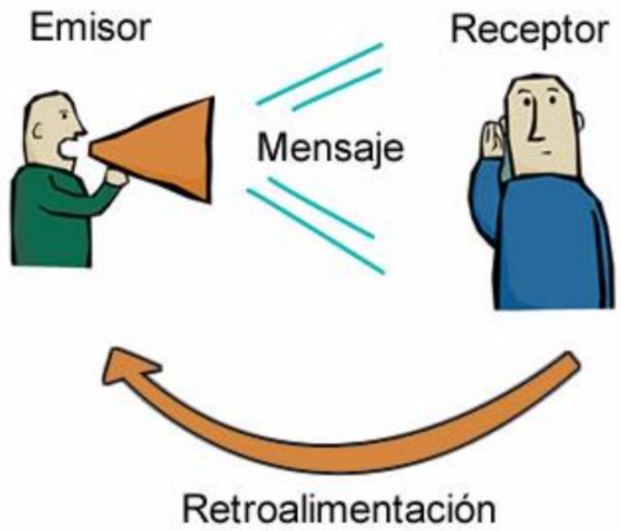

- Emisor - Receptor
- Canal
- Ruidos | Barreras
- Formatos
- Digital (herramientas actuales)

comunicación en los proyectos

- ¿Cuántas veces borraste un correo de voz sin escucharlo hasta el final?
- ¿Tu buzón de entrada está inundado de correos electrónicos sin abrir?
- ¿Cuántas veces un miembro del equipo no recibió información importante que podría haber afectado su trabajo?

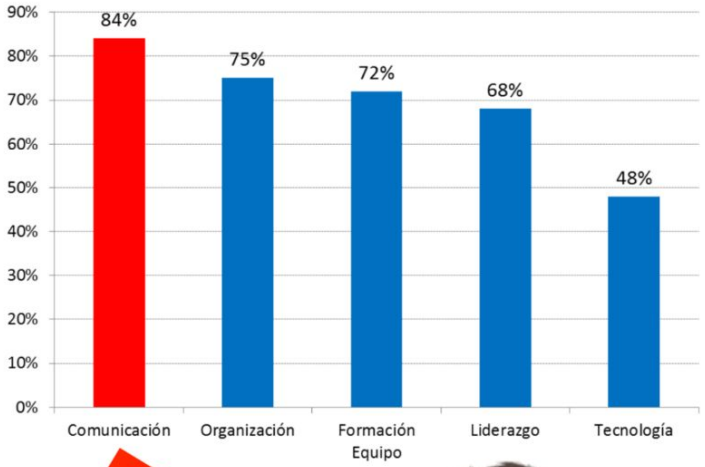

Situaciones que ocurren con bastante frecuencia

Necesidad de planificar y gestionar mejor las **comunicaciones**



Fuente: ProjectManagement.com, PM Critical Skills Survey, 2018

comunicación en los proyectos

- Un gerente de proyectos puede dedicar **hasta el 80% de su tiempo** a actividades de comunicación.
- La mayoría de las personas sólo **retiene el 50%** de lo escuchado
- Luego de **2 meses** la retención disminuye al **25%**



El **80%** de la comunicación no llega a la base de la pirámide organizacional



Fuente: ProjectManagement.com, PM Critical Skills Survey, 2012

gestión de la comunicación

"El área de conocimiento de Comunicaciones incluye los procesos necesarios para asegurar que las necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a través del desarrollo de objetos y de la implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio eficaz de información"*



OBJETIVO

- Definir con claridad el propósito de la comunicación



OBJETO

- Comprender tanto como sea posible el receptor de las comunicaciones, sus necesidades y preferencias




RESULTADO

- Monitorear y medir la eficacia de las comunicaciones

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

algunos conceptos clave


- Un **liderazgo adecuado** del proyecto incluirá manejar con claridad aspectos de la **comunicación, objetivos claros, gestión de la performance, expectactivas y feedback** hacia adentro y hacia fuera del equipo de proyecto.

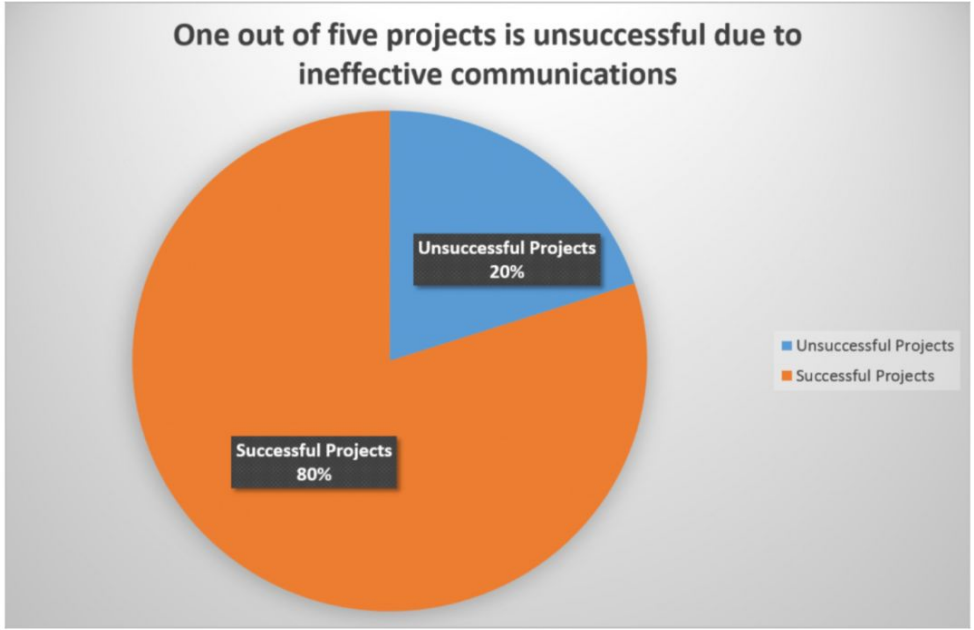

1 de cada 5 proyectos fracasa por aspectos relacionados a la comunicación

algunos conceptos clave

*"En el contexto de gestionar exitosamente las relaciones del proyecto con los interesados, la comunicación incluye el desarrollo de estrategias y planes para los objetos y actividades de comunicación adecuados con la comunidad de interesados y la aplicación de habilidades para mejorar la eficacia de las comunicaciones planificadas y otras comunicaciones ad hoc"**

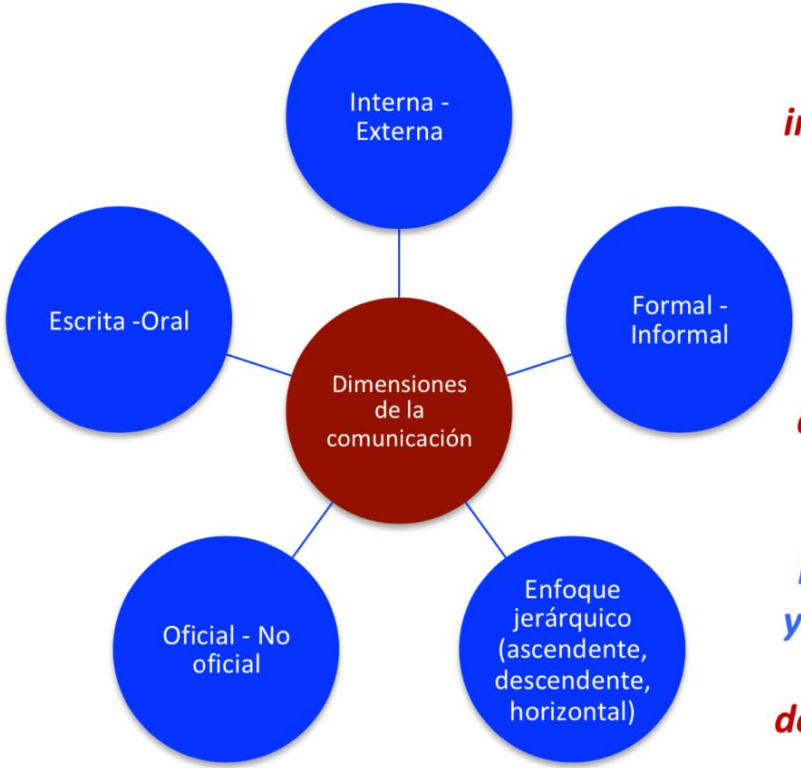

*"La comunicación exitosa consta de dos partes. La primera parte implica desarrollar una estrategia de comunicación adecuada en base a las necesidades del proyecto y los interesados del proyecto. A partir de esa estrategia, se desarrolla un plan de gestión de las comunicaciones para asegurar que los mensajes adecuados se comuniquen a los interesados en diversos formatos y diversos medios. Estos mensajes constituyen las comunicaciones del proyecto—la segunda parte de una comunicación exitosa"**

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

Grupos de procesos

Inicio	Planeación	Ejecución	Monitoreo y control	Cierre
PMBOK® GUIDE 6 49 PROJECT MANAGEMENT PROCESSES	25.- Planificar la gestión de las comunicaciones.	33.- Gestionar las comunicaciones	42.- Monitorear las comunicaciones	

Procesos PMBOK

Gestión de la COMUNICACIÓN

1. Planificar la gestión de las comunicaciones

2. Gestionar las comunicaciones

3. Monitorear las comunicaciones

"Desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las actividades de comunicación del proyecto con base en las necesidades de información de cada interesado o grupo, en los activos de la organización disponibles y en las necesidades del proyecto"

- Enfoque documentado para involucrar a los interesados de manera eficaz y eficiente
- Se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto



ENTRADAS

- Acta de constitución del proyecto
- Plan para la dirección del proyecto (plan de gestión de los recursos, plan involucramiento de interesados)
- Documentos del proyecto (documentación requisitos, registro interesados)
- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS


- Juicio de Expertos
- Análisis de requisitos de comunicación
- Tecnología de la comunicación
- Modelos de comunicación
- Métodos de comunicación
- Habilidades interpersonales y de equipo
- Representación de datos
- Reuniones

SALIDAS

- Plan de gestión de las comunicaciones
- Actualizaciones del Plan para la dirección del proyecto
- Actualizaciones a documentos del proyecto (cronograma, registro interesados)

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute. *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición. PMI: 2017

modelo de comunicación

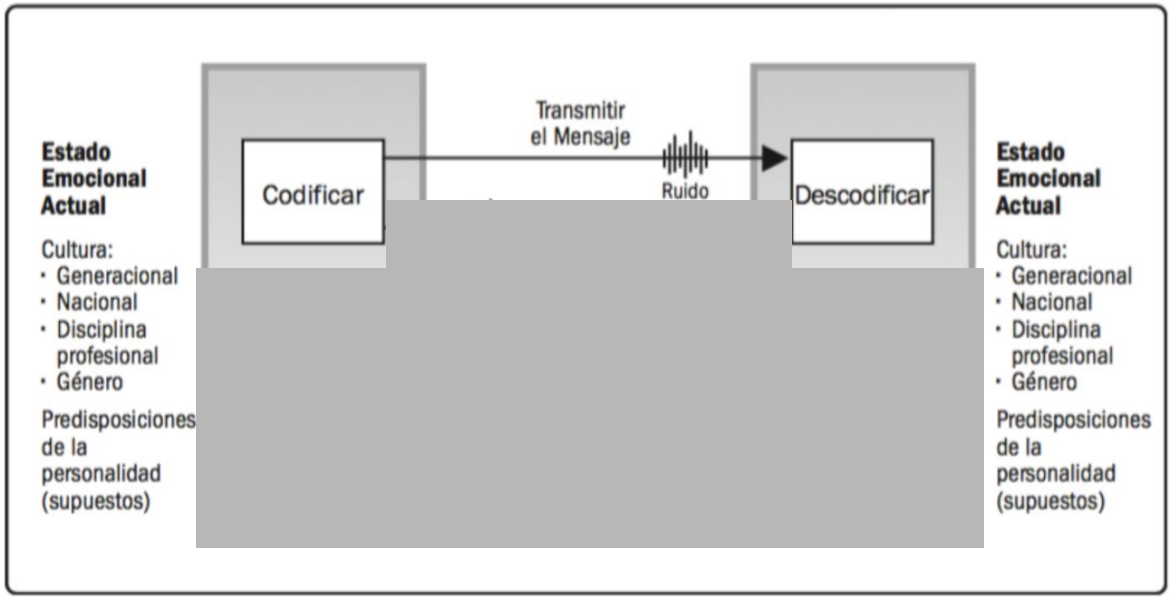

"Como parte del proceso de comunicación, el emisor es responsable de la transmisión del mensaje, asegurando que la información que está comunicando es clara y completa y confirmando que el mensaje es interpretado correctamente. El receptor es responsable de cerciorarse de que la información sea recibida en su totalidad, interpretada correctamente y confirmada o respondida adecuadamente. Estos componentes tienen lugar en un entorno donde probablemente habrá ruido y otras barreras para una comunicación eficaz."*

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

métodos de comunicación



Interactiva
- Reuniones
- Llamadas telefónicas
- Redes sociales (algunas)
- Videconferencias

Entre dos o más partes que realizan un **intercambio de información de tipo multidireccional** en tiempo real

PUSH
- Emails
- Memos, minutas
- Informes
- Comunicados de prensa

Enviada o distribuida directamente a receptores específicos que necesitan recibir la información. Esto asegura la distribución de la información, pero no garantiza que efectivamente haya llegado ni sea comprendida por la audiencia prevista

PULL
- Portales web
- Sitios intranet
- E-learning
- Bases de datos lecciones aprendidas

Utilizada para conjuntos de información complejos y voluminosos, o para audiencias grandes**; requiere que los receptores accedan al contenido** según su propio criterio sujetos a procedimientos de seguridad

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

canales de comunicación



Fórmula para calcular la cantidad de canales de información en el proyecto:

$$\frac{N \times (N-1)}{2}$$

En este ejemplo, con 5 interesados:

$$\frac{5 \times (5-1)}{2} = 10$$

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

Gestión de la COMUNICACIÓN

1. Planificar la gestión de las comunicaciones

2. Gestionar las comunicaciones

3. Monitorear las comunicaciones

"Garantizar que la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados."

- Permite un flujo de información eficaz y eficiente entre el equipo del proyecto y los interesados
- Se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto

INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	MONITORO Y CONTROL	CIERRE
	10.1	10.2	10.3	

ENTRADAS

- Plan para la dirección del proyecto (plan de gestión de los recursos, plan de gestión de las comunicaciones, plan involucramiento de interesados)
- Documentos del proyecto (registro cambios, registo incidentes, registro lecciones aprendidas, informe calidad, informe riesgos, registro interesados)
- Informes desempeño del trabajo
- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

- Tecnología de la comunicación
- Métodos de comunicación
- Habilidades de comunicación
- Sistema de información para la Dirección de Proyectos (PMIS)
- Generación Informes del proyecto
- Habilidades interpersonales y de equipo
- Reuniones


SALIDAS

- Comunicaciones del proyecto
- Actualizaciones del Plan para la dirección del proyecto (plan de gestión de las comunicaciones, plan involucramiento interesados)
- Actualizaciones a documentos del proyecto (registro incidentes, registro lecciones aprendidas, cronograma, registro riesgos, registro interesados)
- Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

habilidades de comunicación

Tipos de comunicación (%):

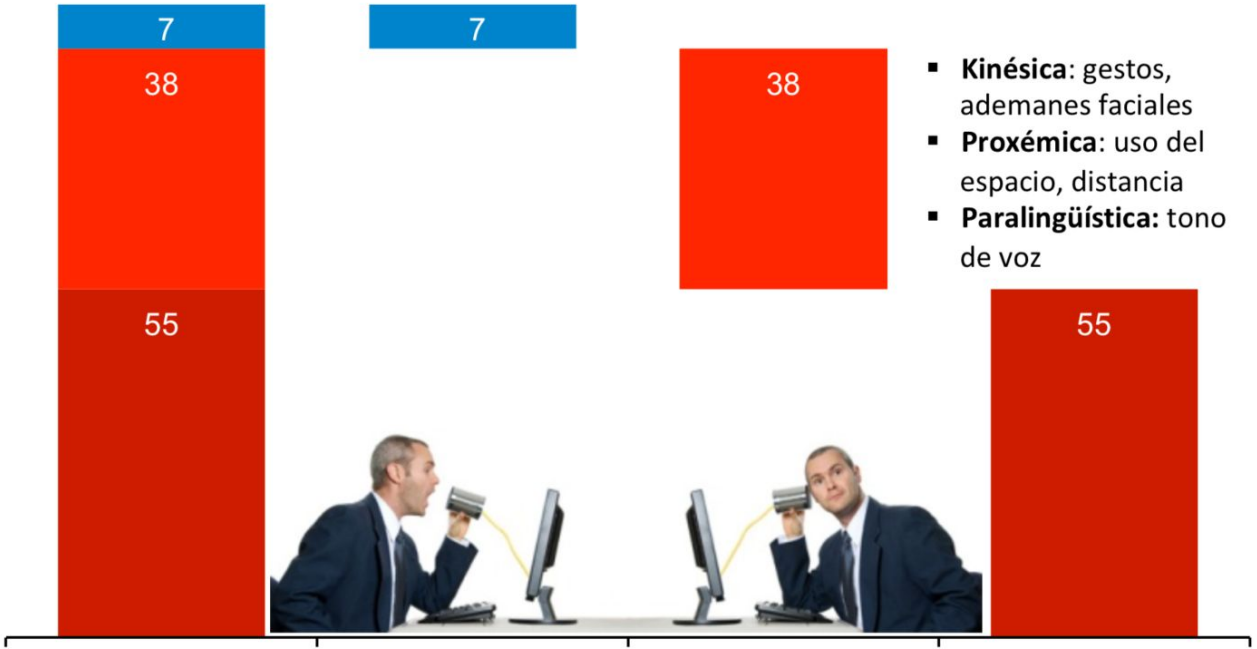

- **Kinésica**: gestos, ademanes faciales
- **Proxémica**: uso del espacio, distancia
- **Paralingüística:** tono de voz

Fuente: Albert Mehrabian, profesor emérito UCLA, Regla de Mehrabian

El **93%** de la comunicación es **NO verbal**





110 skills - David Phillips




Fuente: "Las 110 técnicas de comunicación y hablar en público ", David JP Phillips

https://www.ted.com/talks/david_jp_phillips_the_110_techniques_of_communication_and_public_speaking

1. **Inclínate** a tu audiencia
2. **Gestos funcionales**: coincidir gestos con tus palabras
3. **Manos al costado**, dale un descanso
4. **Empatía**, inclinando tu cabeza (escucha activa)
5. **Sonrie**, con la sonrisa de Duchenne
6. **Si te equivocas, no te asustes**. Pausa, respira, inclínate y sonríe
7. **Práctica**, práctica, práctica


TED

escuchar, escuchar, escuchar activamente - Julian Treasure





listening positions

active | passive

reductive | expansive

critical | empathetic



Fuente: "5 ways to listen better", Julian Treasure, TED Global 2011

https://www.ted.com/talks/julian_treasure_5_ways_to_listen_better

gestionar según la situación

Tipos de comunicación según situación:

Formal Escrita
- Situaciones complejas
- Planes de proyecto
- Acta de constitución
- Documentos



Formal Verbal
- Presentaciones a interesados
- Exposición y presentaciones de resultados en general



Informal Escrita
- Notas
- Anotaciones
- Mensajería
- Mails internos



Informal Verbal
- Charlas internas
- Reuniones de almuerzo
- Salidas



Verbal: más rápida, 2 vías de comunicación → Escrita: más detallada y mejor organizada, permite revisar más de una vez el mensaje

Formal: requiere habilidades de oratoria, manejo apropiado del lenguaje, compromete con lo expresado → Informal: no compromete con lo expresado, genera una comunicación abierta y libre

gestionar según la situación

Tipos de comunicación según situación:



Emoticones en las comunicaciones del trabajo, ¿sí o no?

EXPRESIONES. Varias compañías impulsan su uso para el envío de mensajes

Christopher Mims
THE WALL STREET JOURNAL

NUEVA YORK.–Al principio, Marek Nowak, un ingeniero de 32 años de CircleCI, una empresa de software empresario de servicios para la nube, era escéptico respecto del uso de emoticones para comunicarse con sus colegas. Ahora, cuando postea las minutas de las reuniones de su equipo en Slack, las precede de un emoticón de un osito dando un abrazo.

No es solo por diversión. Es una política de la compañía usar ciertos emoticones para indicar determinados mensajes, tales como la síntesis de una reunión. Si no incluyera el osito, los miembros del equipo podrían no enterarse de decisiones importantes.

"Mi valor de equipo favorito es la sobrecomunicación", dice Nowak, que ahora se autodefine como fanático de los emoticones. "Si duda sobre si escribir un mensaje porque piensa que tres cuartos del equipo ya lo sabe, eso no es problema, uno lo antecede con el emoticón de *sobrecomunicación*".

De esta manera, se elimina la formalidad en las comunicaciones re-

Expresarse con imágenes

Ojitos
La imagen puede significar que se está leyendo un paper

Abrazo
Una firma lo utiliza para pasar la minuta de reuniones

Disgusto
Las caras con expresión negativa también se aceptan

- Notas
- Anotaciones
- Mensajería
- Mails internos

Informal
Escrita




Escrita: más detallada y mejor organizada, permite revisar más de una vez el mensaje

Informal: no compromete con lo expresado, genera una comunicación abierta y libre

reporting

- Maximizar comunicación visual mediante gráficos, charts, diagramas y tablas

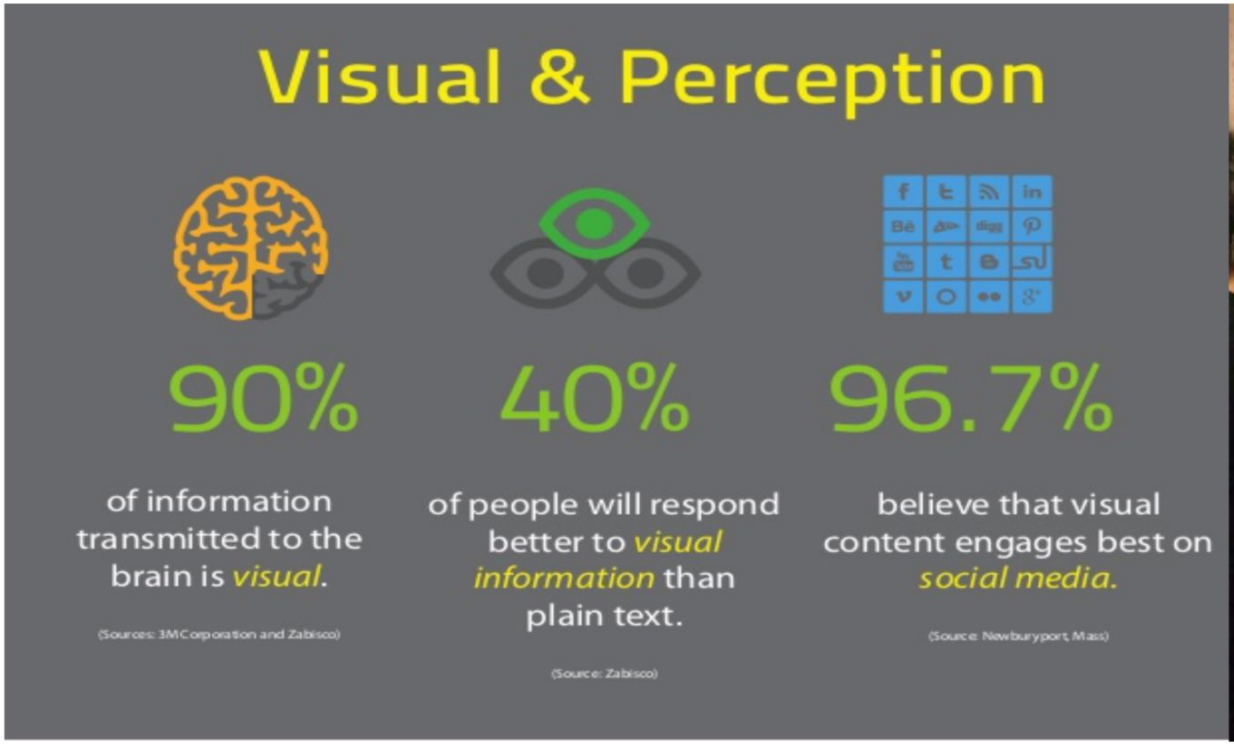




una imágen vale más que mil palabras



desafío: mantener la itensidad

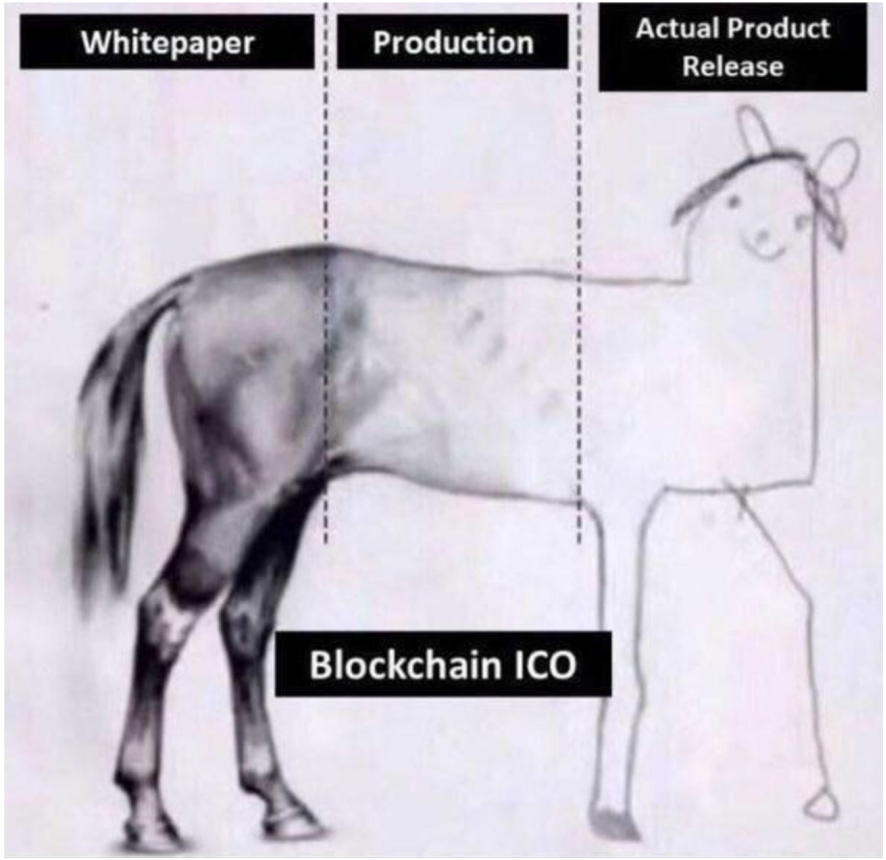

Gestión de la COMUNICACIÓN

1. Planificar la gestión de las comunicaciones


2. Gestionar las comunicaciones

3. Monitorear las comunicaciones

"Asegurar que se satisfagan las necesidades de información del proyecto y de sus interesados."

- Flujo óptimo de información tal como se define en el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados
- Se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto

INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	MONITORO Y CONTROL	CIERRE
	10.1	10.2	10.3	

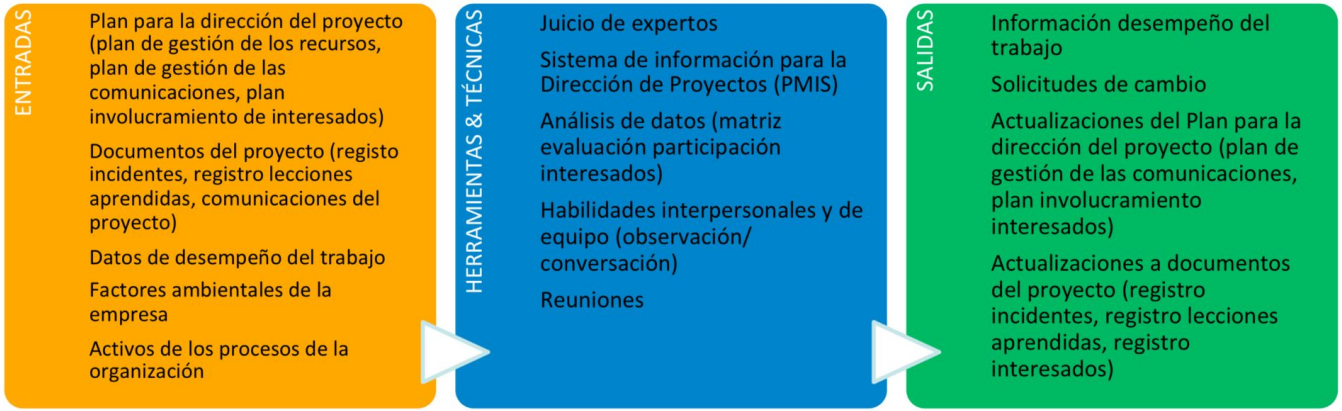

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

"La matriz de evaluación del involucramiento de los interesados permite comparar los niveles actuales de participación de los interesados con los niveles deseados de participación necesarios para la entrega exitosa del proyecto."*

Interesado	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder
Interesado 1	C			D	
Interesado 2			C	D	
Interesado 3				D C	

C = actual
D = deseado

Gráfico 13-6. Matriz de Evaluación del Involucramiento de los Interesados


- **Desconocedor.** Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales.
- **Reticente.** Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales pero reticente a cualquier cambio que pueda ocurrir como consecuencia del trabajo o los resultados del proyecto. Estos interesados no prestarán apoyo al trabajo o los resultados del proyecto.
- **Neutral.** Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni lo deja de apoyar.
- **De apoyo**. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales; apoya el trabajo y sus resultados.
- **Líder**. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo.

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

bonus track

¿Y ahora que?

Apartado para esta nueva etapa…

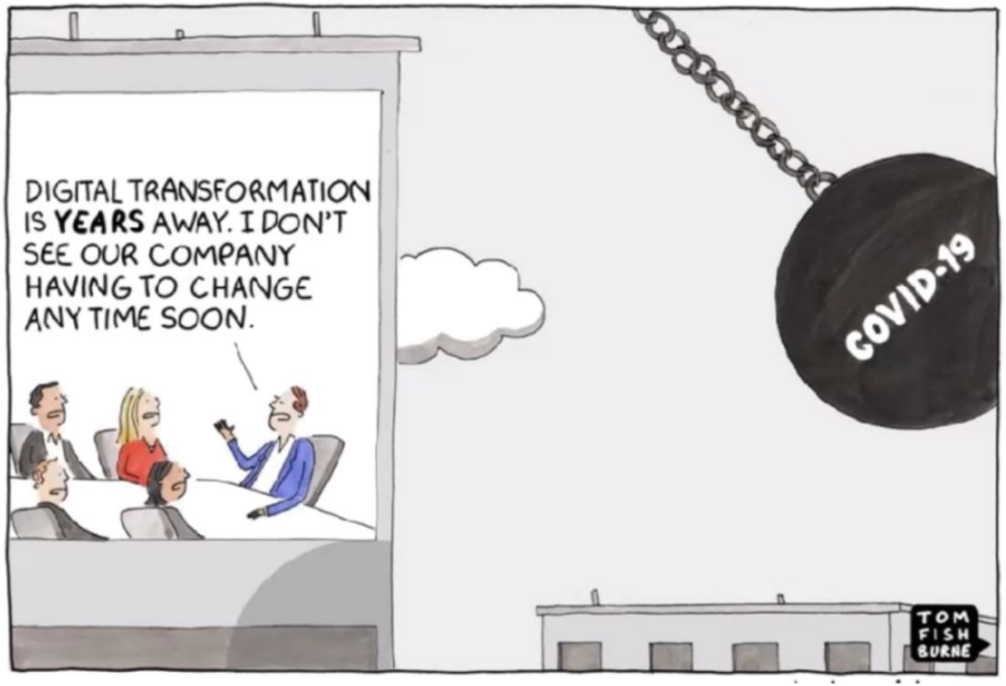

¿cómo seguimos gestionando nuestros proyectos?

Mindset

- VICA vs BANI
- Knowmads
- Hibrid: Waterfall – Agile

Skillset

- Re-skilling, Up-skilling
- Decisiones rápidas, ciclos cortos
- Liderazgo exponencial
- Change = Transformación

Toolset

	CONECTAR	GESTIONAR	COMPROMETER	DISEÑAR	COMPARTIR
PARA QUÉ sirven	• Videoconferencia = tiempo real. Genera sensación de conexión. • Email y Chat = asincrónico. Mantiene informado sin desenfocar.	• Gestionar proyectos en equipos dispersos. • Brindar visibilidad de carga de trabajo. • Enfocar al talento en objetivos y tareas.	• Recoger feedback durante una sesión virtual. • Realizar una encuesta sobre un tema específicos. • Hacer más divertida la sesión.	• Resolver problemas o hacer brainstorm de forma virtual y creativa. • Generar mayor valor en las reuniones y talleres de trabajo.	• Centralizar documentos y archivos. • Acceder en tiempo real a documentos requeridos por múltiples usuarios.
EJEMPLOS herramientas	zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, slack, Google Hangouts	Jira, Wrike, Trello, asana	Mentimeter, Kahoot!, remesh	MURAL, miro, Stormboard, Limnu	box, Dropbox, Google Drive

aprendizajes del mundo ágil

01.

¿Qué voces se escuchan y de qué manera?

02.

¿Hay objetivos o estamos frente a una tertulia?

03.

¿Cómo fluye la conversación? ¿Fluye?

04.

¿Qué resultados tenemos de nuestras conversaciones?



aprendizajes del mundo ágil

01.

FACILITAR LA COMUNICACIÓN CARA A CARA



02.

INCREMENTAR LA FRECUENCIA (DAILY, WEEKLY, ETC)



03.

VISUAL THINKING (DASHBOARDS) PULL (A DEMANDA) Y COLABORATIVO



04.

REVISIÓN DEL OUTPUT Y DEL PROCESO

