05:00



Contexto de la Gestión de Proyectos

Portafolio



Recompensa





Riesgo



Sr. Management

Los portafolios suelen gestionarse a nivel de alta gerencia dónde los criterios de éxito se miden en base a contribución a la estrategia de la empresa, a riesgo asumido y a beneficio obtenido

Programa









Subproyecto



3ros






Interesados en el Proyecto

*"Individuos y organizaciones activamente involucrados en el proyecto, y que pueden influir en sus objetivos"**

Los interesados en el proyecto son:



PATROCINADOR	*Proporciona recursos*
DIRECTOR DEL PROYECTO	*Responsable de dirigir*
EQUIPO DEL PROYECTO	*Realiza el trabajo de proyecto, incluye al PM. Los miembros del equipo pueden tener dedicación exclusiva o parcial*
CLIENTE	*Accede al producto o servicio del proyecto*
USUARIO	*Es el destinatario final del producto o servicio*
OTROS INTERESADOS	*Personas u Organizaciones afectadas en sus intereses por el proyecto y que pueden influir sobre él*

Un interesado puede ocupar más de un rol en el proyecto. Así, por ejemplo, el cliente puede ser la misma persona que el usuario o el patrocinador.
Es importante diferenciar la dinámica que implica el rol que está ejerciendo en cada caso.

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Influencias en el Proyecto

Los proyectos se desenvuelven en diferentes contextos, los cuales impactan en sus objetivos.

Las dos clasificaciones mas importantes de influencias que existen son:

- Activos de los procesos de la Organización (OPA – Organizational Process Assets). Son internos a la organización.
- Factores Ambientales de la Organización (EEF – Enterprise Environmental Factors). Pueden ser externos o internos a la organización.





*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Activos de los Procesos de la Organización

*"Planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimiento específicos y utilizados por la organización ejecutante del proyecto"**

Procesos y Procedimientos:

- Procesos de la organización
- Plantillas (templates)
- Instructivos y guías
- Requisitos
- Normas

Base de Conocimiento de la Compañía

- Archivos de proyectos anteriores
- Información histórica
- Lecciones aprendidas
- Bases de datos





Los Activos de los Procesos constituyen una entrada para gran número de procesos de planificación dentro de la Gestión de Proyectos. Los miembros del equipo pueden colaborar con su desarrollo a medida que avanza el proyecto.

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Factores Ambientales

*"Condiciones fuera del control del equipo de proyecto que influencian, limitan o direccionan el trabajo del proyecto"**

- Estándares gubernamentales e Industriales
- Infraestructura
- Condiciones de mercado
- Recursos Humanos Disponibles
- Sistemas de la organización (PMIS - Project Management Information System)
- Clima político
- Etc.





Los Factores Ambientales pueden tener impacto positivo o negativo y constituyen una entrada para gran número de procesos de planificación dentro de la Gestión de Proyectos.

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – Sixt*th Edition, PMI;Inc. 2017

Ejercicio

En el marco de la reciente pandemia ha sido contratado como director de proyecto para la construcción de un hospital de niños.

Identifique principales Stake Holders.

10 Minutos



Ciclo de Vida

Como Comerse a un Elefante…



Ciclo de Vida del Proyecto

- Para facilitar su gestión los proyectos se dividen en fases, dichas fases suelen ser secuenciales aunque a veces pueden solaparse.
- Los nombres y cantidad de las fases son determinados en base a las necesidades de gestión y control del proyecto.
- El conjunto de fases del proyecto constituyen su “Ciclo de Vida”




Ejemplo de cómo se podría separar un proyecto de Software en fases

Ciclo de Vida del Proyecto

Muchas organizaciones definen ciclos de vida que luego aplican a todos o a varios de sus proyectos.



Microsoft TechNet

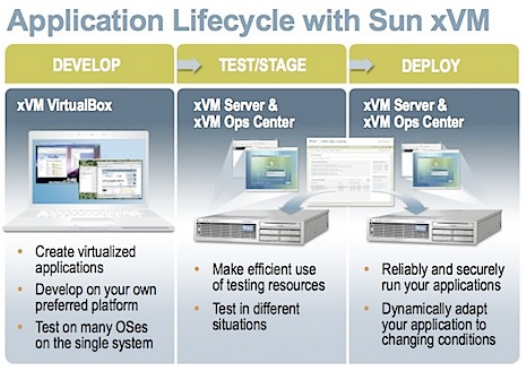

Ciclo de Vida del Proyecto

- *Los ciclos de vida de los proyectos generalmente se relacionan con:*
  - ¿Qué trabajo técnico se efectuará en cada fase?
  - ¿Cuándo se generarán los entregables y cómo se revisarán, verificarán y validarán?
  - ¿Quiénes estarán involucrados en cada fase?
  - ¿Cómo se controlará y aprobará cada fase?


- *La mayoría de los ciclos de vida de los proyectos comparten ciertas características:*
  - Existe algún tipo de transferencia técnica de una fase a otra
  - Los costos y cantidad de recursos necesarios son menores en el comienzo y en el fin del ciclo de vida del proyecto
  - El nivel de incertidumbre (riesgo) es mayor al principio
  - La capacidad de los interesados para influenciar el proyecto es mayor al comienzo

Relaciones Entre Fases


Secuencial



Superpuesta

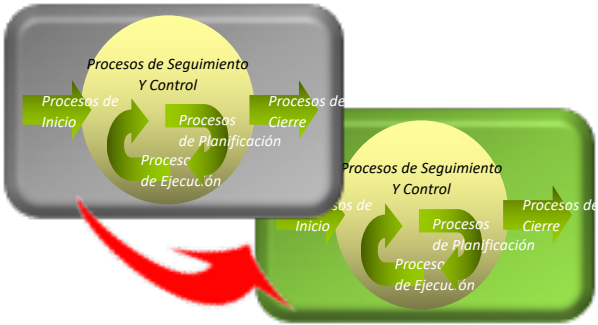

Iterativa e Incremental

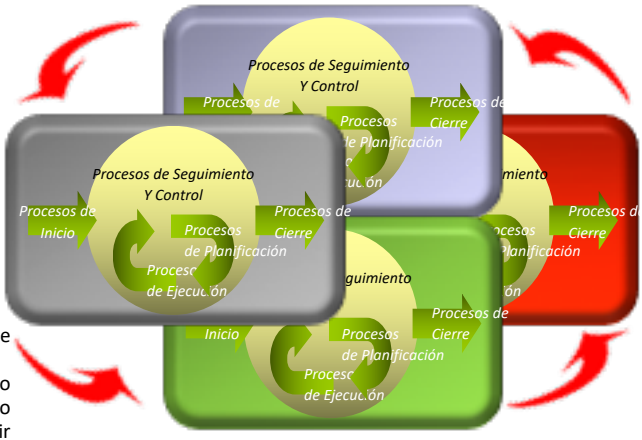

Un **ciclo de vida adaptativo** es un tipo particular de secuenciamiento iterativo e incremental donde las iteraciones se dan en lapsos muy breves

Un **ciclo de vida predictivo** puede ser secuencial o superpuesto, en ellos el alcance, tiempo y costo es conocido acabadamente en etapas tempranas y cada fase se enfoca en un grupo específico de actividades y procesos. Es por esto que cada una de ellas puede requerir habilidades muy particulares y requerir cambios de perfiles

Entregables

La finalización y aprobación de uno o más entregables del proyecto puede caracterizar una fase del proyecto



Entregable: "un producto del trabajo del proyecto que puede ser medido y verificable, como por ejemplo un estudio de factibilidad, un documento de diseño o un prototipo."*

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – Sixth Edition*, PMI;Inc. 2017


Influencia Organizacional

Ejercicio


Piense en alguna instancia en la cual su performance se vio afectada por la organización en la cual trabajaba.

Identifique cuales fueron los mecanismos en base a los cuales la organización afectó su desempeño.



10 Minutos

Influencia Organizacional

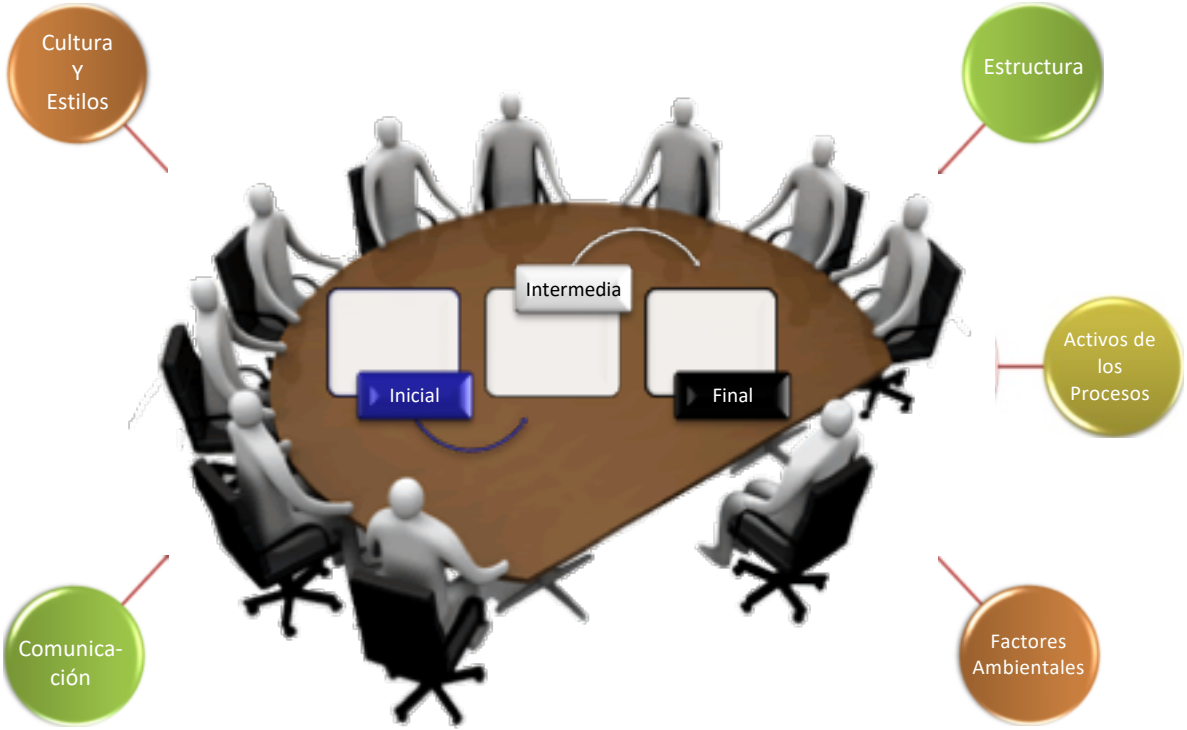

Cultura y Estilos

La mayoría de las organizaciones desarrollan culturas únicas, las cuales se exteriorizan en diversos factores:

- Valores compartidos, normas, creencias y expectativas
- Políticas y procedimientos
- Estilos de dirección
- Horas de trabajo
- Tolerancia al riesgo
- Entornos operativos
- Otros

Ejemplos del impacto de la cultura y estilos en el proyecto:

- Dentro de una empresa con cultura más emprendedora es más probable que se acepten proyectos riesgosos
- Un gerente de proyectos con un estilo altamente participativo puede encontrar ciertos problemas dentro de una empresa con estructuras jerárquicas muy marcadas



Comunicación

Los gerentes de proyectos pueden dedicar una gran cantidad de tiempo a las comunicaciones


Los factores relativos a la comunicación que pueden afectar el proyecto incluyen (entre otros):

- Urgencia de la necesidad de información: ¿el éxito del proyecto requiere información actualizada al momento o es suficiente con reportes periódicos?
- Disponibilidad de la tecnología: ¿son apropiados los sistemas disponibles?
- Personal previsto para el proyecto: ¿son los esquemas comunicacionales compatibles con ellos?
- Duración del proyecto: ¿puede cambiar la tecnología disponible antes de que termine el proyecto?
- Entorno del proyecto: ¿el equipo interactúa cara a cara o en un entorno virtual?






Estructura Funcional

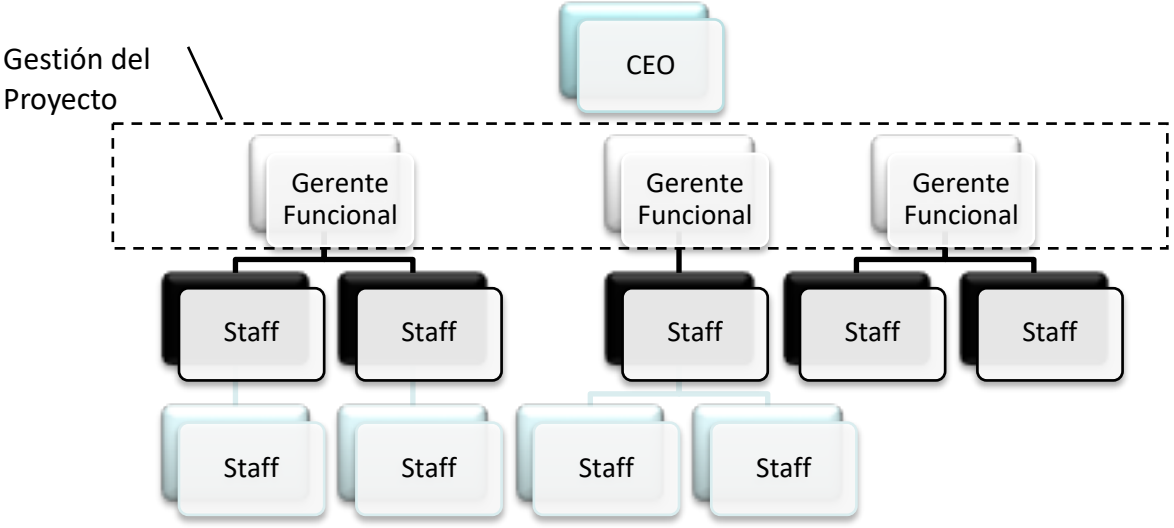

- Un superior claramente definido
- Personal staff agrupado por especialidad
- El trabajo del proyecto se subdivide en base a especialidades y se deriva a cada departamento separadamente




Estructura Matricial Débil

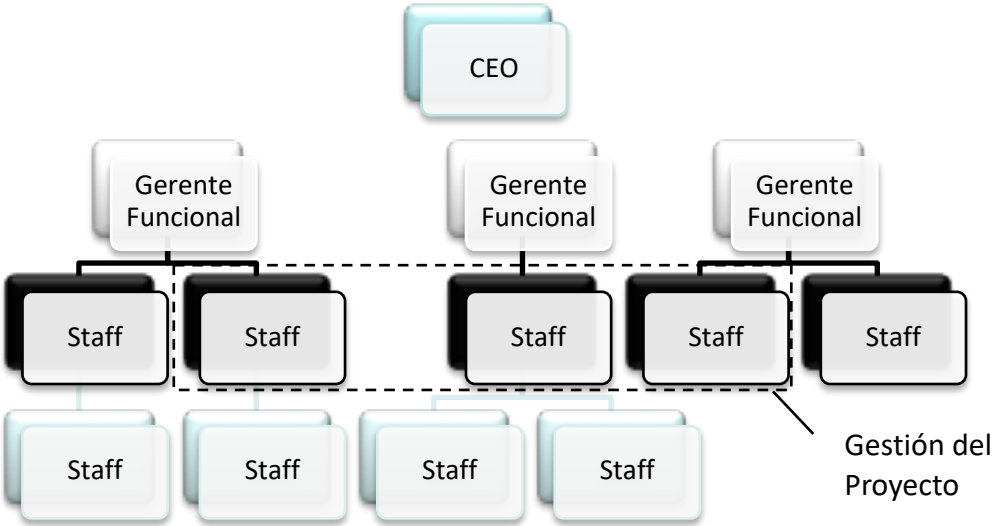

- Conserva gran parte de las características de las estructuras funcionales
- El rol del gerente de proyectos es el de coordinador o facilitador (Coordinator / Expediter)




Estructura Matricial Equilibrada

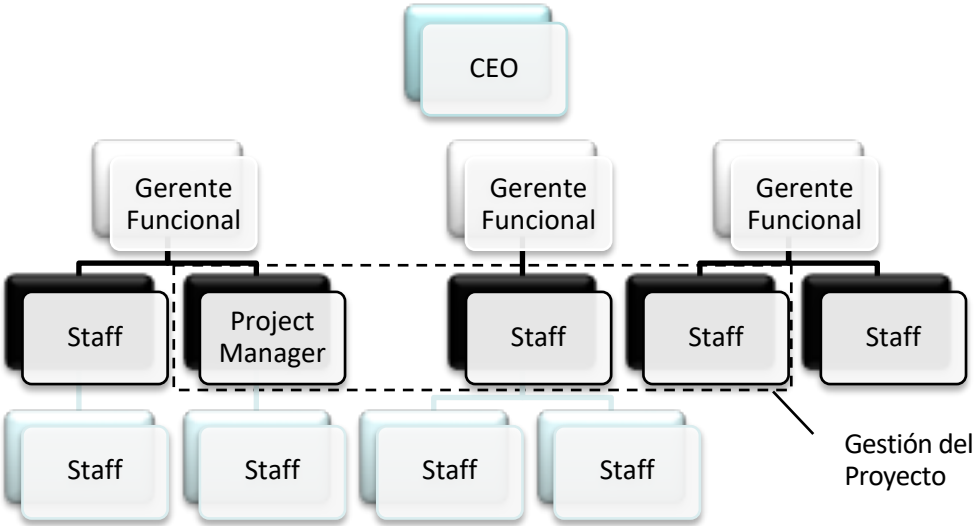

- Reconoce la necesidad de un Project Manager
- El Project Manager no posee la autoridad absoluta por el proyecto o su fondeo




Estructura Matricial Fuerte

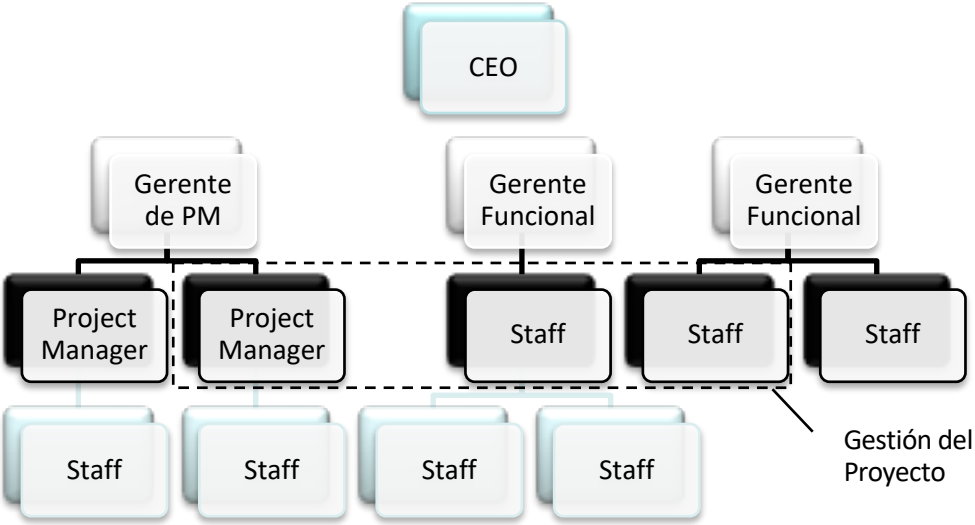

- Conserva gran parte de las características de las estructuras proyectizadas
- El Project Manager posee dedicación full-time de staff para el proyecto y gran autoridad




Estructura Proyectizada

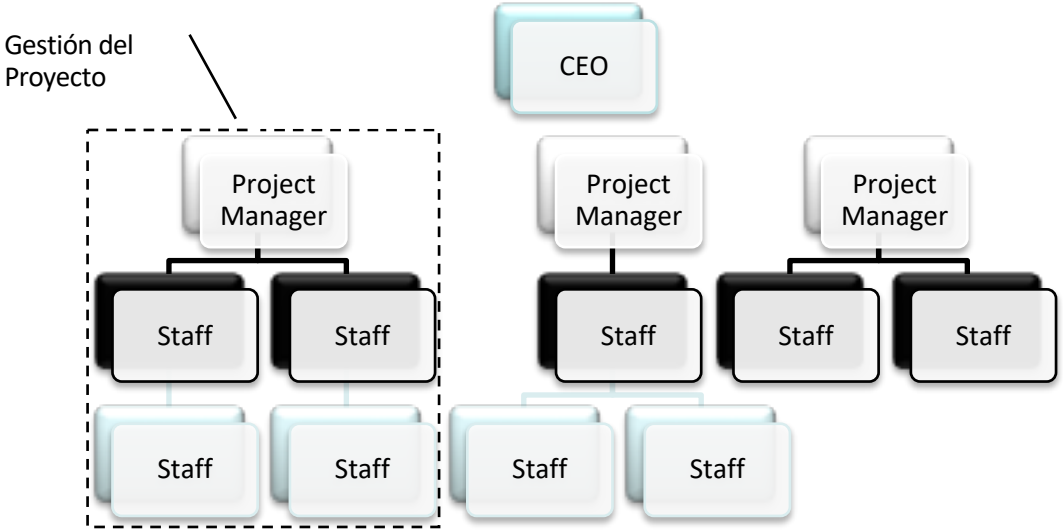

- Miembros del equipo generalmente comparten un lugar físico
- Project Manager tiene gran autonomía y poder de decisión
- La mayoría de los recursos de la organización se encuentran involucrados en proyectos

Estructura Compuesta

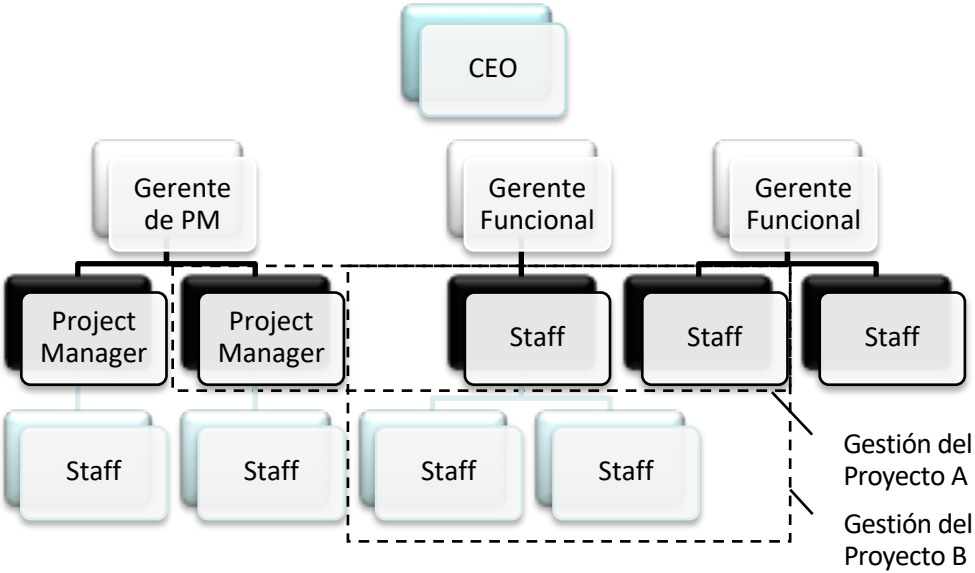

- Involucra más de un modelo a distintos niveles
- Coexisten los equipos de proyectos

¿Cuál es el tipo de estructura esperable?



¿Cuál es el tipo de estructura esperable?



¿Cuál es el tipo de estructura esperable?



Estructura

	Funcional	Matricial Débil	Matricial Equilibrada	Matricial Fuerte	Proyectizada
Autoridad del PM	¿Nivel de autoridad? (Alto / Medio / Bajo)				
Disponib. de recursos	¿Accesibilidad? (Alto / Medio / Bajo)				
Control del presupuesto	¿PM o Gerente Funcional?				
Rol del PM	¿Cuánto tiempo puede dedicar? (Full / Part)				
Personal staff de PM	¿Cuánto tiempo asignados? (Full / Part)				



En cualquier tipo de estructura se pueden crear organizaciones basadas en proyectos (PBO – Project Based Organizations). Se trata de sistemas temporales cuyo objetivo es realizar el trabajo del proyecto disminuyendo el nivel de burocracia.

Estructura

	Ventajas	Desventajas
Funcional	*Administración más sencilla de especialidades* *Reporte a un único supervisor* *Recursos similares centralizados* *Planes de carrera claramente definidos*	*Los recursos se focalizan en tareas específicas más que en el proyecto* *No hay plan de carrera para los gerentes de proyecto* *Los gerentes de proyecto tienen poca autoridad*
Matricial	*Objetivos visibles para el proyecto* *Mayor poder del PM* *Más soporte de parte de la organización funcional* *Mayor eficiencia en el uso de los recursos* *Mejor distribución de información*	*Se requiere administración adicional* *Existe mas de un jefe* *El control y seguimiento se hace más complejo* *PM y funcionales pueden no tener las mismas prioridades* *Aumenta potenciales conflictos*
Proyectizada	*Organización de proyectos eficiente* *Lealtad al proyecto* *Comunicación más fluida*	*No existe lugar donde retornar luego de finalizar el proyecto* *Falta de especialización en determinadas disciplinas* *Estructura y funciones de trabajo duplicadas* *Menor eficiencia en el uso de los recursos*




Gobierno y Procesos

Project Management Office (PMO)






El rol de la PMO puede variar de acuerdo a cada estructura organizacional, su función puede ser de soporte, control o dirección. El rol de la PMO no es el mismo que el del Project Manager





Fuente: PMI's Pulse of the Profession®

Rol de la PMO – Project Governance

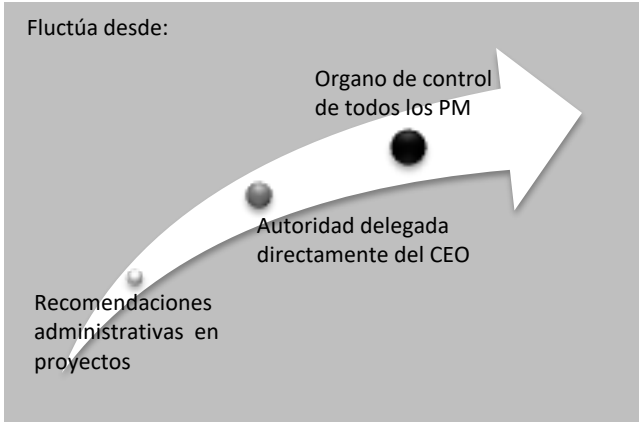


M. Fuerte / Compuesta

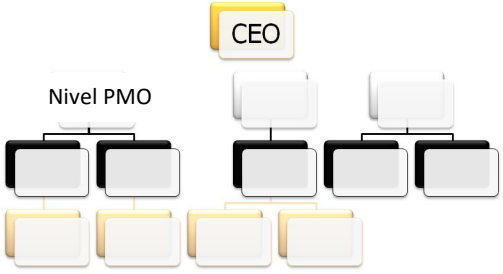

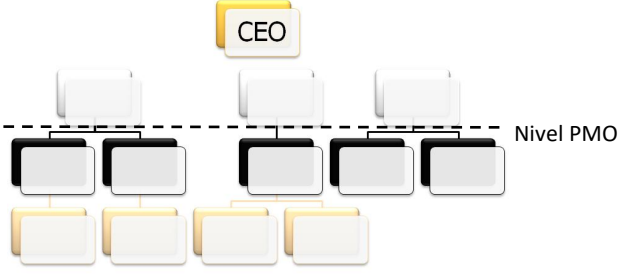

M. Débil / Equilibrada

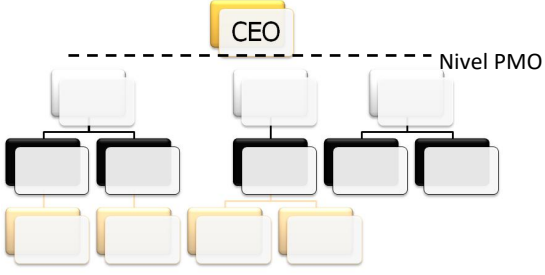

Proyectizada



El gobierno del proyecto define el marco en base al cual se controla y ejecuta el proyecto, involucra a interesados, políticas, procedimientos, standards, responsabilidades y niveles de autoridad.



Un director de proyecto posee poca experiencia y fue asignado a un nuevo proyecto. Debido a que él trabajará en una organización matricial, puede esperar que las comunicaciones sean:

1. Simples
2. Abiertas y exactas
3. Complejas
4. Difíciles de automatizar

Metodologías de Gestión de Proyectos

Metodologías Predictivas o Waterfall
- Gran esfuerzo de planificación
- Fuerte documentación
- Estricta gestión del alcance
- Procesos bien definidos

Metodologías Agiles
- Foco en individuos y su interacción
- Priorizar colaboración con el cliente a negociación contractual
- Valorar más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan



Lo más importante, sea cual sea la metodología seleccionada, es definir inteligentemente qué herramientas aplicar para cada proyecto en cada organización

Procesos

*«Una serie de acciones para generar un resultado Concreto»**


1. De administración de proyectos (PMI)
2. Orientados a crear el producto del proyecto (ISO, etc.)



*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – S*ixth Edition, PMI;Inc. 2017

Procesos

La gestión de proyectos es efectuada mediante procesos, utilizando conocimiento y herramientas y técnicas, que reciben entradas y generan salidas concretas

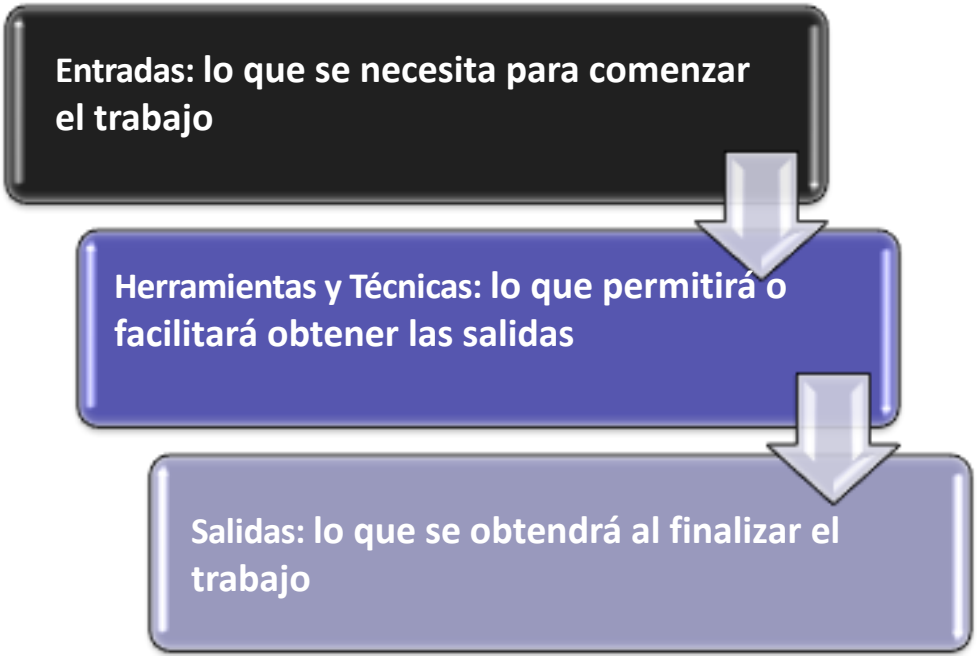

Cuerpo de Conocimiento PM

Los procesos aplicables se pueden agrupar:

En base a la principal función que persiguen, por ejemplo dar inicio al proyecto



5 Grupos de Procesos

10 Areas de Conocimiento



En base al área de conocimiento predominante en su gestión

Archivo Metodológico

5 Grupos de Procesos



10 Areas de Conocimiento



Mapa de Gestión de Proyectos

Grupo	Proceso	Area de Conocimiento									
		Integr.	Alcance	Tiempo	Costo	Calidad	Recursos	Comunic.	Riesgos	Adquisc.	Interes.	Total
Iniciación	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto (Project Charter)	x										2
	13.1 Identificar Interesados (Identify Stakeholders)										x	
Planificación	4.2 Desarrollar el Plan para Dirección del Proyecto (Project Management Plan)	x										24
	5.1 Planificar Gestión del Alcance (Plan Scope Management)		x									
	5.2 Recopilar Requerimientos (Collect Requirements)		x									
	5.3 Definición del Alcance (Scope Definition).		x									
	5.4 Crear la EDT (Create WBS).		x									
	6.1 Planificar Gestión del Cronograma (Plan Schedule Management)			x								
	6.2 Definición de las Actividades (Activity Definition).			x								
	6.3 Secuencia de las Actividades (Activity Sequencing).			x								
	6.4 Estimación de la Duración de las Actividades			x								
	6.5 Desarrollo del Cronograma (Schedule Development).			x								
	7.1 Planificar Gestión de Costos (Plan Cost Management)				x							
	7.2 Estimación de Costos. (Cost Estimating).				x							
	7.3 Determinar el Presupuesto. (Cost Budgeting).				x							
	8.1 Planificación de la Calidad (Quality Planning)					x						
	9.1 Planificar la Gestión de los Recursos (Plan Resource Management)						x					
	9.2 Estimar los Recursos de las Actividades						x					
	10.1 Planificación de las Comunicaciones (Plan Communications)							x				
	11.1 Planificación de la Gestión de Riesgos (Plan Risk management)								x			
	11.2 Identificación de Riesgos (Risk Identification).								x			
	11.3 Análisis Cualitativo de Riesgos (Qualitative Risk Analysis)								x			
	11.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos (Quantitative Risk Analysis)								x			
	11.5 Planificación de la Respuesta a los Riesgos (Risk Responses)								x			
	12.1 Planificar las Adquisiciones (Plan Procurement Management)									x		
	13.2 Planificar Involucramiento de Interesados (Plan Stakeholders Management)										x	

Mapa de Gestión de Proyectos

UCEMA

Grupo	Proceso	Area de Conocimiento										
		Integr.	Alcance	Tiempo	Costo	Calidad	Recursos	Comunic.	Riesgos	Adquisc.	Interes.	Total
Ejecución	4.3 Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto (Direct and Manage Project Work)	x										10
	4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto (Project Knowledge Management)	x										
	8.2 Gestionar la Calidad (Quality Management)					x						
	9.3 Adquirir Recursos						x					
	9.4 Desarrollar el Equipo						x					
	9.5 Dirigir el Equipo						x					
	10.2 Gestionar Comunicaciones (Manage Communications)							x				
	11.6 Implementar Respuesta a los Riesgos								x			
	12.2 Efectuar las Adquisiciones									x		
	13.3 Gestionar participación de Interesados (Manage Stakehokder Engagement)										x	
Seguimiento & Control	4.5 Supervisar y Controlar el Trabajo (Monitor & Control Project Work)	x										12
	4.6 Efectuar Control de Cambios (Integrated Change Control).	x										
	5.5 Validación del Alcance (Validate Scope)		x									
	5.6 Control del Alcance (Scope Control)		x									
	6.6 Control de Cronograma (Control Schedule)			x								
	7.4 Control de Costos (Control Cost)				x							
	8.3 Realizar Control de Calidad (Perform Quality Control)					x						
	9.6 Controlar los Recursos						x					
	10.3 Controlar las Comunicaciones (Control Communications)							x				
	11.7 Seguimiento y Control de Riesgos (Control Risks)								x			
	12.3 Controlar Adquisiciones (Control Procurements)									x		
	13.4 Controlar Vínculos con Interesados (Control Stakeholder Engagement)										x	
Cierre	4.7 Cierre del Proyecto (Close Project or Phase)	x										1

Ciclo de Vida del Proyecto y Grupos de Procesos de DP



¿Cómo definiría, de la mejor forma posible, los grupos de procesos?:



1. Son las fases del proyecto
2. Inicio, Planificación, Testeo, Ejecución y Cierre
3. Son las cinco áreas de conocimiento
4. Todos ellos se requieren para cualquier proyecto, independientemente de su ciclo de vida
