

Gestión de la Integración

Ground Rules y Novedades

1. Las intervenciones se deben intentar limitar a un máximo de 1 minuto, donde buscaremos expresar la idea de una manera sintética y enfocada.
2. Siempre levantar la mano solicitando participar.
3. Los espacios para preguntas serán abiertos en bloques cada 30 minutos, si surgen dudas anotarlas y se responderán en el bloque correspondiente. Si no alcanzara el tiempo para responder todas las dudas se habilitará un espacio posterior a la clase para agotarlas.
4. Primer encuentro de refuerzo (optativo) para asistir a quienes lo requieran en los temas tratados: Jueves 24/08 18.30 hs. Se deberá enviar por mail las dudas a ghr01@ucema.edu.ar antes del 22/08 .
5. Próximas actividades extracurriculares para ampliar conocimientos, las mismas son optativas. Taxis vs. Uber: antropología de la disrupción tecnológica 11/08 12.30 hs.
6. Se encuentran disponibles las preguntas de simulación de gestión de la integración en el web campus.
7. Fecha tentativa encuentro Open Space Sábado 9/9 de 10 a 13 hs.
8. Todos los participantes obtendrán un certificado de participación del programa. También podrán optar por rendir un examen final en base al cual obtendrán un diploma de aprobación del mismo.

Mapa de Gestión de Proyectos

Los procesos aplicables se pueden agrupar:

En base a la principal función que persiguen, por ejemplo dar inicio al proyecto



5 Grupos de Procesos

10 Areas de Conocimiento



En base al área de conocimiento predominante en su gestión

Mapa de Gestión de Proyectos

Grupo	Proceso	Area de Conocimiento										
		Integr	Alcance	Tiempo	Costo	Calidad	Recursos	Comunic.	Riesgos	Adquisc.	Interes.	Total
Iniciación	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto (Project Charter)	x										2
	13.1 Identificar Interesados (Identify Stakeholders)										x	
Planificación	4.2 Desarrollar el Plan para Dirección del Proyecto (Project Management Plan)	x										24
	5.1 Planificar Gestión del Alcance (Plan Scope Management)		x									
	5.2 Recopilar Requerimientos (Collect Requirements)		x									
	5.3 Definición del Alcance (Scope Definition).		x									
	5.4 Crear la EDT (Create WBS).		x									
	6.1 Planificar Gestión del Cronograma (Plan Schedule Management)			x								
	6.2 Definición de las Actividades (Activity Definition).			x								
	6.3 Secuencia de las Actividades (Activity Sequencing).			x								
	6.4 Estimación de la Duración de las Actividades			x								
	6.5 Desarrollo del Cronograma (Schedule Development).			x								
	7.1 Planificar Gestión de Costos (Plan Cost Management)				x							
	7.2 Estimación de Costos. (Cost Estimating).				x							
	7.3 Determinar el Presupuesto. (Cost Budgeting).				x							
	8.1 Planificación de la Calidad (Quality Planning)					x						
	9.1 Planificar la Gestión de los Recursos (Plan Resource Management)						x					
	9.2 Estimar los Recursos de las Actividades						x					
	10.1 Planificación de las Comunicaciones (Plan Communications)							x				
	11.1 Planificación de la Gestión de Riesgos (Plan Risk management)								x			
	11.2 Identificación de Riesgos (Risk Identification).								x			
	11.3 Análisis Cualitativo de Riesgos (Qualitative Risk Analysis)								x			
	11.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos (Quantitative Risk Analysis)								x			
	11.5 Planificación de la Respuesta a los Riesgos (Risk Responses)								x			
	12.1 Planificar las Adquisiciones (Plan Procurement Management)									x		
	13.2 Planificar Involucramiento de Interesados (Plan Stakeholders Management)										x	


Mapa de Gestión de Proyectos

Grupo	Proceso	Area de Conocimiento										
		Integr.	Alcance	Tiempo	Costo	Calidad	Recursos	Comunic.	Riesgos	Adquisc.	Interes.	Total
Ejecución	4.3 Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto (Direct and Manage Project Work)	x										10
	4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto (Project Knowledge Management)	x										
	8.2 Gestionar la Calidad (Quality Management)					x						
	9.3 Adquirir Recursos						x					
	9.4 Desarrollar el Equipo						x					
	9.5 Dirigir el Equipo						x					
	10.2 Gestionar Comunicaciones (Manage Communications)							x				
	11.6 Implementar Respuesta a los Riesgos								x			
	12.2 Efectuar las Adquisiciones									x		
	13.3 Gestionar participación de Interesados (Manage Stakehokder Engagement)										x	
Seguimiento & Control	4.5 Supervisar y Controlar el Trabajo (Monitor & Control Project Work)	x										12
	4.6 Efectuar Control de Cambios (Integrated Change Control).	x										
	5.5 Validación del Alcance (Validate Scope)		x									
	5.6 Control del Alcance (Scope Control)		x									
	6.6 Control de Cronograma (Control Schedule)			x								
	7.4 Control de Costos (Control Cost)				x							
	8.3 Realizar Control de Calidad (Perform Quality Control)					x						
	9.6 Controlar los Recursos						x					
	10.3 Controlar las Comunicaciones (Control Communications)							x				
	11.7 Seguimiento y Control de Riesgos (Control Risks)								x			
	12.3 Controlar Adquisiciones (Control Procurements)									x		
	13.4 Controlar Vínculos con Interesados (Control Stakeholder Engagement)										x	
Cierre	4.7 Cierre del Proyecto (Close Project or Phase)	x										1
TOTAL		6	6	7	4	3	4	3	6	4	4	49

Organización del Material Vinculado a las Areas de Conocimiento

El material de las reuniones se encuentra basado en la publicación del Project Management Institute, PMBOK® Guide – Sexta Edición.

- El objetivo de este material es servir de soporte para la dinámica de las próximas reuniones, es por esto que debe trabajarse en conjunto con el *PMBOK® Guide* para su correcta interpretación
- En la metodología propuesta se analizarán 49 procesos que han demostrado su potencial de éxito a través de resultados concretos en la gestión de proyectos.
- Cada uno de estos procesos se presentará con un enfoque sistémico, a través de sus entradas, herramientas aplicables a su gestión y sus salidas.
- El esquema utilizado, en el material de soporte, será el siguiente:
  1. Se presentará el marco del proceso, lo qué implica, cómo se aplica y conceptos generales vinculados con él.
  2. Se presentará el mapa del proceso Siguiendo el siguiente esquema:




UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

PMBOK es marca registrada del Project Management Institute, Inc.

Organización del Material Vinculado a las Areas de Conocimiento

3. Se desarrollará cada uno de los conceptos enumerados. Para esto se utilizarán los siguientes criterios:
   - Los conceptos desarrollados previamente no se repetirán (en el material). Así, por ejemplo, conceptos como los factores ambientales, que suelen repetirse en distintos procesos, sólo se desarrollarán en el material la primera vez que aparezcan o cuando su vinculación con el tema en cuestión amerite un desarrollo adicional. Esto persigue el doble objetivo de no malgastar papel (en el caso de material impreso) y de enfocar la reunión en conceptos no tratados previamente.
   - En el margen inferior derecho de una diapositiva donde se estén presentando conceptos como los mencionados se incluirá una referencia de su ubicación en el mapa del proceso (E = Entrada, H = Herramientas y Técnicas, S= Salidas)




   - Las definiciones utilizadas se basan mayormente en el glosario del *PMBOK® Guide*

PMBOK es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

Integración

"El área de conocimiento de Integración se focaliza en:

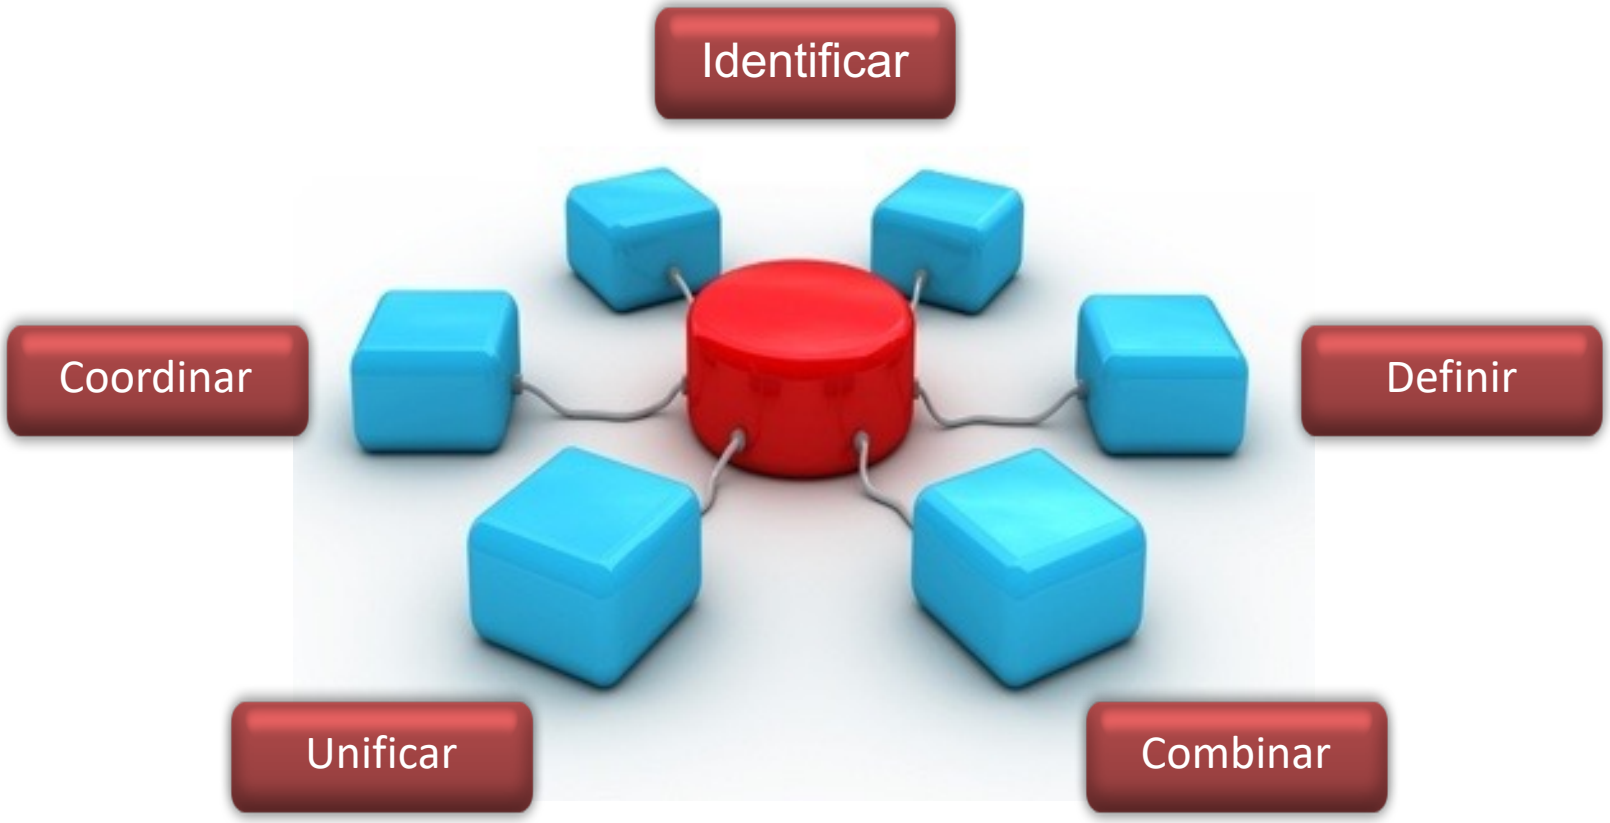


Los diversos procesos y actividades de la Gestión de Proyectos"*

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Integración

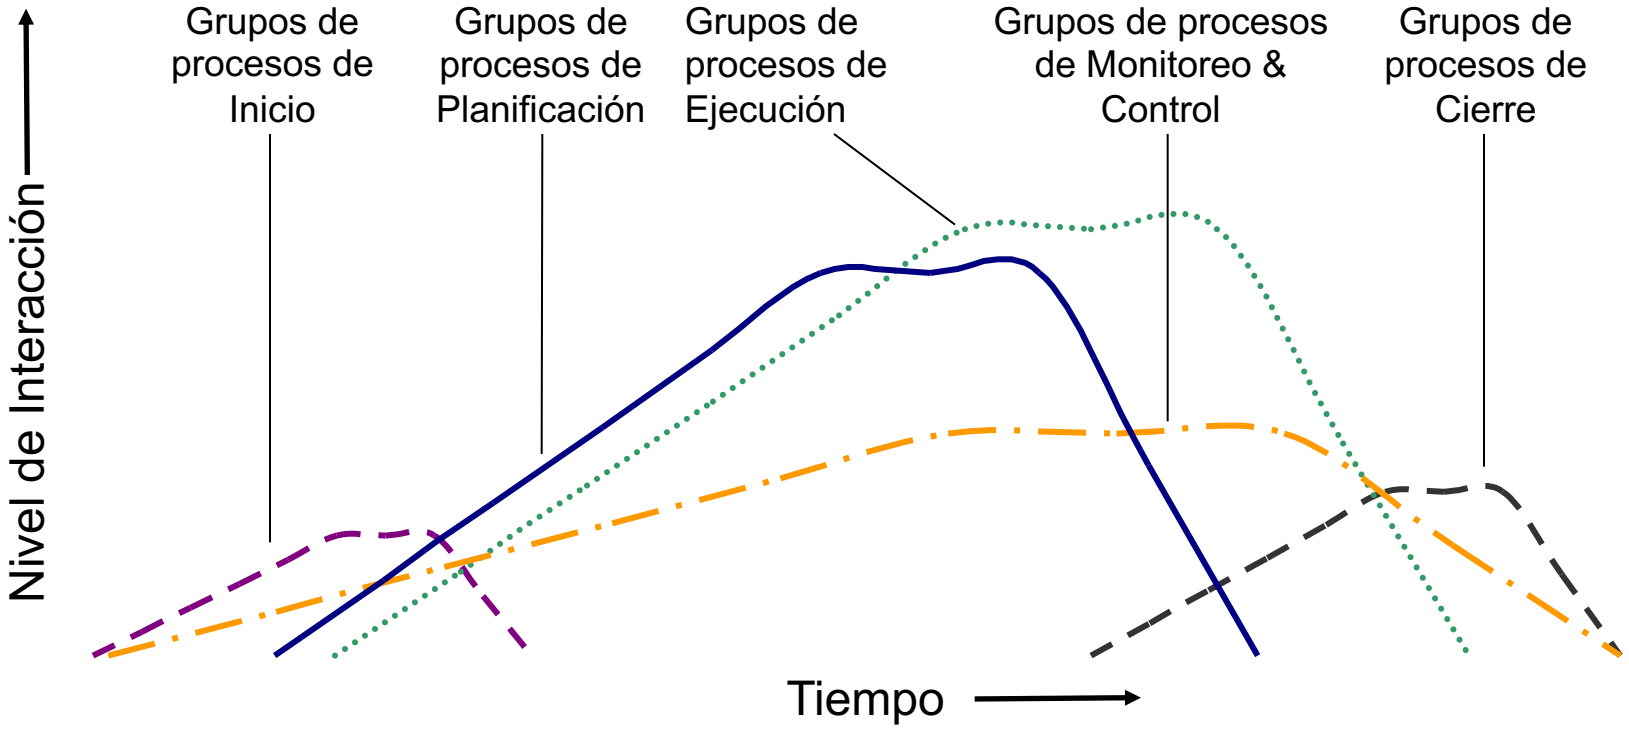

El de integración es un esfuerzo clave en el desempeño del proyecto debido a que su gestión no fluye de manera secuencial y constantemente se superponen situaciones que implican tomar decisiones que en muchos casos son excluyentes. La integración es importante donde los procesos individuales interactúan.
Los gerentes de proyecto más experimentados entienden que no existe una manera única de llevar un proyecto adelante, aplican conocimientos, habilidades y procesos en un orden definido con distinta rigurosidad para obtener los resultados esperados.

Integración

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto Project Charter	Inicio
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto (PGP)	Planificación
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto	Ejecución
Gestionar el Conocimiento del Proyecto	Ejecución
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	Seg. & Ctrol
Realizar el control integrado de cambios	Seg. & Ctrol
Cerrar proyecto o fase del proyecto	Cierre

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Acta de Constitución del Proyecto

«Documento que autoriza formalmente el proyecto y otorga al Gerente del Proyecto la autoridad para utilizar los recursos de la organización»*

- El Gerente del Proyecto debe ser designado lo antes posible, siempre debe ser designado previo a iniciar la fase de planificación.
- Un sponsor externo al proyecto, con un nivel adecuado para asignar recursos, confecciona el Acta de Constitución.
- En ciertas organizaciones un proyecto no se considera formalmente aceptado si previamente no se efectuó un estudio de factibilidad para el mismo.
- Una de las funciones del Acta de Constitución es documentar los motivos que dieron origen al proyecto
- El acta de constitución equivale a un acuerdo entre la organización ejecutante del proyecto y la organización que lo requiere.
- Es recomendable que el Gerente de Proyecto participe de la redacción del acta



UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Acta de Constitución del Proyecto

Entradas

1. Documentos de Negocio:
   - Caso de Negocio
   - Plan de Gestión de Beneficios
2. Acuerdos
3. Factores Ambientales
4. Activos de los Procesos de la Organización

H. & T.

1. Juicio de Expertos
2. Recopilación de Datos:
   - Tormenta de Ideas
   - Grupos Focales
   - Entrevistas
3. Habilidades Interpersonales y de Equipo:
   - Gestión de Conflictos
   - Facilitación
   - Gestión de Reuniones
4. Reuniones

Salidas

1. Acta de Constitución del Proyecto
2. Registro de Supuestos

Acta de Constitución del Proyecto

1. Caso de Negocio

Es básicamente el análisis de viabilidad del proyecto desde un punto de vista económico-financiero. Suele incluir una descripción de la necesidad del negocio que da origen al proyecto y algún tipo de análisis Costo-Beneficio

Básicamente existen dos tipos de métodos para evaluar un proyecto:

- Beneficio: modelos económicos, de contribución, ponderaciones, etc.
- Matemáticos: programación lineal, algoritmos, etc.

2. Acuerdos

Acuerdos vínculantes entre partes, suelen utilizarse para clarificar el vínculo.

3. Factores Ambientales de la Empresa

- Cultura y estructura organizacional
- Estándares gubernamentales e Industriales
- Infraestructura
- Condiciones de mercado
- Tolerancia al riesgo por parte de los interesados
- Etc.

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Acta de Constitución del Proyecto

4. Activos de los Procesos de la Organización

Procesos y Procedimientos:

- Procesos de la organización
- Plantillas (templates)
- Instructivos y guías
- Requisitos
- Normas

Base de Conocimiento de la Compañía

- Archivos de proyectos anteriores
- Información histórica
- Lecciones aprendidas
- Bases de datos



Acta de Constitución del Proyecto

1.Juicio de Expertos

- Otras unidades en la empresa
- Consultores
- Interesados
- Grupos industriales
- Asociaciones técnicas y profesionales

2.Recopilación de datos

- Brainstorming
- Gupos Focales
- Entrevistas



Acta de Constitución del Proyecto

Puntos que deben detallarse, directamente o mediante referencia a otros documentos, en el desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

- Requisitos de los interesados
- Necesidades del negocio
- Propósito o justificación del proyecto
- Gerente de proyecto asignado y su nivel de autoridad
- Resumen de hitos
- Influencia de los interesados
- Participación de la estructura funcional
- Supuestos
- Restricciones
- Presupuesto resumido

Acta de Constitución del Proyecto

2.Registro de Supuestos

Supuesto es toda situación que se da por un hecho para el proyecto. El equipo de proyecto planifica en base a supuestos.

Si algún supuesto no fuera validado por los interesados clave puede representar un gran inconveniente para el equipo de proyecto.

Restricciones son todas aquellas cuestiones que limitan la capacidad de acción del equipo de proyecto. Pueden ser entre otas:

- Presupuestarias
- Temporales
- De margen de acción
- Otras

Desarrollar Plan de Dirección del Proyecto

"Define cómo se ejecutará, controlará y cerrará el proyecto"*. Documenta las salidas del grupo de procesos de planificación

Puntos que deben detallarse, directamente o mediante referencia a otros documentos, en el desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto (Project Management Plan - PMP)


- Los procesos de gestión seleccionados por el equipo del proyecto (tailoring)
- El nivel de implementación de cada proceso
- Las descripciones de las herramientas y técnicas a utilizar
- Cómo se utilizarán los procesos seleccionados
- Cómo se ejecutará el trabajo
- Cómo se controlaran los cambios
- Cómo se gestionará la configuración
- Cómo se conservará la integridad de la línea de base
- Necesidades de información de los interesados
- El ciclo de vida seleccionado para el proyecto
- Cronograma de revisiones de gestión

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Plan de Gestión del Proyecto

Planes subsidiarios que puede incluir el Plan de Gestión del Proyecto:

- Plan de Gestión del Alcance
- Plan de Gestión de Requerimientos
- Plan de Gestión del Cronograma
- Plan de Gestión del Costo
- Plan de Gestión de la Calidad
- Plan de Mejora de Procesos
- Plan de Gestión de Recursos Humanos
- Plan de Gestión de la Comunicación
- Plan de Gestión del Riesgo
- Plan de Gestión de Adquisiciones

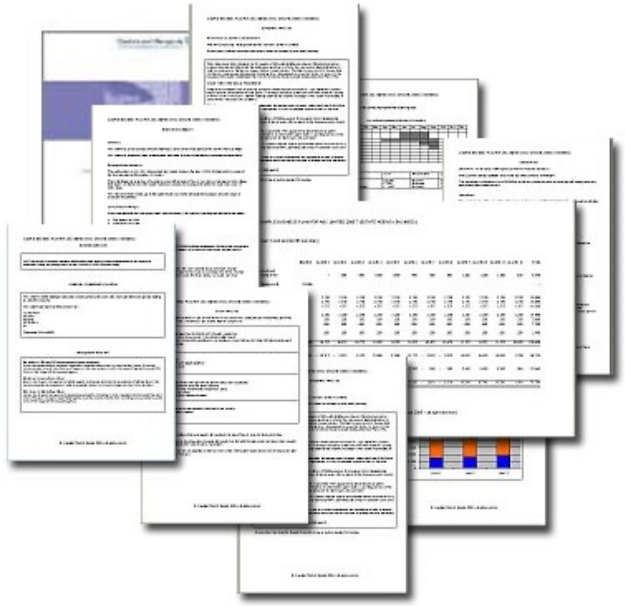

Es importante comprender las diferencias entre el Plan de Gestión del Proyecto y sus documentos

Plan de Gestión del Proyecto

Entradas

1. Acta de Constitución del Proyecto
2. Salidas de otros procesos.
3. Factores Ambientales
4. Activos de los Procesos de la Organización

H. & T.

1. Juicio de Expertos
2. Recopilación de Datos
3. Habilidades Interp. y de equipo
4. Reuniones

Salidas

1. Plan para la Dirección del Proyecto (Project Management Plan – PMP)



Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (*PMBOK® Guide*) – Sixth Edition. Página 82

Plan de Gestión del Proyecto

2.Salidas de los procesos de planificación

Grupo	Proceso	Area de Conocimiento										
		Integr.	Alcance	Tiempo	Costo	Calidad	Recursos	Comunic.	Riesgos	Adquisc.	Interes.	Total
Planificación	4.2 Desarrollar el Plan para Dirección del Proyecto (Project Management Plan)	x										24
	5.1 Planificar Gestión del Alcance (Plan Scope Management)		x									
	5.2 Recopilar Requerimientos (Collect Requirements)		x									
	5.3 Definición del Alcance (Scope Definition).		x									
	5.4 Crear la EDT (Create WBS).		x									
	6.1 Planificar Gestión del Cronograma (Plan Schedule Management)			x								
	6.2 Definición de las Actividades (Activity Definition).			x								
	6.3 Secuencia de las Actividades (Activity Sequencing).			x								
	6.4 Estimación de la Duración de las Actividades			x								
	6.5 Desarrollo del Cronograma (Schedule Development).			x								
	7.1 Planificar Gestión de Costos (Plan Cost Management)				x							
	7.2 Estimación de Costos. (Cost Estimating).				x							
	7.3 Determinar el Presupuesto. (Cost Budgeting).				x							
	8.1 Planificación de la Calidad (Quality Planning)					x						
	9.1 Planificar la Gestión de los Recursos (Plan Resource Management)						x					
	9.2 Estimar los Recursos de las Actividades						x					
	10.1 Planificación de las Comunicaciones (Plan Communications)							x				
	11.1 Planificación de la Gestión de Riesgos (Plan Risk management)								x			
	11.2 Identificación de Riesgos (Risk Identification).								x			
	11.3 Análisis Cualitativo de Riesgos (Qualitative Risk Analysis)								x			
	11.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos (Quantitative Risk Analysis)								x			
	11.5 Planificación de la Respuesta a los Riesgos (Risk Responses)								x			
	12.1 Planificar las Adquisiciones (Plan Procurement Management)									x		
	13.2 Planificar Involucramiento de Interesados (Plan Stakeholders Management)										x	

Acta Constitución | Salidas otros Procesos | Factores Ambientales | Activos Procesos | E

Plan de Gestión del Proyecto


3. Factores Ambientales de la Empresa

Entre los factores ambientales que pueden afectar el proceso es apropiado resaltar al PMIS (Project Management Information System) termino que representa al conjunto de herramientas tecnológicas disponibles en la empresa para la gestión de proyectos

4. Activos de los Procesos de la Organización

Entre los activos de los procesos de la organización que pueden afectar el proceso es apropiado resaltar los procedimientos orientados a administrar los siguientes aspectos:


- Gestión de la Configuración:
  - Involucra los procesos necesarios para proponer cambios, sistemas de monitoreo para su revisión y aprobación
  - En la mayoría de los casos incluye al sistema de control de cambios
  - Identifica características técnicas y funcionales y controla cambios
  - Soporta auditorías a los productos o servicios
- Control de Cambios
  - Colección formal de procedimientos
  - Es parte del Sistema de Gestión de la Configuración

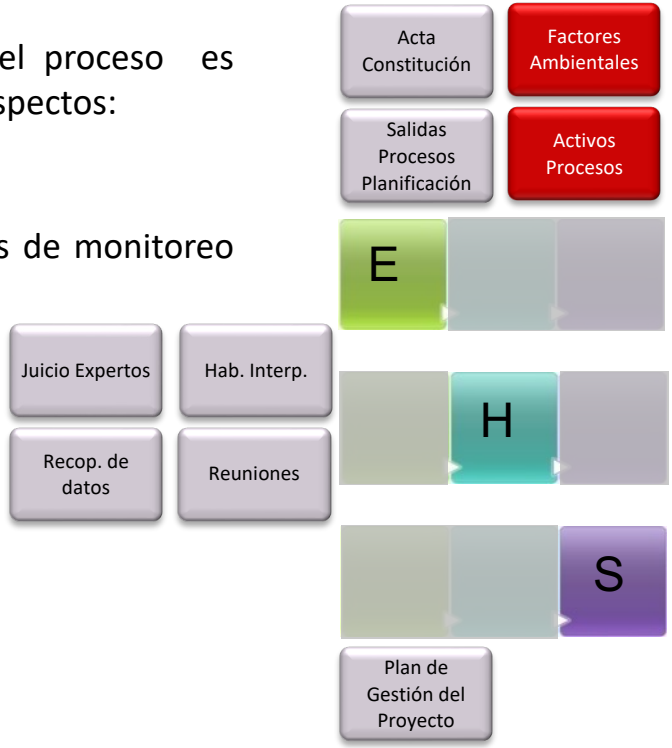

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto

Requiere la realización de múltiples acciones con el objeto de ejecutar el Plan de Dirección del Proyecto a fin de cumplimentar el trabajo definido en la Definición de Alcance del Proyecto

- *Plan de Gestión del Proyecto*
- *Definición de Alcance del Proyecto*

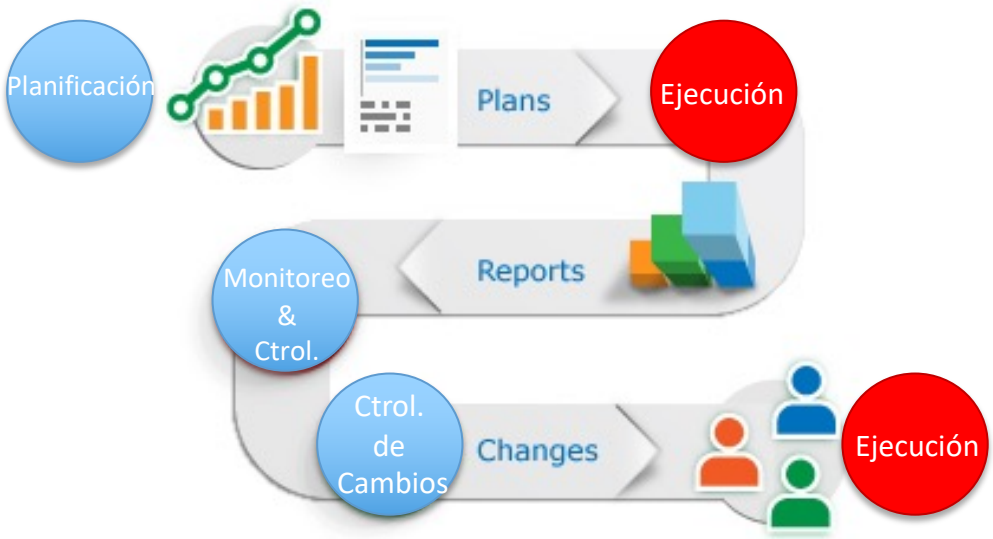

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto

- Realizar actividades e invertir esfuerzos y recursos con el fin de concretar los objetivos del proyecto
- Obtener, gestionar y desarrollar a los miembros del proyecto



- Obtener ofertas, propuestas o cotizaciones según corresponda
- Seleccionar proveedores
- Crear, controlar y validar entregables
- Gestionar el riesgo e implementar actividades de respuesta
- Gestionar proveedores

- Adaptar los cambios aprobados en el alcance del proyecto, planes y entorno
- Recolectar datos de la evolución de costos, cronograma, calidad, etc. a fin de facilitar la creación de pronósticos
- Registrar lecciones aprendidas e implementar planes de mejoras de procesos

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto

Acta de Constitución | Plan de Gestión del Proyecto | **Dirigir y Gestionar Ejecución** | Gestionar el Conocimiento del Proyecto | Supervisar y Controlar Trabajo | Control Integrado de Cambios | Cierre de Proyecto o Fase

Entradas

1. Plan de Dirección del Proyecto
2. Documentos del proyecto
3. Solicitudes de cambio aprobadas
4. Factores Ambientales
5. Activos de los Procesos de la Organización

H. & T.

1. Juicio de Expertos
2. Project Management Information Systems (PMIS)
3. Reuniones

Salidas

1. Entregables
2. Datos de desempeño del trabajo
3. Registro de incidentes
4. Solicitudes de cambio
5. Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto
6. Actualizaciones a documentación del proyecto
7. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto

2.Documentos del Proyecto

- Registro de Cambios
- Regsitro de Lecciones Aprendidas
- Lista de Hitos
- Comunicaciones del proyecto
- Cronograma del Proyecto
- Matriz de trazabilidad de requisitos
- Registro de Riesgos
- Informe de Riesgos

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto

3.Solicitudes de Cambio Aprobadas

«Cambios documentados y autorizados que impactan sobre distintos aspectos que componen el proyecto»*

Las Solicitudes de Cambio pueden requerir la implementación de:

Acciones Correctivas Aprobadas

*«Directivas documentadas y autorizadas cuyo objetivo es alinear el rendimiento futuro del proyecto con su Plan de Gestión»**

Acciones Preventivas Aprobadas

*«Directivas documentadas y autorizadas cuyo objetivo es reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos asociados a los riesgos del proyecto»**

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto

1.Entregables

Producto único verificable que debe ser creado para completar el proyecto

2.Datos de desempeño del trabajo

- Avance del cronograma
- Detalle de entregables completos y no completos
- Actividades comenzadas y actividades finalizadas
- Conformes y no conformes de calidad
- Costos incurridos
- Estimaciones de finalización para actividades comenzadas
- Detalle de uso de recursos
- Etc.



Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto


3. Registro Incidentes

- Tipo de Incidente
- Quién lo planteó y cuando
- Descripción
- Prioridad
- A quién se asignó su resolución
- Fecha límite resolución
- Estado
- Solución final

6. Actualización Documentación del Proyecto

- Lista de actividades
- Registro de supuestos
- Registro de lecciones aprendidas
- Documentación de requisitos
- Registro de riesgos
- Registro de interesados

Gestionar el Conocimiento del Proyecto



Implica capitalizar el conocimiento disponible en el proyecto de forma tal de alcanzar los objetivos planteados. Busca generar nuevo conocimiento y contribuir al aprendizaje organizacional.

- Los beneficios fundamentales que aporta este proceso es que se utiliza el conocimiento previo y se genera nuevo conocimiento proyecto a proyecto.
- El conocimiento se puede dividir en “explicito” (conocer) y “tácito” (saber hacer) se deben gestionar ambos tipos de conocimiento.
- Se ocupa de potenciar la probabilidad de que los conocimientos se trasladen a lo largo del tiempo y por toda la organización.
- Se debe generar un clima de confianza que potencie el flujo del conocimiento, generando incentivos concretos a tal fin.
- Se puede apalancar con la utilización de tecnología específica.

Gestionar el Conocimiento del Proyecto

Acta de Constitución | Plan de Gestión del Proyecto | Dirigir y Gestionar Ejecución | **Gestionar el Conocimiento del Proyecto** | Supervisar y Controlar Trabajo | Control Integrado de Cambios | Cierre de Proyecto o Fase

Entradas

1. Plan de Dirección del Proyecto
2. Documentos del proyecto
3. Entregables
4. Factores Ambientales
5. Activos de los Procesos de la Organización

H. & T.

1. Juicio de Expertos
2. Gestión del Conocimiento
3. Gestión de la Información
4. Habilidades interpersonales y de equipo

Salidas

1. Registro de lecciones aprendidas
2. Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto
3. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

Gestionar el Conocimiento del Proyecto

2.Documentos del Proyecto

- Registro de Lecciones Aprendidas
- Asignaciones del equipo del proyecto
- Estructura de desglose de recursos
- Registro de interesados

5.Activos de los Procesos

- Políticas y procedimientos estandar
- Gestión del personal
- Requisitos de comunicación de la organización
- Procedimientos formales de intercambio de conocimiento

4.Factores Ambientales

- Cultura organizacional
- Distribución geográfica
- Expertos en conocimiento disponibles
- Requisitos o restricciones regulatorias (por ejemplo NDA)

Gestionar el Conocimiento del Proyecto

2.Gestión del Conocimiento

Conectan personas

- Talleres
- Comunidades de práctica
- Reuniones
- Foros
- Eventos
- Otros

3.Gestión de la Información

Conectan personas con información

- Métodos de codificación
- Registro de lecciones aprendidas
- Servicios de biblioteca
- PMIS


4.Habilidades Interpersonales

- Escucha activa
- Facilitación
- Liderazgo
- Creación de relaciones de trabajo
- Conciencia política



Monitorear y Controlar la Ejecución del Proyecto

- Comparar situación actual del proyecto con su Plan de Gestión
- Obtener información para determinar si es necesaria alguna acción preventiva o correctiva
- Analizar y monitorear riesgos
- Mantener información precisa y oportuna respecto la concreción del proyecto
- Suministrar información para reportes, mediciones d progreso y pronósticos

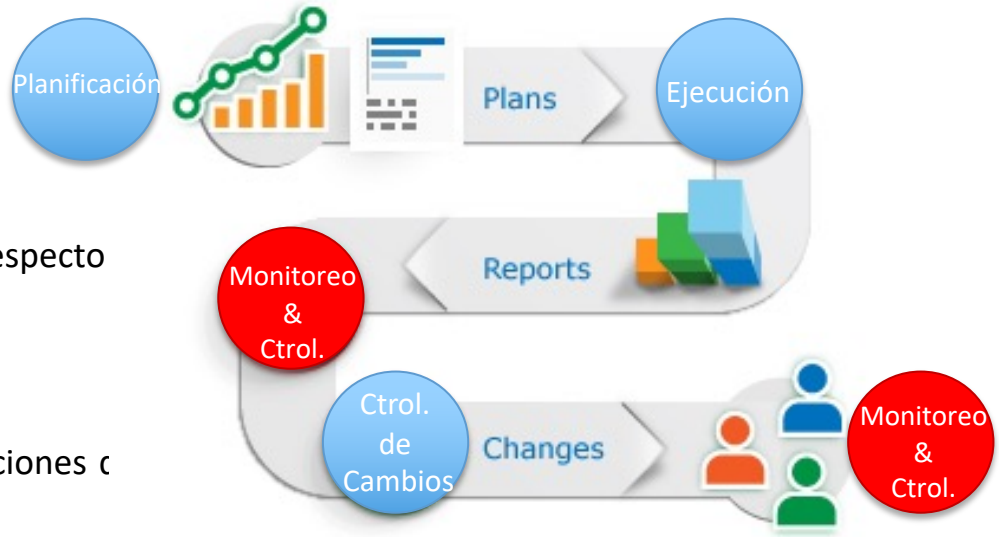

- Monitorear la implementación de cambios aprobados cuando los mismos deban ocurrir

Monitorear y Controlar la Ejecución del Proyecto

Entradas

1. Plan para la Dirección del Proyecto
2. Documentos del Proyecto
3. Acuerdos
4. Información de desempeño del trabajo
5. Factores Ambientales
6. Activos de los Procesos de la Organización

H. & T.

1. Juicio de Expertos
2. Análisis de datos
3. Tema de decisiones
4. Reuniones

Salidas

1. Informes de desempeño
2. Solicitudes de cambio
3. Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto
4. Actualizaciones a documentación del proyecto



Comparación con Objetivos Formato y elaboración

Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (*PMBOK® Guide*) – Sixth Edition. Página 105

2. Análisis de datos

Son utilizadas para proyectar resultados posibles basados en potenciales variaciones del entorno del proyecto:

- Análisis de Alternativas
- Causa Raíz
- Costo Beneficio
- Análisis de Variación
- Métodos de proyección
- Modos de falla
- Análisis de Reserva
- Tendencias
- Valor Ganado


Al avanzar en el análisis de la metodología se revisarán cada una de estas herramientas y técnicas.



2. Informes de Desempeño

Son la representación física o electrónica de la información de performance, orientada a la toma de decisiones, acciones o concientización.

Su elaboración se basa en la difusión de las métricas definidas para el proyecto.



Control Integrado de Cambios

El Control Integrado de Cambios es necesario por que nunca un proyecto se ejecuta totalmente de acuerdo con su Plan de Gestión. Los eventuales cambios deben ser analizados, rechazados o aprobados e incluidos en una nueva línea de base.

Línea de Base es un plan integrado contra el cual se comparan los resultados obtenidos. Puede ser de Costo, Alcance, Cronograma, Calidad, etc.

El Control Integrado de Cambios es parte del Sistema de Gestión de la Configuración. En conjunto persiguen tres objetivos básicos:

- Establecer un método evolutivo para identificar y solicitar cambios de las líneas de base establecidas y para medir la eficacia de los mismos
- Generar la posibilidad de validar constantemente la evolución del proyecto considerando el impacto de cada cambio
- Definir un mecanismo para el equipo de gestión del proyecto con el cuál comunicar todos los cambios a los interesados

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Control Integrado de Cambios

- Revisar y aprobar solicitudes de cambio
- Identificar que un cambio ha ocurrido o está por ocurrir
- Gestionar el flujo de cambios, cuándo y cómo ocurren
- Mantener la integridad de las líneas de base
- Validar la reparación de defectos
- Documentar el impacto de los cambios





- Controlar la calidad del proyecto basado en reportes
- Revisar y aprobar acciones preventivas y correctivas
- Eliminar los factores que interfieren el control integrado de cambios a fin de garantizar que solo los cambios aprobados sean implementados

Control Integrado de Cambios

Pasos a seguir frente a un cambio:



1. Evaluar Impacto
2. Crear Opciones
3. Convencer al equipo del proyecto
4. Convencer al cliente

Control Integrado de Cambios

Entradas

1. Plan de Gestión del Proyecto
2. Documentos del Proy.
3. Información de desempeño del trabajo
4. Solicitudes de cambio
5. Factores Ambientales
6. Activos de los Procesos de la Organización

H. & T.

1. Juicio de Expertos
2. Herramientas de Control de cambios
3. Análisis de datos
4. Toma de decisiones
5. Reuniones

Salidas

1. Solicitudes de Cambio Aprobadas
2. Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto
3. Actualizaciones a documentación del proyecto
   - Registro de cambios

El Control Integrado de Cambios puede involucrar a un comité de control de cambios, el cuál es responsable por la aprobación y rechazo de los mismos.

Cierre del Proyecto o Fase del Proyecto

"Implica la finalización de todas las tareas comprendidas en el proyecto o en una de sus fases (el proceso se aplica siempre que se finaliza una), la transferencia de los entregables definidos y su verificación."*

Existen 2 procedimientos para establecer las interacciones necesarias a fin de poder ejecutar el cierre del proyecto:

- Cierre administrativo: actividades necesarias para recopilar registros del proyecto, analizar el éxito o fracaso, documentar lecciones aprendidas y archivar toda la información para su uso futuro.
- Cierre de contrato: actividades para cerrar cualquier contrato establecido para el proyecto

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide* – Sixth Edition, PMI;Inc. 2017

Cierre del Proyecto o Fase del Proyecto

Entradas

1. Acta de Constitución
2. Plan para dirección del Proyecto
3. Documentos del proyecto
4. Entregables aceptados
5. Documentos de negocio
6. Acuerdos
7. Documentación de las adquisiciones
8. Activos de los procesos de la organización

H. & T.

1. Juicio de Expertos
2. Análisis de datos
3. Reuniones

Salidas

1. Actualizaciones a los documentos.
   - Lecciones aprendidas
2. Transferencia del producto, servicio o resultado final.
3. Informe final.
4. Activos de los procesos de la organización (actualizados)

Cierre del Proyecto

Causas de finalización de proyectos:

