

Programa Ejecutivo en Project Management

Clase 8 - Gestión de Recursos



Matías Castano Lucero

- MBA, CSM
- Director Programa Ejecutivo en Agile Management
- MADE, Especialización en Gestión de Proyectos
- Programa Ejecutivo en Agile Management y Project Management
- Licenciatura en Negocios Digitales
- UCEMA Senior
- +25 años experiencia profesional

linkedin.com/in/matias-castano-lucero

Intro


PMBOK cambios 5ta a 6ta edición


X1.17 SECCIÓN 9—CAMBIOS A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO

La Sexta Edición amplió el alcance de esta sección a partir de su enfoque anterior sobre los recursos humanos a fin de incluir todos los recursos. Para distinguir entre los recursos humanos y los demás recursos, se utiliza el término recursos del equipo para referirse a los recursos humanos y el término recursos físicos se utiliza para referirse a otros recursos. El proceso Estimar los Recursos de las Actividades se transfirió a esta Área de Conocimiento desde la Gestión del Cronograma del Proyecto, y se añadió un nuevo proceso Controlar los Recursos. La palabra "proyecto" fue eliminada de Desarrollar el Equipo y de Dirigir al Equipo, ya que se infiere que el único equipo del cual el director del proyecto está preocupado por su desarrollo y la gestión es el equipo del proyecto.

Se implementaron los cambios consistentes con la información que se describe en las Secciones desde la X1.1 hasta la X1.11. La Tabla X1-4 resume los procesos de la Sección 9:

Procesos de la Quinta Edición	Procesos de la Sexta Edición	
9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos	9.1 Planificar la Gestión de Recursos	
9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto	9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	NUEVO (Cronograma)
9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto	9.3 Adquirir Recursos	
9.4 Dirigir el Equipo del Proyecto	9.4 Desarrollar el Equipo	
	9.5 Dirigir al Equipo	
	9.6 Controlar los Recursos	NUEVO

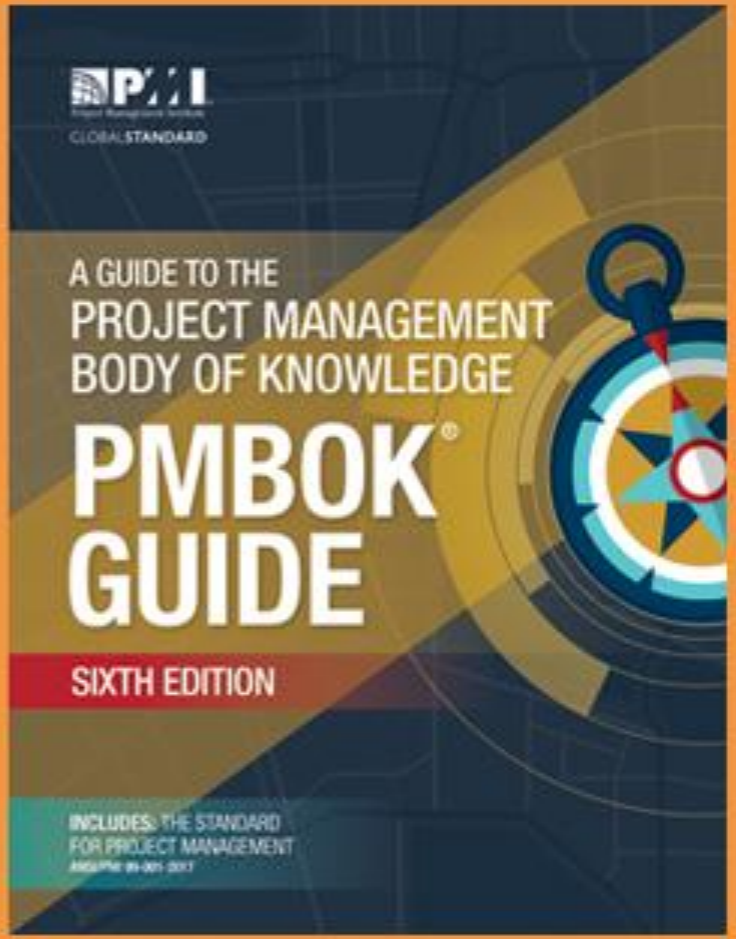

PMI
GLOBAL STANDARD
A GUIDE TO THE
PROJECT MANAGEMENT
BODY OF KNOWLEDGE
PMBOK®
GUIDE
SIXTH EDITION
INCLUDES: THE STANDARD
FOR PROJECT MANAGEMENT

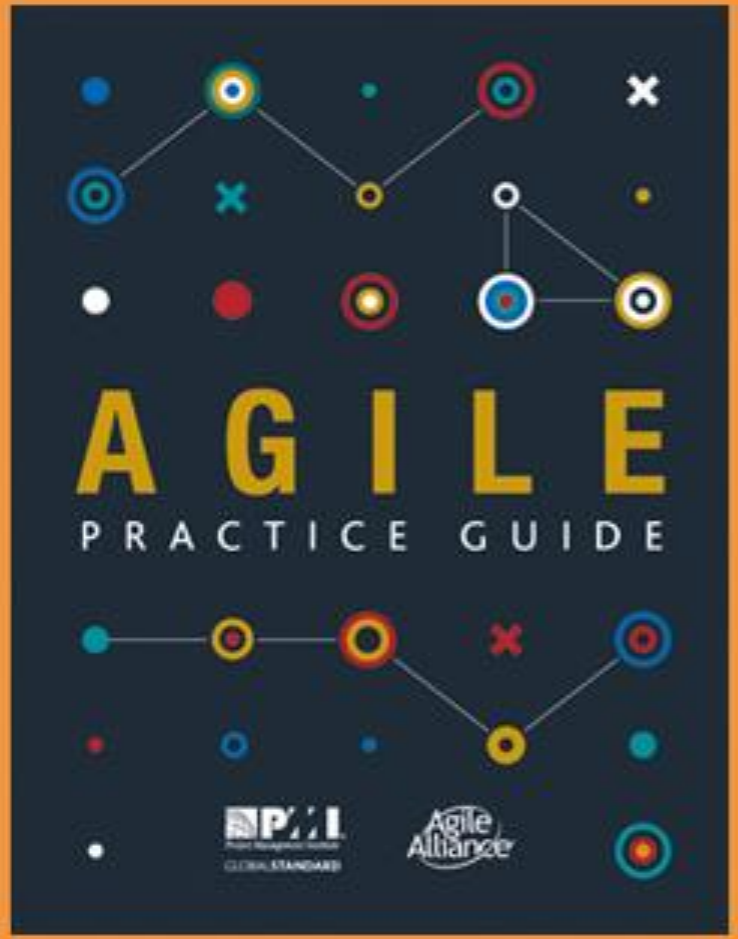
AGILE
PRACTICE GUIDE
PMI
Agile Alliance

Grupos de procesos

Inicio	Planeación	Ejecución	Monitoreo y control	Cierre
2.- Identificar a los interesados	4.- Planificar el involucramiento de los interesados	29.- Gestionar la participación de los Interesados	39.- Monitorear el involucramiento de los interesados	
	26.- Planificar la gestión de las adquisiciones	34.- Efectuar las adquisiciones	48.- Controlar la adquisiciones	
	12.- Planificar la gestión de los riesgos; 13.- Identificar los riesgos; 14.- Realizar el análisis cualitativo de riesgos; 15.- Realizar el análisis cuantitativo de riesgos; 16.- Planificar la respuesta a los riesgos	36.- Implementar la respuesta a los riesgos	43.- Monitorear los riesgos	
	25.- Planificar la gestión de las comunicaciones.	33.- Gestionar las comunicaciones	42.- Monitorear las comunicaciones	
	17.- Planificar la gestión de recursos; 20.- Estimar los recursos de las actividades	30.- Adquirir recursos; 31.- Desarrollar el equipo; 32.- Dirigir al equipo	45.- Controlar los recursos	
	24.- Planificar la gestión de la calidad	35.- Gestionar la calidad	44.- Controlar la calidad	
	18.- Planificar la gestión de los costos; 19.- Estimar los costos; 23.- Determinar el presupuesto		41.-Controlar los costos	
	9.- Planificar la gestión del cronograma; 10.- Definir las actividades; 11.-Secuenciar las actividades; 21.- Estimar la duración de las actividades; 22.- Desarrollar el cronograma		40.- Controlar el cronograma	
	5.- Planificar la gestión del alcance; 6.- Recopilar los requisitos; 7.- Definir el alcance; 8.- Crear la EDT/WBS		46.- Validar el alcance; 47.- Controlar el alcance	
1.- Desarrollar el acta de constitución del proyecto	3.- Desarrollar el plan para la dirección del proyecto	27.- Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto; 28.- Gestionar el conocimiento del proyecto	37.- Monitorear y controlar el trabajo del proyecto; 38.- Realizar el control integrado de cambios	49.- Cerrar el proyecto o fase


PMBOK® GUIDE 6
49 PROJECT MANAGEMENT PROCESSES



Grupos de procesos

Inicio	Planeación	Ejecución	Monitoreo y control	Cierre

17.- Planificar la gestión de recursos 20.- Estimar los recursos de las actividades	30.- Adquirir recursos	31.- Desarrollar el equipo	32.- Dirigir al equipo	45.- Controlar los recursos



"Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. Estos procesos ayudan a garantizar que los recursos adecuados estarán disponibles para el director del proyecto y el equipo del proyecto en el momento y lugar adecuados. "*

conceptos que introduce PMBOK6 para la gestión de recursos



RECURSOS FÍSICOS Y DEL EQUIPO

- Equipamiento, materiales, instalaciones e infraestructura vs recursos humanos



PM COMO LÍDER

- Formador y desarrollador del equipo



PM COMO GESTOR

- Asignación y utilización de los recursos físicos



TENDENCIAS Y PRÁCTICAS

- Métodos para gestión de recursos (Lean, JIT, Kaizen, etc)
- Inteligencia emocional
- Equipos auto-organizados

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

algunos conceptos CLAVE

Empoderamiento del equipo: la participación de todos los miembros del equipo en la toma de decisiones y en la planificación es beneficiosa.

PM debe tener en cuenta aspectos que influyen sobre el Equipo:

- **Entorno** del equipo
- Ubicación **geográfica** de los miembros
- **Comunicación** entre interesados
- **Gestión de cambio** en la organización
- **Políticas** internas y externas
- Cuestiones **culturales**
- Otros factores que puedan afectar el desempeño del proyecto



*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

contexto de trabajo

Contextos de negocio diferentes necesitan organizaciones distintas

Desafíos del contexto


- Clientes
- Competidores
- Accionistas
- Economía
- Gobierno
- Sociedad

Diseño Organizacional

- Estrategia
- Estructuras
- Misión
- Productos
- Prácticas tecnológicas

Implicancia en las personas


- Roles
- Responsabilidades
- Hábitos
- Pensamiento
- Valores
- Conductas

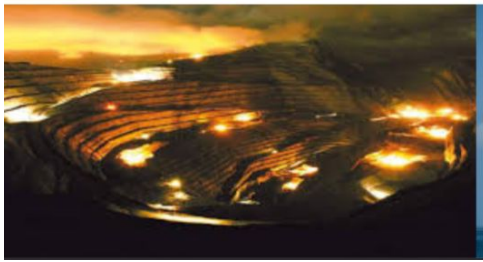





evolución del contexto

¿Cómo cambia el contexto según el paso del tiempo?

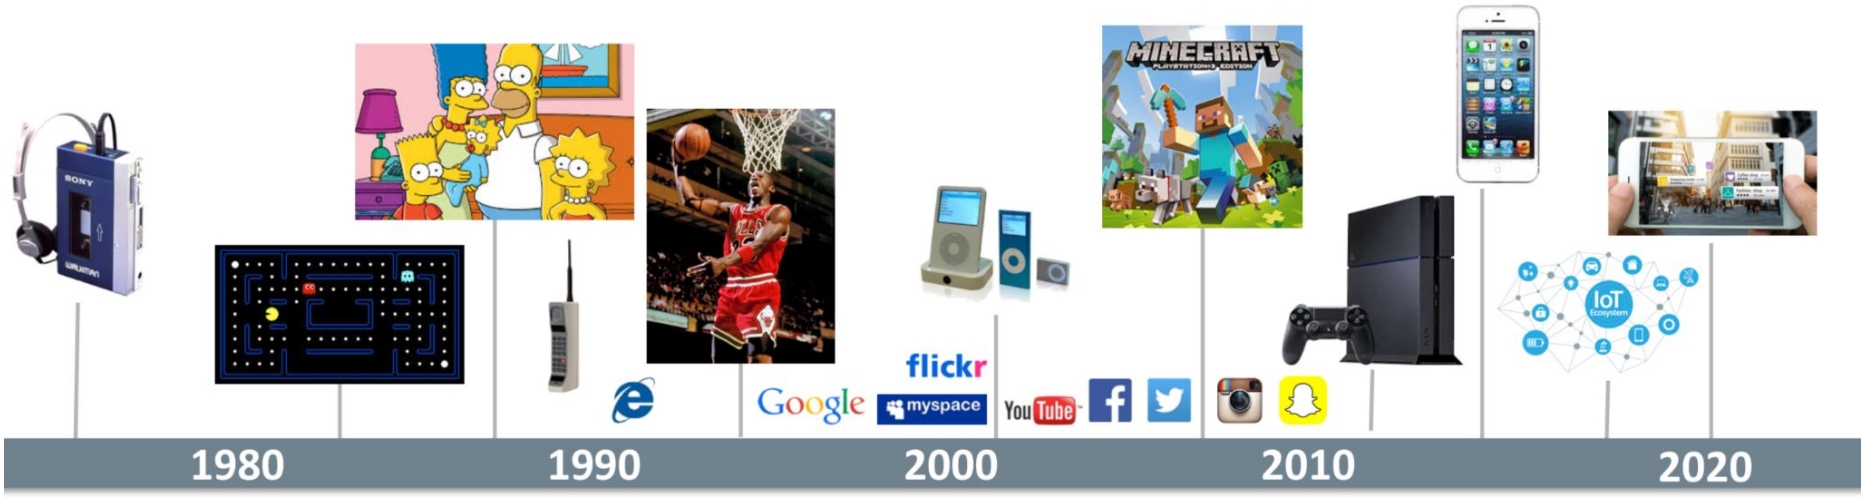


¿Cómo nos influencia ese cambio?

...ahora bani

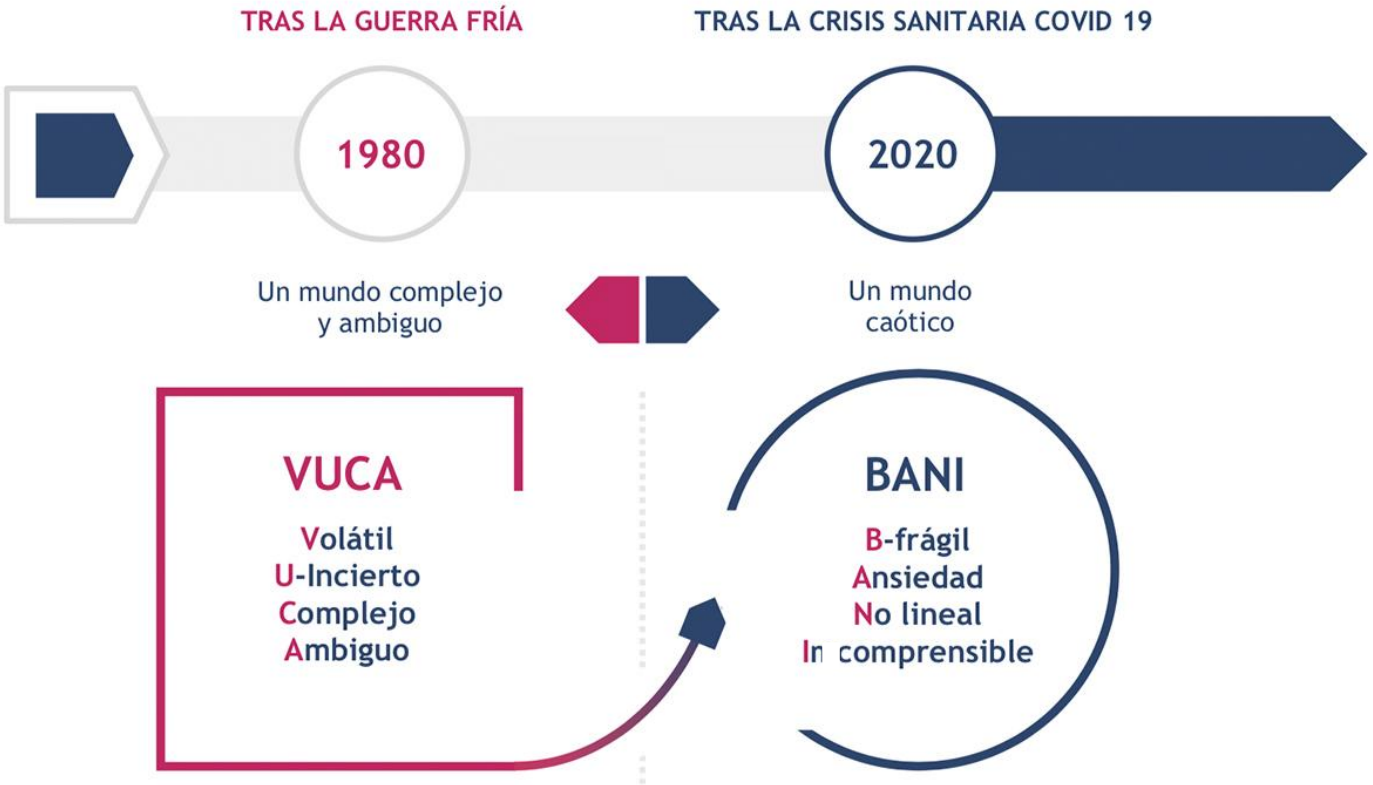
TRAS LA GUERRA FRÍA
TRAS LA CRISIS SANITARIA COVID 19
1980
2020
Un mundo complejo y ambiguo
Un mundo caótico
VUCA
Volátil
U-Incierto
Complejo
Ambiguo
BANI
B-frágil
Ansiedad
No lineal
In comprensible

economía digital

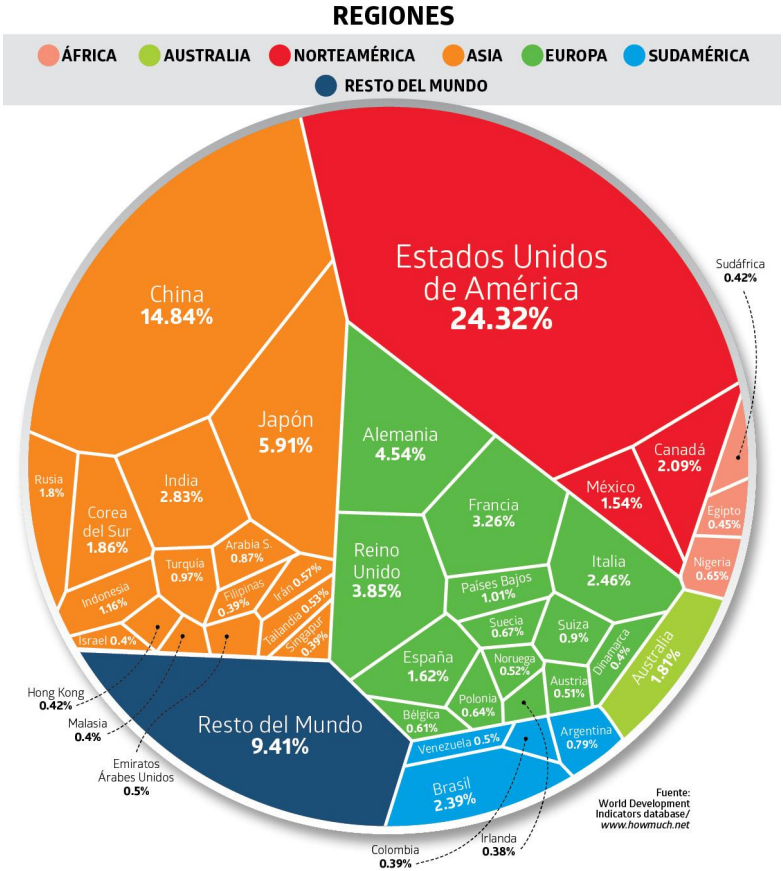

2020

25%

2030

50%

cambios en el contexto del trabajo



Desafío: comprender la evolución y manejar la multiplicidad. “A mí también me pasa”



Fuente: Jacob Morgan, Forbes, The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive Organization, 2014

Fuente: Enric Nerin Alins (@EnricNerinAlins) | Twitter

nuevo contexto basado en trabajo en equipo

Entonces…

…los desafíos son otros:

- Cómo comprometer
- Cómo ser un miembro del equipo siendo el jefe
- Cómo manejar la performance sin deteriorar las relaciones
- Cómo crear un proceso participativo
- Cómo no deteriorar ninguno de los roles que tengo

- El nuevo rol del jefe
- Gestionar el desempeño
- Gestionar el desarrollo
- Desarrollar equipos de alto rendimiento







competencias del PM



desafíos del PM

Estrategia del Negocio

Objetivos de la Empresa

Objetivos del Proyecto

Organización y Sistemas



Necesidades de la personas

Motivación

Capacidades

Nuevos conocimientos

Nuevos comportamientos

gestionar las RESTRICCIONES

¿qué tipos de recursos manejamos?



...y los recursos son RESTRICCIONES



- ➔ **limitados**
- ➔ **disponibilidad**
  - ◆ existencia (cantidad)
  - ◆ oportunidad de acceder (tiempo)

impactan en Gestión de Riesgos y Supuestos del proyecto

Un caso real

Nuestro Proyecto – Necesidad del Cliente

- El nuevo DNI no permitía generar una constancia de votación







- Las fotos de los votantes, obtenidas por la campaña de renovación del DNI constituyeron una oportunidad para mejorar la seguridad del proceso de votación
- Con ese marco se solicitó el desarrollo de una solución que permita optimizar el proceso de votación para las elecciones 2013



Antiguo Padrón



Nuevo Padrón

Nuestro Proyecto – Alcance

Integración Plataforma Tecnológica

- Hardware
- Software
- Procesos

Tecnología para impresión de dataos variables

Tecnología para finishing

Tecnollogía para procesamiento

Tecnología para impresión alternativa b&w

Despliegue de Plataforma Tecnológica

- Sitio de Impresión
- Equipamiento
- Software
- Operadores







Planificación Proyecto

- Alcance
- Cronograma
- Presupuesto
- Riesgos
- Calidad
- Adquisiciones
- Comunicaciones
- RRHH

Ejecución Proyecto

Procesamiento de Datos → Impresión de Padrones → Trabajos Adicionales

Seguimiento & Control

- Imágenes Impresas por Hora
- Páginas Cortadas por Hora
- Errores de Calidad
- Tiempos improductivos
- Mantenimiento & Setup
- Hitos alcanzados

Documentación & Cierre

- Cierre administrativo y de contrato
- Verificación de alcance

Transferencia Tecnológica

- Operadores
- ONE 2013
- Padrones 2015
- Plan de desarrollo para el Nuevo sector productivo

Nuestro Proyecto – Desafíos

Factores Ambientales Externos

- Gestión pública con alta exposición por la importancia del Proyecto para el país
- Primer Proyecto de este tipo en la región
- Alto nivel de sindicalización de la fuerza laboral
- Medios de prensa muy atentos a los resultados obtenidos

Equipo de Trabajo

- Integrar personal de diferentes organizaciones y culturas
- Personal sin capacitación previa en la utilización de este tipo de equipamiento
- Operación bajo un esquema 7x24x365

Desarrollar una solución referente en la región

Gestión del Proceso

- Desarrollar un proceso que permita integrar el trabajo de diferentes empresas en pos de un resultado único
- Baja curva de experiencia en la tecnología implementada

Project Management

- Fuertes Restricciones de Cronograma
- Fuertes Restricciones de Alcance
- Tolerancias de error casi nulas
- Poca flexibilidad presupuestaria


Procesos PMBOK

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

"Definir como estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y del equipo."

- En general se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto
- Los recursos pueden ser internos de la organización o externos



ENTRADAS

- Acta de constitución del proyecto
- Plan para la dirección del proyecto (plan gestión calidad, línea base alcance)
- Documentos del proyecto (cronograma, documentación requisitos, registro riesgos, registro interesados)
- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

- Juicio de Expertos
- Representación de datos (diagramas jerárquicos, matriz RAM, formato tipo texto)
- Teoría organizacional
- Reuniones

SALIDAS

- Plan de gestión de los recursos
- Acta de constitución del equipo
- Actualizaciones a documentos del proyecto (registro de supuestos y riesgos)

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Entradas

1. Acta de Constitución del proyecto
2. Plan para la dirección del proyecto
3. Documentos del proyecto
4. Factores ambientales de la empresa
5. Activos de los procesos de la organización

Documentación de Requisitos: Los requisitos dictarán el tipo y la cantidad de recursos necesarios para el proyecto y pueden influir en la forma en que se gestionen.
Registro de interesados. Ayuda a identificar a los interesados que puedan influir en el uso de un tipo de recurso en lugar de otro.



- Requerimientos vs requisitos

- ✓ La cultura y estructura de la organización.
- ✓ Los recursos humanos existentes.
- ✓ Las políticas de administración del personal.
- ✓ Las condiciones del mercado



- Mercado, variación de precios de los recursos
- Calendario de recursos (RRHH)

- ✓ Las plantillas para organigramas y descripciones de puestos.
- ✓ La información histórica sobre estructuras de la organización que han funcionado en proyectos anteriores.



- Gestión Competencias
- Reglamentos de trabajo y comportamiento
- Manejo de inventarios (Asset Management)



REQUERIMIENTO	REQUISITOS	
Vehículo para desplazarme de un lugar a otro	FUNCIONAL	• velocidad (km/h) • consumo (litros/km) • capacidad (pasajeros)
	NO FUNCIONAL	• pintado de azul • llantas cromadas

a partir de comprender los requisitos puedo definir correctamente qué RECURSOS voy a precisar

Gestión de los RECURSOS


1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Herramientas y Técnicas

1. **Juicio de expertos**
2. **Representación de datos**
3. **Teoría organizacional**
4. **Reuniones**


Juicios de Expertos

- Negociación de recursos
- Gestión del talento
- Determinación nivel de esfuerzo
- Riesgos asociados a los planes de recursos.
- ▪ Regulación sindical y gubernamental…




Diagramas Jerárquicos

La Estructura de Desglose de la Organización (OBS) está ordenada según los departamentos, unidades o equipos existentes en una organización.



Diagramas Matriciales

Una Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) es una tabla que muestra los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo. Un ejemplo de RAM es una Matriz RACI.



Formatos Tipo Texto

Se denominan descripciones de puestos de trabajo y formularios de rol-responsabilidad-autoridad.


P, P… …radas del Project Management Institute, Inc.

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Herramientas y Técnicas

1. Juicio de expertos
2. Representación de datos
3. Teoría organizacional
4. Reuniones

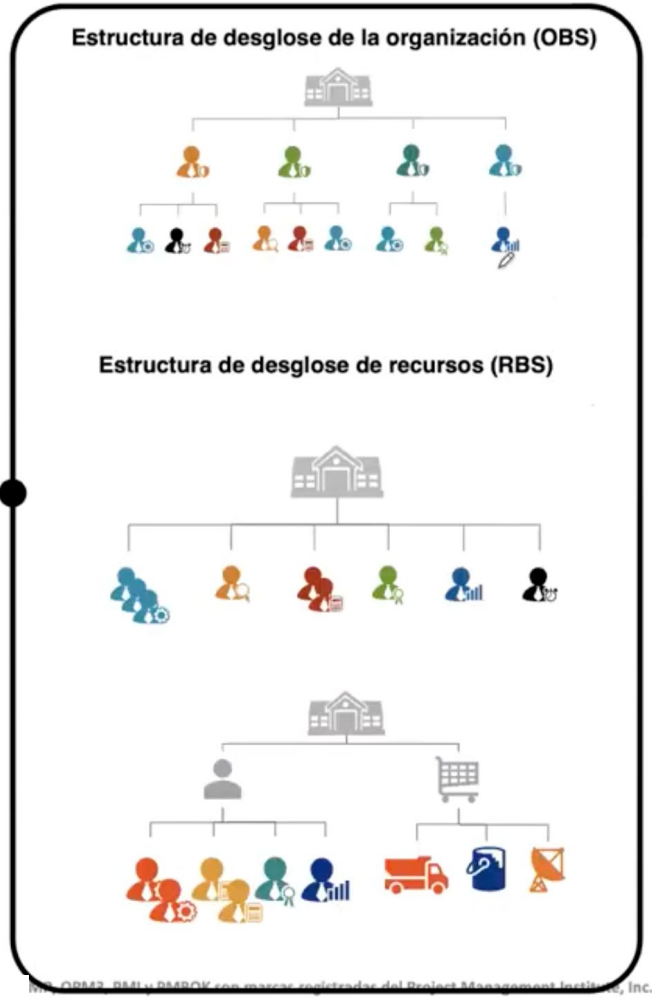


- OBS vs RBS

- RBS (Resource Breakdown Structure) vs RBS (Risk Breakdown Structure)

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Ejemplo RAM

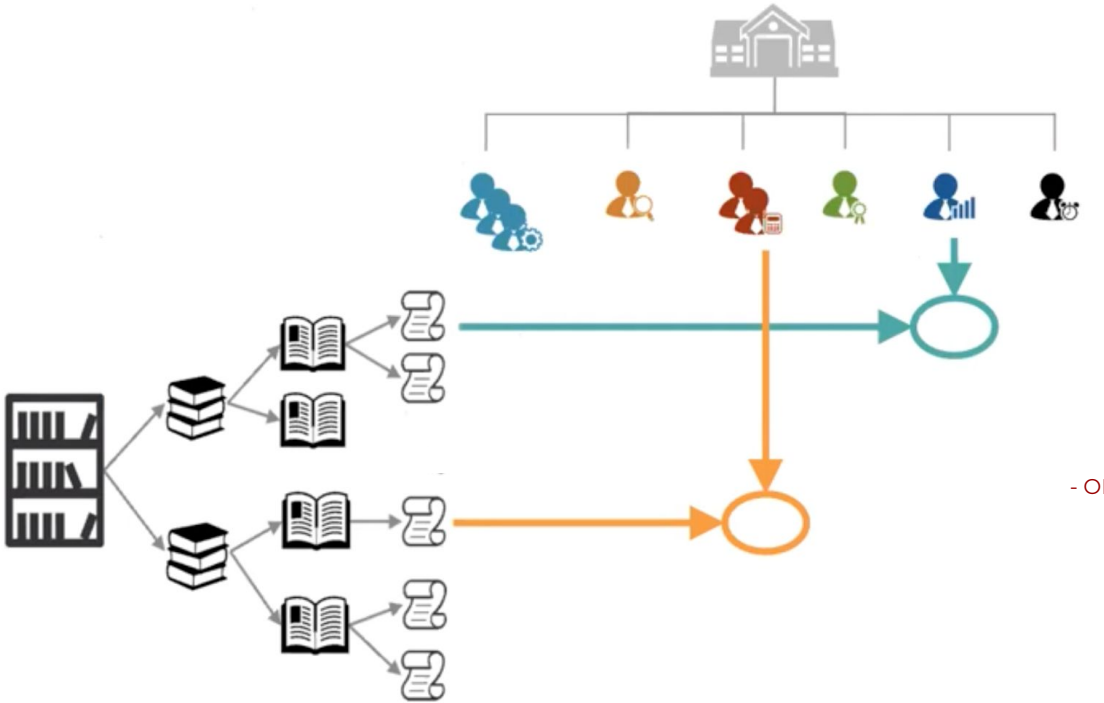

- OBS/RBS con EDT

RAM: Referencias cruzadas entre los miembros del equipo y las actividades del proyecto que deben realizar.

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Diagrama RACI	Persona				
Actividad	Ann	Ben	Carlos	Dina	Ed
Crear acta de constitución	A	R	I	I	I
Recopilar requisitos	I	A	R	C	C
Presentar solicitud de cambio	I	A	R	R	C
Desarrollar plan de pruebas	A	C	I	I	R

R = Responsible (persona responsable de ejecutar la tarea)

A = Accountable (persona con responsabilidad última sobre la tarea)

C = Consult (persona a la que se consulta sobre la tarea)

I = Inform (persona a la que se debe informar sobre la tarea)



R: Responsible **A: Accountable** **C: Consult** **I: Inform**

Gestión de los RECURSOS


1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Herramientas y Técnicas

1. Juicio de expertos
2. Representación de datos
3. Teoría organizacional
4. Reuniones

Suministra información relativa a la manera en que se comportan las personas, los equipos y las unidades de la organización





- Comportamiento de las personas
- Factores motivacionales
- Estilos de liderazgo



Almuerzos de negocios
Conversaciones informales
Reuniones y Eventos
Conferencias especializadas y Simposios


- Reuniones efectivas
- Facilitación

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Salidas

1. Plan de gestión de los recursos
2. Acta de Constitución del Equipo
3. Actualizaciones a los documentos del proyecto



Guía sobre el modo en que se deberían categorizar, asignar, gestionar y liberar los recursos del proyecto.

Identificación y Adquisición de Recursos

- Métodos de Identificación y Cuantificación.
- Origen: Interno o Externo.
- Costos asociados a la experiencia de cada perfil.
- Modelo de contratación.
- Número de emplazamientos.

Roles y Responsabilidades

Rol: La función asignada a un recurso.
Responsabilidad: Trabajo a realizar por un recurso.
Autoridad: Derecho de asignar los recursos del proyecto, tomar decisiones.
Competencia: La Habilidad y la capacidad requeridas para completar las actividades asignadas.

Organigrama del Proyecto



Gestión de los recursos del equipo de proyecto

Capacitación y desarrollo

Desarrollo del equipo



Control de recursos: Métodos para garantizar que los recursos físicos adecuados estén disponibles según sea necesario (incluye gestión de inventario, equipos y suministros, etc.)

Plan de reconocimiento



Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Salidas


1. Plan de gestión de los recursos
2. Acta de Constitución del Equipo
3. Actualizaciones a los documentos del proyecto



Documento que establece los valores, acuerdos y pautas operativas del equipo



- ✓ Valores de equipo
- ✓ Pautas de comunicación
- ✓ Criterios y procesos para la toma de decisiones
- ✓ Proceso para la resolución de conflictos
- ✓ Pautas para reuniones
- ✓ Acuerdos del equipo
- ✓ Asegura un comportamiento profesional y ético.




Establece expectativas claras acerca del comportamiento aceptable por parte de los miembros del equipo del proyecto. El compromiso con pautas claras reduce los malentendidos y aumenta la productividad.

- Quién lo hace
- Team Canvas

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

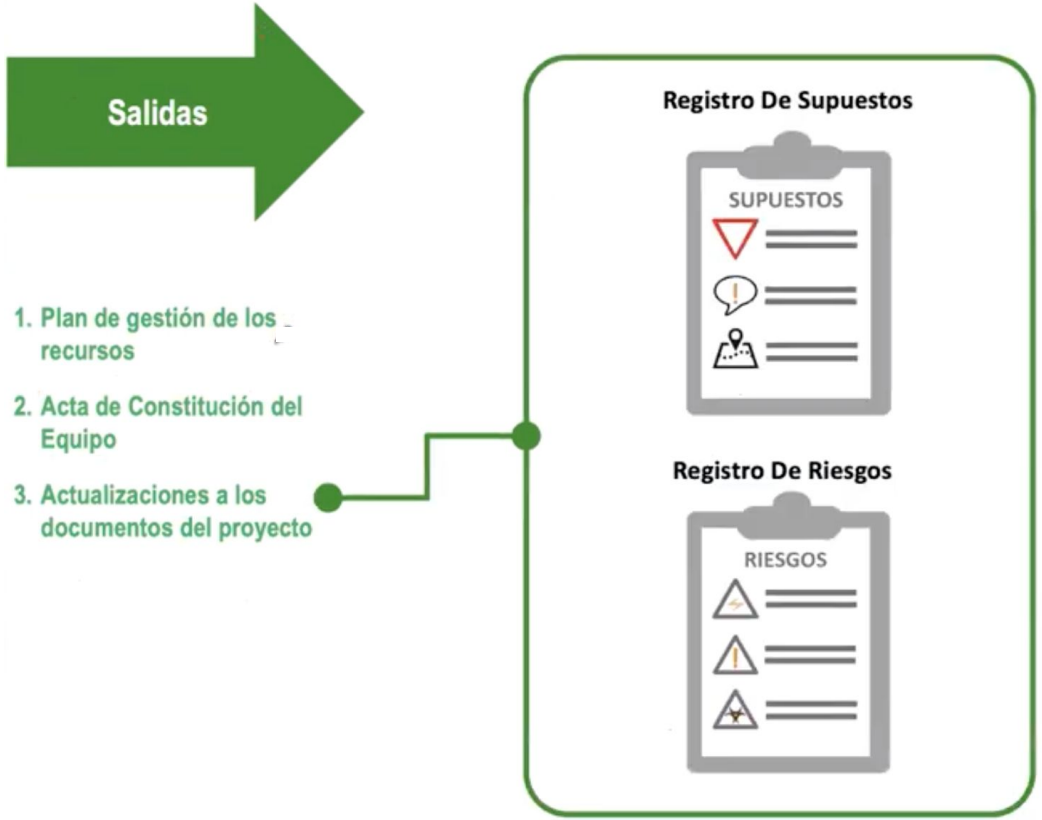

- Cada recurso puede impactar en supuestos y riesgos


Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

"Estimar los recursos del equipo y el tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto."

- Se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario

INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	MONITORO Y CONTROL	CIERRE
	9.1	9.3	9.6	
	9.2	9.4		
		9.5		

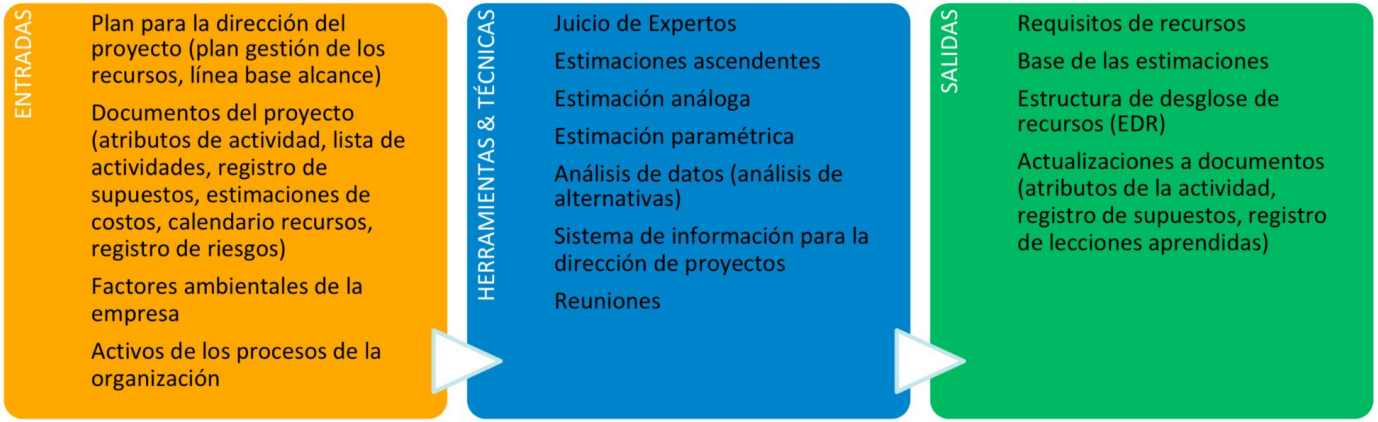

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Documentos del proyecto
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

Calendarios de Recursos



- Días hábiles, turnos, festivos...
- Horario de cada recurso.
- Disponibilidad potencial durante cada período,
- Cuándos on necesarios los recursos en el proyecto (plazos).
- Experiencia y nivel de habilidad.

Registro de Riesgos




Selección y Disponibilidad de Recursos

- Viene de la planificación (elaboración progresiva)

- Cuándo finaliza la planificación de los riesgos

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

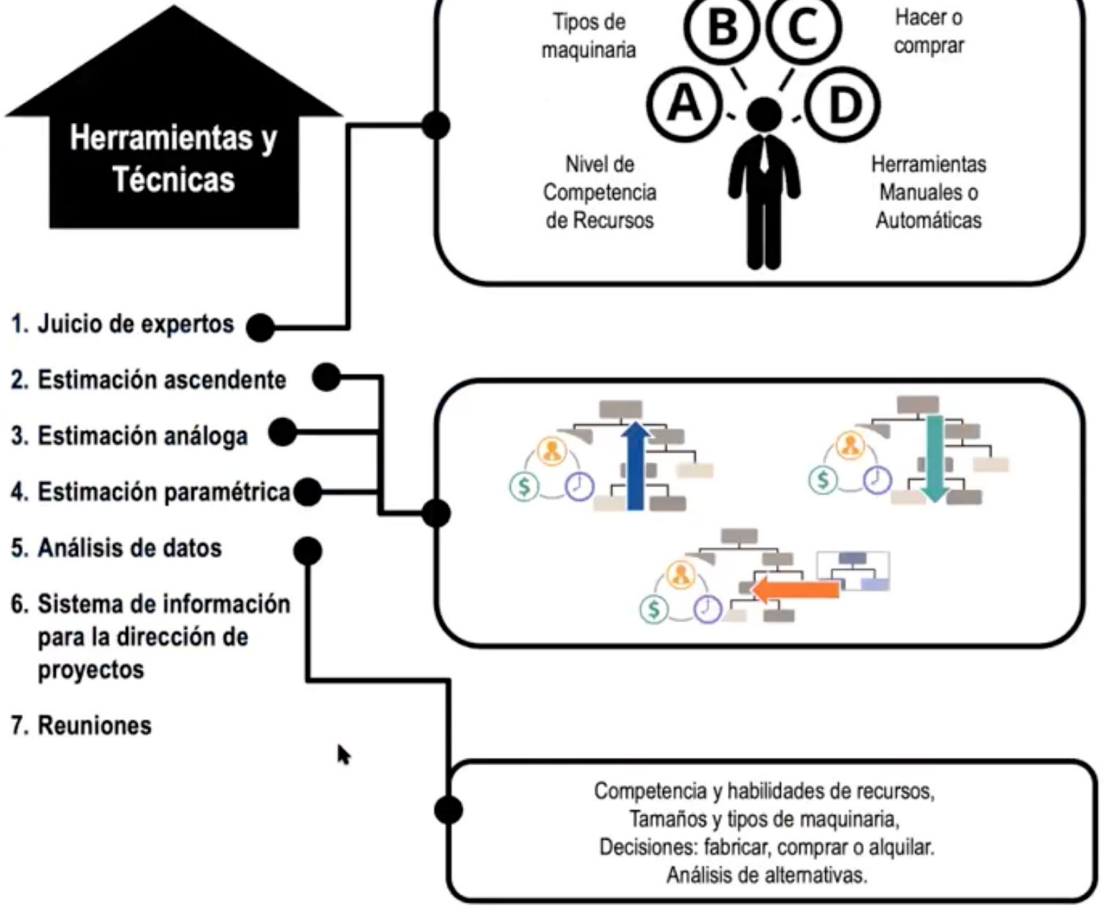

- Competencias hard vs soft (interpersonales y de gestión)


- Matrices cruzadas para decisiones de adquisición

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Salidas


1. Requisitos de recursos
2. Base de las estimaciones
3. Estructura de desglose de recursos
4. Actualizaciones a los documentos del proyecto



Identifican los tipos y cantidades de recursos necesarios para cada paquete de trabajo o actividad dentro de un paquete de trabajo y se pueden agregar para determinar los recursos estimados para cada paquete de trabajo, cada ramificación de la EDT, y el proyecto en su totalidad

- Alcance: Diccionario de la EDT (recursos)
- Cronograma: Actividades (recursos)

Método utilizado,
Información utilizada,
Supuestos,
Restricciones,
Nivel de confianza,
Riesgos...

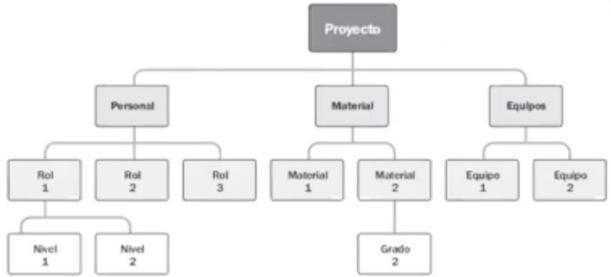

Es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo.
Categorías: Mano de obra, materiales, equipos y suministros
Tipos: Nivel de habilidad y de formación, Certificaciones requeridas.

- RBS durante todo el proyecto

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

"Obtener miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, materiales, suministros y otros recursos necesarios."

- Describe y guía la selección de recursos y los asigna a sus respectivas actividades
- Se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario



ENTRADAS

- Plan para la dirección del proyecto (plan gestión de los recursos, plan de gestión de adquisiciones, línea base costos)
- Documentos del proyecto (cronograma, calendario recursos, requisitos de recursos, registro de interesados)
- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

- Toma de decisiones (análisis de decisiones con múltiples criterios)
- Habilidades interpersonales de equipo (negociación)
- Asignación previa
- Equipos virtuales

SALIDAS

- Asignaciones de recursos físicos
- Asignaciones del equipo de proyecto
- Calendarios de recursos
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones al plan para la dirección de proyecto (plan gestión de recursos, línea base de costo)
- Actualizaciones a documentos (registro de lecciones aprendidas, cronograma, EDR, requisitos de recursos, registro riesgos, registro interesados)
- Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa
- Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Procesos de Recursos Humanos

Crear un entorno de trabajo abierto y motivador, que propicie la participación efectiva y coordinada del equipo del proyecto.



- Impacto permanente en Cronograma y Costos
- Principalmente sobre RRHH

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos



1. Plan para la dirección del proyecto
2. Documentos del proyecto
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

Plan de Gestión de los Recursos: Proporciona orientación sobre cómo adquirir recursos para el proyecto



Plan de gestión de las adquisiciones: Contiene información sobre los recursos que serán adquiridos desde fuera del proyecto.




Línea base de costos



Calendario de Recursos

	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5
	1	5	7	4	2
	4	1	6	3	9
	2	8	3	5	1

Cronograma



Registro de Interesados



Requisitos de los Recursos



- Decisiones de comprar o hacer

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Herramientas y Técnicas

1. **Toma de decisiones**
2. **Habilidades interpersonales y de equipo**
3. **Asignación previa**
4. **Equipos virtuales**

- Disponibilidad
- Costo
- Experiencia
- Capacidad
- Conocimiento
- Habilidades
- Actitud
- Factores Internacionales

	C1	C2	C3	C4
C1	1	1/5	1/9	1
C2	5	1	1	5
C3	9	1	1	5
C 4	1	1/5	1/5	1
Total	16.00	2.40	2.31	12.00

	C1	C2	C3	C4	Promedio
C1	(1/16) = 0.062	0.083	0.047	0.083	0.0688
C2	(5/16) = 0.313	0.417	0.433	0.417	0.3950
C3	(9/16) = 0.563	0.417	0.433	0.417	0.4575
C 4	(1/16) = 0.062	0.083	0.087	0.083	0.0787
Total	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

NEGOCIACIÓN: Muchos proyectos requieren la negociación de los recursos necesarios con: Gerentes funcionales, Otros equipos de dirección de proyectos dentro de la organización ejecutante, Organizaciones y proveedores externos.



- Gestión de adquisición relacionada con adquirir recursos

- Soft skill de gestión


Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Herramientas y Técnicas

1. **Toma de decisiones**
2. **Habilidades interpersonales y de equipo**
3. **Asignación previa**
4. **Equipos virtuales**

Cuando los recursos físicos o del equipo para un proyecto están determinados de antemano: Recursos específicos en el marco de una propuesta competitiva, el proyecto depende de la pericia de determinadas personas, han sido asignados en el procesos Desarrollar el Acta de Constitución; Plan de Gestión de Recursos; Fase de propuesta.



Los equipos virtuales pueden definirse como grupos de personas con un objetivo común, que cumplen con sus roles pasando poco o nada de tiempo en reuniones cara a cara. Hace posible:

- Formar equipos de que viven en áreas geográficas dispersas
- Formar equipos de personas que trabajan en diferentes turnos u horarios.
- Incluir personas con discapacidades de movilidad.
- Avanzar en proyectos que se habrían ignorado debido a los gastos de viajes.




- Recursos pre-asignados

Configuraciones de equipos virtuales y multiculturales

Tres variables que determinan el tipo/complejidad de un equipo virtual y multicultural:

- TIEMPO
- ESPACIO
- CULTURA

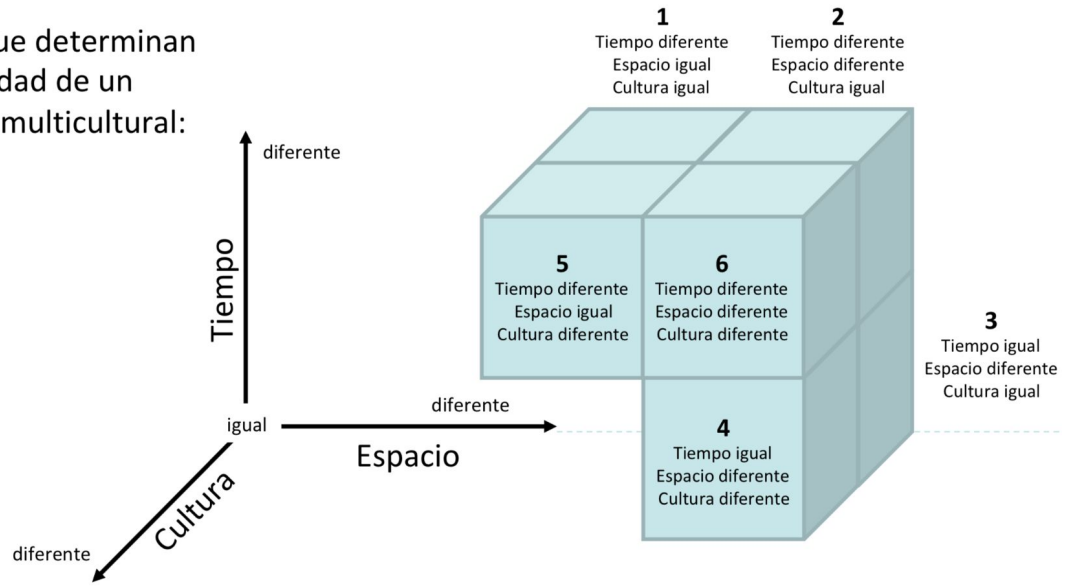

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Salidas

1. Asignaciones de recursos físicos
2. Asignaciones del equipo del proyecto
3. Calendarios de recursos
4. Solicitudes de cambio
5. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
6. Actualizaciones a los documentos del proyecto
7. Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa
8. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización



Registra los materiales, equipos, suministros, ubicaciones y otros recursos físicos que se utilizarán durante el proyecto.

- Ubicación, inventario, etc



Registra los miembros del equipo y sus roles y responsabilidades para el proyecto. Recursos nominales: Personas concretas.

- Recurso nominal (RACI)

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos



- Estimaciones vs ejecución (variabilidad precio)

- Solicitudes de cambio impactan en requisitos de recursos

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

"Mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente en general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto."

- Mejorar habilidades interpersonales y competencias, motivar, reducir deserción
- Se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto

INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	MONITORO Y CONTROL	CIERRE
	9.1	9.3	9.6	
	9.2	9.4		
		9.5		

ENTRADAS

- Plan para la dirección del proyecto (plan gestión de los recursos)
- Documentos del proyecto (registro lecciones aprendidas, cronograma, asignaciones del equipo, calendario de recursos, acta de constitución del equipo)
- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

- Coubicación
- Equipos virtuales
- Tecnología de la comunicación
- Habilidades interpersonales y de equipo (gestión de conflictos, influencia, motivación, negociación, trabajo en equipo)
- Reconocimiento y recompensas
- Capacitación
- Evaluaciones individuales y de equipo
- Reuniones

SALIDAS

- Evaluaciones de desempeño del equipo
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones al plan para dirección del proyecto (plan gestión de reursos)
- Actualizaciones a los documentos del proyecto (registro lecciones aprendidas, cronograma, asignaciones del equipo, calendario de recursos, acta de constitución equipo)
- Actualizaciones a factores ambientales de la emprsa
- Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

tamaño



distancia



¿cuáles son los factores que más dificultan la conformación y performance de un equipo?



especialización




diversidad

“Número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida.”



Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

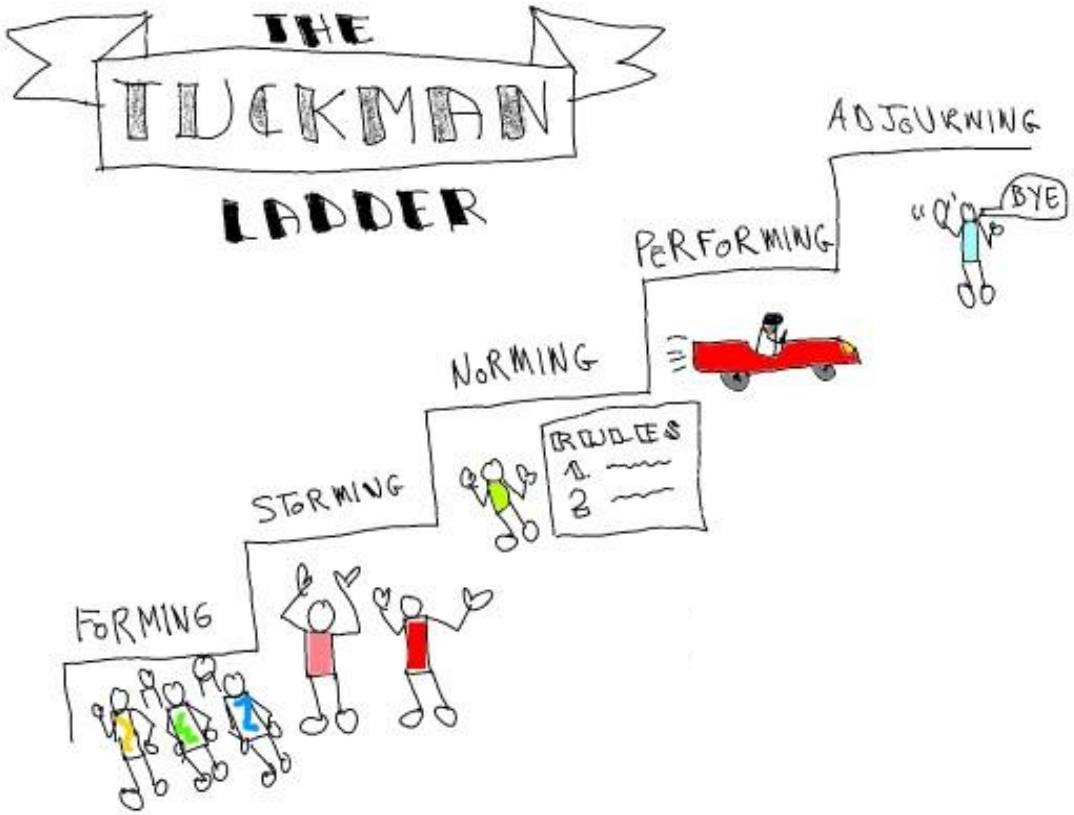

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Escalera de Tuckman

Establece cinco etapas de desarrollo por las que pueden pasar los equipos. Aunque por regla general dichos estados se suceden por orden, no es raro que un equipo se quede estancado en una etapa determinada o que retroceda a una etapa anterior. En el caso de proyectos cuyos miembros del equipo han trabajado en el pasado es posible que se saltee alguna de las etapas.

Adjourning (Disolución)
El equipo completa el trabajo y es movilizado a otro proyecto



Performing (Desempeño)
El equipo empieza a mostrar una productividad optima.

Norming (Normalización)
El equipo empieza a trabajar productivamente, sin preocupaciones de aceptación del personal.



Storming (Turbulencia)
Crítica de ideas; Resistencia; hostilidad; formación de coaliciones y polarización entre los miembros del equipo

Forming (Formación)
Primeras iinteracciones: discurso cortés; excesiva preocupación que se centra en uno mismo. Optimismo.



Gestión de los RECURSOS


1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

3. Norming - NORMALIZACIÓN

- Los roles son claros y aceptados
- Se forman consensos en el equipo
- El equipo comienza a desarrollar una identidad y a trabajar junto
- El líder debe ser un **FACILITADOR**

4. Performing - DESEMPEÑO

- El equipo trabaja como una unidad, de forma fluida y efectiva
- Preparado para tomar sus propias decisiones
- Autonomía y auto-organización. No precisa supervisión externa
- Alta productividad
- El líder **DELEGA**

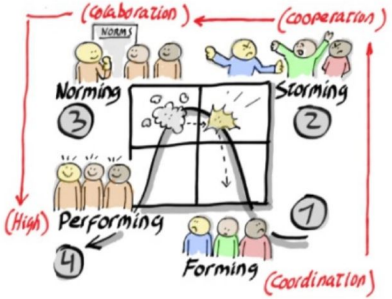

2. Storming - TURBULENCIA

- Confusión y caos entre los miembros del equipo
- Desacuerdos que se expresan abiertamente
- Aumenta la confianza pero persisten los conflictos interpersonales
- El líder debe ser un **COACH**


1. Forming - FORMACIÓN

- Formación del equipo
- Comportamiento individualista
- Ausencia de conflictos y debates internos
- Poca claridad en las funciones y responsabilidades
- El líder debe **DIRIGIR**

equipos de alto desempeño

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

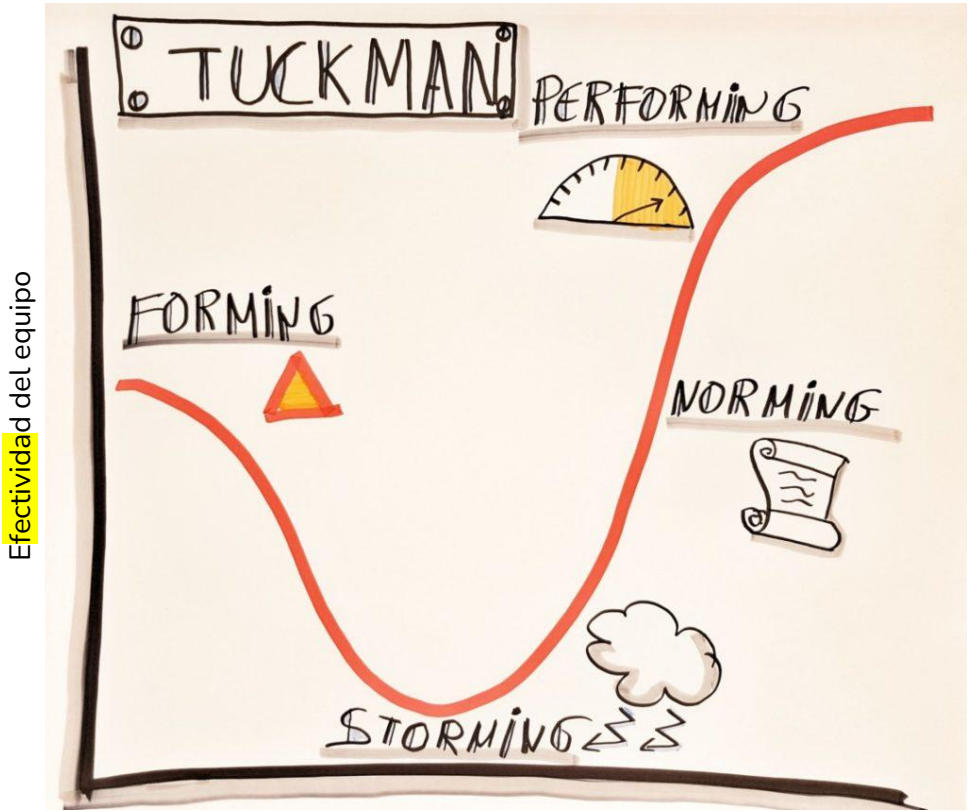



Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

equipos de alto desempeño

1. Objetivo común y tareas aceptadas
2. Número de participantes
3. Organización
4. Unicidad y totalidad
5. Compromiso personal
6. Límites y disciplina
7. Vínculo interpersonal
8. Convergencia de esfuerzos
9. Aprovechamiento del conflicto
10. Conciencia de situación interna

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Entradas

1. Plan para la dirección del proyecto
2. Documentos del proyecto
3. Factores ambientales de la empresa
4. Activos de los procesos de la organización

Plan de gestión de los recursos
Identifica las estrategias y los planes de formación para desarrollar el equipo del proyecto. A medida que el proyecto avanza, las recompensas, la retroalimentación, la formación adicional y las acciones disciplinarias se añaden al plan.

Asignaciones del equipo de proyecto
El desarrollo del equipo comienza con una lista de los miembros del equipo del proyecto. Los documentos de asignación de personal del proyecto identifican a las personas que integran el equipo.

Calendario de recursos
La información de disponibilidad de recursos identifica cuándo los miembros del equipo del proyecto pueden participar en las actividades de desarrollo del equipo.


Acta Constitución del equipo




Lecciones Aprendidas



Calendario de Recursos



Cronograma



- Tener en cuenta disponibilidad de recursos: ciclos de capacitación, desarrollo y retroalimentación

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Herramientas y Técnicas


1. Coubicación
2. Equipos virtuales
3. Tecnologías de la comunicación
4. Habilidades interpersonales y de equipo
5. Reconocimiento y recompensas
6. Capacitación
7. Evaluaciones individuales y de equipo
8. Reuniones

La reubicación implica colocar a muchos o a todos los miembros del equipo del proyecto más activos en el mismo lugar físico para mejorar su capacidad de actuar como equipo.



- Facilita la integración y desarrollo

Las habilidades como gestión de conflictos, la influencia, la motivación, negociación y desarrollo del espíritu de equipo



- Evaluar gap de competencias requeridas

Parte del proceso de desarrollo del equipo implica reconocer y recompensar el comportamiento deseable.




- Foco en objetivos del proyecto y las motivaciones de las personas

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos


Needs = Motivos



Resultados

Emocionalmente definida para alcanzar los resultados individualmente o en equipo


- Altos estándares y superación constante
- Buscan muy buenos resultados
- Objetivos alcanzables



Organización

Necesidad de influenciar. Gran preocupación por organizar al otro y al equipo

- Brindan asesoramiento y consejo
- Predisposición a persuadir o argumentar
- Sensitivos a la influencia interpersonal



Relaciones

Establecer y mantener relaciones emocionales positivas con otros. Aprobación emocional


- Disfrutan del trabajo y el logro de resultados en equipo
- Disfrutan las relaciones más que la tarea
- Interactúan mucho (visita, teléfono, etc)

evolución de las teorías

MECANICISTAS

¿Cómo hay que organizar?

- Dan por supuesto que la gente hará lo que se les dice




- Lo único que se debe definir es por cuánto lo harán
- Incentivos se relacionan con la producción
- Quedó claro que el dinero no mueve a las personas siempre
- Conciencia de tomar en cuenta las dimensiones psicológicas del trabajador
- Estudios (Hawthorne /Mayo GE) motivación no procedía de incentivos sino del entorno social y su interacción

PSICOSOCIOLÓGICOS

La empresa es un Organismo Social

- Las personas participan para conseguir otras necesidades además de los incentivos que le ofrece la empresa

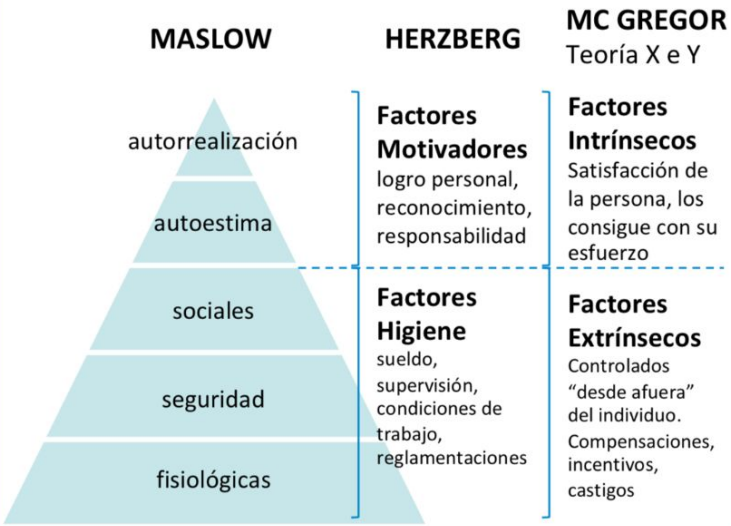

ANTROPOLÓGICOS

Existe otro tipo de motivos

- Aparece la motivación <u>trascendente</u>

Motivos Trascendentes
Resultado que la acción provoca en otras personas distintas de quien ejecuta la acción
Ej: alimentar a tu hijo, ayudar a un compañero

Motivos Intrínsecos
Resultado de la ejecución de la acción para la persona que la realiza y que depende tan sólo del hecho de realizarla
Ej: aprendizaje, gusto por perfeccionarme

Motivos Extrínsecos
Incentivo que se atribuye a la realización de la acción por parte de otra persona distinta de aquella que ejecuta la acción
Ej: retribución en un trabajo, felicitaciones que se reciben


Fuente: Juan Antonio Perez López, Las Motivaciones Humanas, NT de la División de Investigación del IESE, Marzo 1985

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Motivación

extrínseca



intrínseca



trascendente



vínculos de pertenencia y compromiso

MTp = ƒ(ME, MI, MTR)

La motivación de una persona a pertenecer a determinada organización viene dada por el peso conferido de cada motivación y de la alineación de dicha organización con esos motivos



Fuente: Nuria Chinchilla, Vínculos de pertenencia y compromiso con la organización, NT de la División de Investigación del IESE, Marzo 2000

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

"Hacer seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto."

- Influye en el comportamiento del equipo, gestiona conflictos y resuelve problemas
- Se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto

INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	MONITORO Y CONTROL	CIERRE
	9.1	9.3	9.6	
	9.2	9.4		
		9.5		

ENTRADAS

- Plan para la dirección del proyecto (plan gestión de los recursos)
- Documentos del proyecto (registro de incidentes, registro lecciones aprendidas, cronograma, asignaciones del equipo, acta de constitución del equipo)
- Informes de desempeño del trabajo
- Evaluaciones de desempeño del equipo
- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

- Habilidades interpersonales y de equipo (gestión de conflictos, toma de decisiones, inteligencia emocional, influencia, liderazgo)
- Sistema de información para la dirección de proyectos

SALIDAS

- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones al plan para la dirección de proyecto (plan de gestión de recursos, línea base cronograma, línea base costo)
- Actualizaciones a los documentos del proyecto (registro incidentes, registro lecciones aprendidas, asignaciones del equipo)
- Actualizaciones a factores ambientales de la empresa

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Herramientas y Técnicas

1. **Habilidades interpersonales y de equipo**
2. **Sistema de información para la dirección de proyectos**

Inteligencia emocional



Identificar, evaluar y manejar las emociones personales, de otros y las colectivas para:

- Reducir tensión,
- Aumentar la cooperación,
- Anticipando acciones,
- Reconociendo inquietudes...

Toma de decisiones



Capacidad de negociar e influir en la organización y en el equipo.

- Focalizar objetivos perseguidos,
- Estudiar factores ambientales,
- Analizar información disponible,
- Fomentar creatividad en grupo,
- Considerar el riesgo.

Influencia



Cuando se tiene poca o ninguna autoridad sobre un recurso:

- Capacidad de persuasión,
- Articulación clara de puntos y posiciones,
- Recopilar información relevante,
- Escucha activa y eficaz...

Gestión de Conflictos



Son inevitablesen un entorno de proyecto.

- Debe abordarse cuanto antes,
- En privado,
- Mediante enfoque directo
- De forma y constructiva.

Liderazgo



- Autogestión e influencia en otros
- Poder y/o autoridad (empoderamiento como PM)
- Persuasión a través de los beneficios a obtener (no poder ni autoridad)
- Técnicas de resolución de conflictos
- Modelo SDI

emociones
e inteligencia emocional




Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

SDI: Sistema de Valores Motivacionales

AZUL
Altruista-Protector
Motivado por la protección, el crecimiento y bienestar de los demás

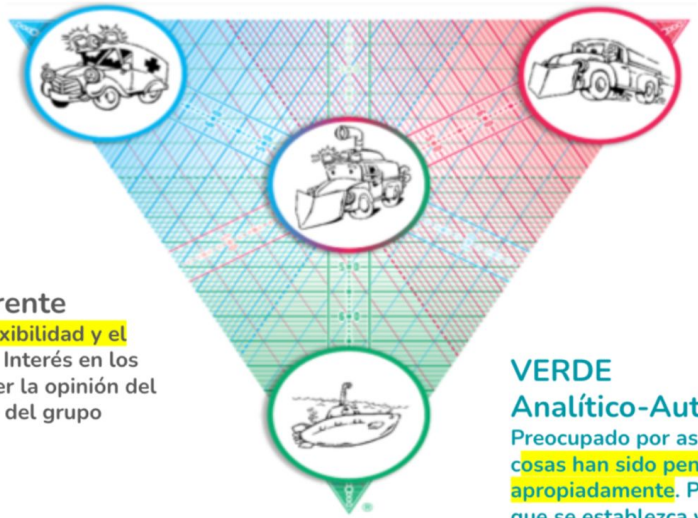

ROJO
Resuelto-Directivo
Interesado en el logro de las tareas y la organización de la gente, el tiempo y los recursos para obtener los resultados deseados

CENTRO
Flexible-Coherente
Interesado por la flexibilidad y el bienestar del grupo. Interés en los miembros, en conocer la opinión del grupo y en ser parte del grupo

VERDE
Analítico-Autónomo
Preocupado por asegurarse que las cosas han sido pensadas apropiadamente. Preocupado por que se establezca y mantenga el orden

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

Modelo SDI (Dr. ElíasPorter)

Líder Azul: Es reconocido por ser paciente, cooperativo y muy persistente en completar sus obligaciones. La gente lo encuentra una persona agradable y relajada. Su ritmo es más lento y comprueba frecuentemente con la gente para asegurarse que sus voces sean escuchadas. Se irrita con la insensibilidad de otras personas. A veces es indirecto cuando tiene que comunicar y se toma un tiempo prolongado para llegar al punto, sobre todo cuando lo que tiene que comunicar es algo negativo




Líder Rojo: es una persona segura, confiada en sí misma, que le gusta estar en control y quiere concretar los resultados rápidamente con el trabajo de todo el equipo. Se sabe que es alguien que consigue que las cosas se hagan y se logren los resultados. Este líder se puede ver impaciente y hasta intolerante cuando la gente es ineficiente, indecisa y lenta comparada con él mismo

Líder Centro: Es una persona entusiasta y extrovertida. A la gente le gusta como es. A este líder le gusta la variedad y se adapta a las distintas situaciones. Trabaja comprometido a la par de su equipo y le gusta ser reconocido por ello. Dado que es tan optimista y enérgico, a veces tiene tendencia a comprometerse de más no llegando a cumplir con todos los compromisos

Líder Verde: Este líder es todo un control de calidad. Ser preciso es su más alta prioridad. El sabe que puede asegurar la precisión siguiendo el procedimiento de forma estructurada en la que cada uno asume sus responsabilidades y conociendo a fondo lo que se hace. Se esfuerza para hacer las cosas planificadas y ordenadas. Puede parecer una persona reservada. A veces pareciera difícil terminar de conocerlo

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

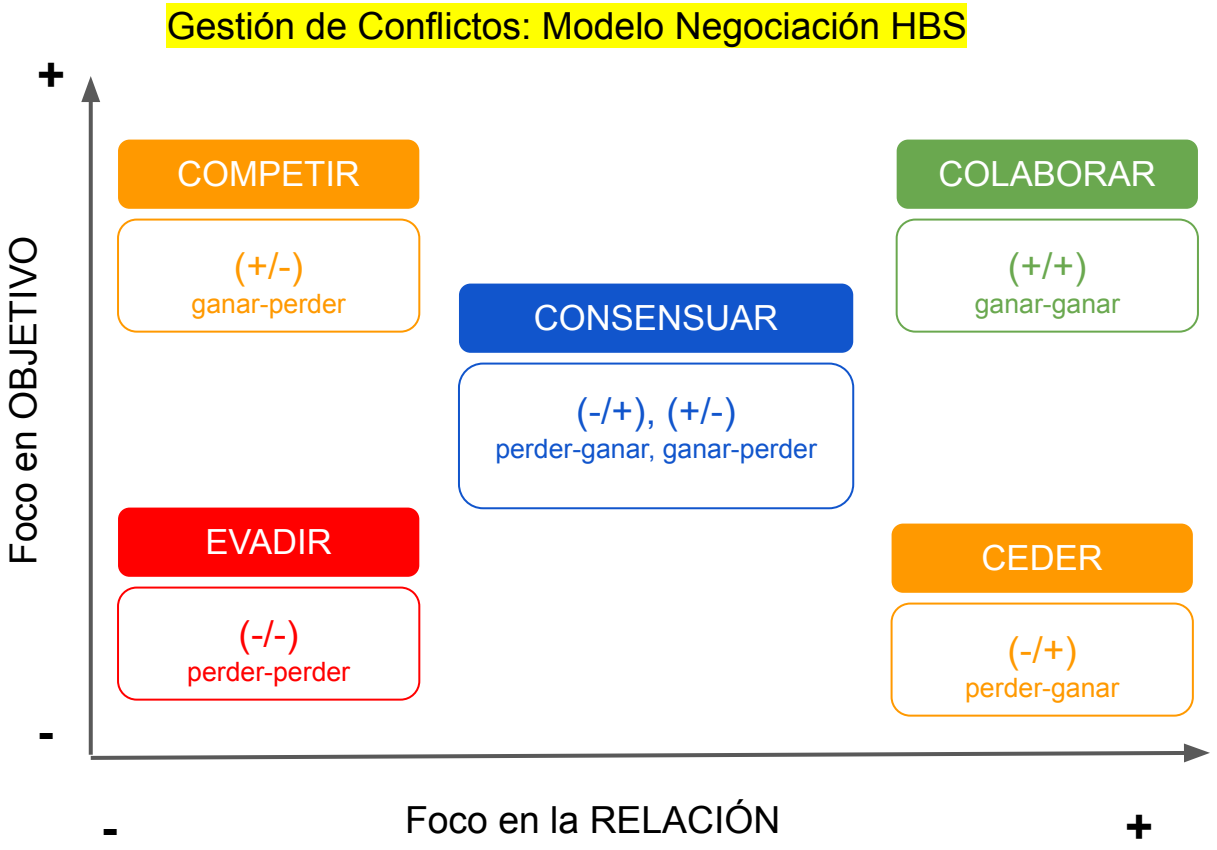

Gestión de los RECURSOS

1. Planificar la gestión de los recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar al equipo
5. Dirigir al equipo
6. Controlar los recursos

"Asegurar que los recursos físicos asignados y adjudicados al proyecto están disponibles tal como se planificó, así como monitorear la utilización de recursos planificada frente a la real y tomar acciones correctivas según sea necesario."

- Se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto

INICIO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	MONITORO Y CONTROL	CIERRE
	9.1	9.3	9.6	
	9.2	9.4		
		9.5		

ENTRADAS

- Plan para la dirección del proyecto (plan gestión de los recursos)
- Documentos del proyecto (registro de incidentes, registro lecciones aprendidas, asignaciones de recursos físicos, cronograma, EDR, requisitos de recursos, registro de riesgos)
- Datos de desempeño del trabajo
- Acuerdos
- Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS

- Análisis de datos (análisis de alternativas, análisis costo-beneficio, revisiones del desempeño, análisis de tendencia)
- Resolución de problemas
- Habilidades interpersonales y de equipo (negociación, influencia)
- Sistema de información para la dirección de proyectos

SALIDAS

- Información de desempñeo del trabajo
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones al plan para la dirección de proyecto (plan de gestión de recursos, línea base cronograma, línea base costo)
- Actualizaciones a los documentos del proyecto (registro supuestos, registro incidentes, registro lecciones aprendidas, asignaciones de recursos físicos, EDR, registro de riesgos)

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *Guía del PMBOK®* – Sexta Edición, PMI; 2017
