La cultura importa...

GESTIÓN CULTURAL DE PROYECTOS EN LA ARGENTINA

CÓMO CONSIDERAR
LA CULTURA EN LA GESTIÓN
DE SUS PROYECTOS

GUSTAVO FLOURET

Gestión cultural de proyectos en la Argentina

Gustavo Flouret

© 2020 Gustavo Flouret

Todos los derechos reservados.

ISBN 9781393415978

Índice

- Dedicatoria
- Nota del autor
- Prólogo
- Agradecimientos
- Acerca del autor
- Introducción
  - La cultura nacional
  - La gestión de proyectos
- La cultura nacional
  - ¿Qué es la cultura?
  - La cultura y la personalidad
  - La cultura y las organizaciones
  - Modelos de cultura nacional
  - El modelo de las seis dimensiones de Geert Hofstede
- La gestión de proyectos
  - Estrategia y proyectos
  - ¿Qué es un proyecto?
  - Breve historia de la gestión de proyectos
  - ¿Qué es gestionar un proyecto?
  - ¿Quiénes intervienen en la gestión de proyectos?
  - El patrocinador y el director del proyecto
  - Aspectos para considerar en la gestión de proyectos

Hablando de riesgos
¿Cómo se desarrolla un proyecto?
Sugerencias culturales para la dirección de proyectos en Argentina
El poder
Lo individual y lo colectivo
¿Masculinidad o femineidad?
La incertidumbre
La planificación y los resultados
Disfrutar de la vida.
Conclusiones
Bibliografía

Dedicatoria

A mi esposa, Silvia, por su apoyo, paciencia y amor y por ser mi compañera en la vida. Gracias, mi amor.

A papá, que me guía desde el cielo.

A mi familia, por las oraciones.

Por último, pero no menos importante, a Dios, fuente de toda razón y justicia, por los talentos otorgados. Espero que al final del camino los haya devuelto con creces.

Nota del autor

Estimado lector, el libro que usted está leyendo es el fruto de un esfuerzo de investigación de tres años y de la experiencia recogida en más de veinticinco años de profesión. La tesis doctoral que le da origen, *El impacto de la Cultura Nacional en la Gestión de Proyectos en la República Argentina* ya ha sido aceptada y defendida, lo que me ha permitido obtener el título académico de doctor en Administración de Empresas. El libro que usted tiene en sus manos no es una transcripción de ese documento, sino la adaptación de este a un lenguaje más coloquial, con anécdotas, experiencias y pensamientos personales que no tienen lugar en una tesis. Como dice el título, el contenido está enfocado en la gestión cultural de proyectos en la República Argentina.

¿A quién está dirigido este texto? A primera vista, parecería evidente que los extranjeros que vienen a la Argentina para desarrollar proyectos son los lectores ideales de este libro. Sin embargo, tengo la convicción de que todos nosotros, los argentinos, nos podemos beneficiar de las sugerencias culturales aquí presentadas. No lo descarte creyendo que, al ser argentino, conoce todo lo que aquí está escrito. Se puede llevar una sorpresa.

Por favor, tenga en cuenta la elección de palabras. Lo que propongo son sugerencias culturales. La Real Academia Española define el término *sugerencia* como 'insinuación, inspiración, idea que se sugiere', y el verbo *sugerir* como 'proponer o aconsejar algo'. Sin embargo, no voy a llegar tan lejos como para aconsejar. Simplemente, proponer. Dependerá de usted tomar en cuenta estas propuestas y aplicarlas, con criterio, a las situaciones que se planteen en la práctica profesional.

En la sección **Introducción**, hago comentarios generales acerca de cultura y gestión de proyectos, incorporando experiencias personales de relevancia para la cuestión.

En la sección **La cultura nacional**, describo generalidades acerca de la cultura y le presento a usted, estimado lector, el modelo de cultura nacional utilizado en la investigación.

En la sección **La gestión de proyectos**, realizo comentarios acerca de la historia del tema, detallo quiénes pueden ser los participantes, hago referencia a dos de los interesados más importantes, desarrollo la cuestión de los riesgos y describo someramente las etapas por las que pasa un proyecto desde el principio hasta el final.

En la sección **Sugerencias culturales para la dirección de proyectos en Argentina**, introduzco las sugerencias culturales separadas por dimensión, de acuerdo con el modelo elegido e indico cuáles son los aspectos que les dan origen.

Por último, en la sección **Conclusiones**, hago una recapitulación de todos los aspectos mencionados.

Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que el resto del libro le guste, le sirva y pueda aplicarlo. Si se cumplen estos tres objetivos, el tiempo y esfuerzo que le he dedicado han dado sus frutos.

Buena lectura.

Prólogo

A lo largo de los últimos años, tuve la inmensa suerte de tomar contacto, comprender, analizar y compartir innumerables conversaciones con Gustavo sobre los temas que encontramos en la presente obra.

Reconozco que los primeros pasos fueron realmente arduos para mí, dado que no provengo del área específica. Sin embargo, esos primeros pasos guiados de la mano de mi querido amigo, que es un apasionado por su trabajo y por contribuir de manera innovadora a este campo, me sirvieron no solamente para comprender sino para dejar florecer un interés profundo por su disciplina, que no había conocido con anterioridad, quizás por no toparme con la combinación adecuada de apasionamiento, capacidad profesional y dedicación a la docencia que Gustavo pudo desplegar en nuestros encuentros.

A partir de esa primera etapa, nuestros intercambios fueron cada vez más agudos en la dirección de la búsqueda de un aporte sustantivo que pudiera brindar a sus colegas elementos concretos para la mejora de su práctica. Tales innovaciones, que pudieron surgir gracias a su experiencia profesional, que por cierto ha sido extensa, no podían contar solo con el apoyo individual de su proponente. Por el contrario, los estándares de la investigación nos invitan a sustentar

las diferentes tesis sobre bases sólidas de apoyo empírico y articulación con el conocimiento experto existente.

Mientras que pueden ser muchas las ideas nuevas para irrumpir de manera pretendidamente iluminadora en la comunidad profesional con promesas de nuevos paradigmas, son menos aquellas que contribuyen de manera consistente con la evidencia y que, a su vez, rescatan la tradición de la profesión, que es un motor siempre presente en la formación continua de cada profesional en ejercicio a través del intercambio con sus pares y su desempeño en territorio.

El libro Gestión cultural de proyectos en la Argentina cumple con esta doble misión de permitir el crecimiento profesional en un aspecto relevante y preservar la articulación con el marco de las prácticas reales.

Sin duda esta obra será de gran ayuda para la mejora de esas prácticas y para echar luz sobre los siguientes pasos para la investigación en el área.

Hernán Miguel
Buenos Aires, marzo de 2020

Agradecimientos

- A Mariana Giménez de Paz, por la corrección profesional del texto. Este libro es mucho mejor gracias a su trabajo.
- A Enrique Flouret, por la creación de la cubierta del libro.
- A Liliana Martínez y Hernán Miguel, por su ayuda y consejos.

Acerca del autor

Soy doctor en Administración de Empresas por la ADEN University Campus Panamá; magister en Administración de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria, España, especialista en Sistemas de Información Administrativos por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires e ingeniero agrónomo por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Obtuve mi certificación PMP® (Project Management Professional®) en el 2011.

Cuento con una experiencia de más de treinta años, en los que he desarrollado actividades de gestión operativa y de proyectos en empresas nacionales y multinacionales, intervenido en la definición de actividades estratégicas del área de TI a nivel regional y mundial y liderado numerosos proyectos tanto de infraestructura como de implementación de sistemas. En varios casos, he participado en grupos virtuales, formados por integrantes locales y del exterior, y los he conducido. Dentro de mi experiencia se encuentra la creación, formación y liderazgo de un grupo de consultores locales para la ejecución de trabajos internacionales en el marco de las políticas de *off-shore consultancy* de Genencor International.

Además, cuento con una amplia experiencia en la docencia y en la capacitación técnica y de procesos. He sido docente de Informática Agropecuaria en la Facultad de Agronomía de la UBA, y de Computación I y Lenguajes de Programación I en la Facultad de Ciencias de la Administración de la UADE. Me he desempeñado como instructor técnico para los cursos *Gold* y *Platinum Partner* de SMC Networks en *networking* y he dictado cursos de extensión tecnológica para distintas empresas del sector. En el campo de la gestión de proyectos, he dictado cursos para distintos REP (*Registered Education Providers*) y en empresas privadas tanto en el ámbito local como en el internacional. Soy profesor de ADEN en Gestión de Proyectos desde el año 2011 y de Planificación y Control II en UCEMA desde 2019.

Como consultor, he trabajado con clientes nacionales y multinacionales, entre los que se encuentran Massalin Particulares/Philip Morris International, La Anónima, Inergy Automotive Systems Argentina, Laboratorios Richmond, Danisco, SMC Networks, Edge-Core Networks, Afina Latinoamerica y Provetel S.A.

Soy voluntario de la Fundación Educativa del PMI, del capítulo de Buenos Aires del PMI (PMIBA) y he sido voluntario internacional para el PMI trabajando en el REP Advisory Group.

Si desea contactarse conmigo, le solicito que utilice la dirección de correo electrónico cn@flouret.com.ar.

Introducción

Y es que en el mundo traidor
nada hay verdad ni mentira;
todo es según el color
del cristal con que se mira.

Ramón de Campoamor (1817-1901)

Hace ya muchos años, como parte de la empresa donde trabajaba en ese momento, fui invitado a una reunión en Finlandia para conversar sobre las novedades de tecnología de la información. Entre los asistentes, se encontraban personas de Argentina (yo), Estados Unidos, Bélgica, Holanda y Finlandia.

El viaje había sido toda una experiencia hasta el momento. Era mi primer viaje al exterior en la compañía y había preparado los temas que pensaba tratar bien en profundidad, lo cual es fundamental para causar una buena impresión y para ser bien considerado por los jefes.

Al llegar a Finlandia, lo primero que me impactó fue el orden y la limpieza. Y luego, al recorrer los 125 km que separan a Helsinki de Hanko[1], ciudad donde iba a tener lugar el encuentro, me sorprendieron todavía más los interminables bosques que vi. A

ambos lados de la ruta se podía apreciar kilómetros y kilómetros de pinos, abedules y abetos. Una pared verde, marrón y gris, sin solución de continuidad que provocaba una gran paz y ganas de explorar.

Cuando llegué a Hanko, la ciudad más austral del país, me encontré con una hermosa localidad, con casas bajas, llena de espacios verdes y árboles. Las hojas secas en los jardines y en las veredas le daban un toque casi mágico y provocaban ganas de correr entre ellas, levantándolas con los pies, como cuando era chico y vivía en Río Tercero, Córdoba.

Las actividades iban a comenzar al día siguiente, así que pasé el resto de la tarde acomodando mis cosas en el hotel y paseando por la costa, bañada por las aguas del golfo de Finlandia.

Al día siguiente, luego de un potente desayuno, me dirigí a la sala donde nos íbamos a encontrar. Al llegar, me abrumó una nube de distintos idiomas: finlandés, inglés con distintos acentos, francés y holandés. Me presenté, le puse cara a los nombres que ya conocía y comencé a interactuar con ellos.

La reunión comenzó a la hora prevista, como se acostumbra en Estados Unidos y en Finlandia, y cada uno de los asistentes empezó a desarrollar el tema que había preparado para la ocasión.

En un momento dado, conversando acerca de la conveniencia o no de la implementación de sistemas operativos de código abierto, realicé un comentario acerca de las ventajas de dicha implementación. Al terminar de expresar mi opinión, Aabo[2], un

finlandés del equipo de infraestructura, me contestó “Esa es una idea estúpida”.

Por supuesto que aquella era una respuesta que de ninguna manera esperaba. En nuestra cultura, en un ambiente de negocios, no es para nada común realizar este tipo de comentarios. Se considera, como mínimo, de mala educación y en ciertas situaciones, una invitación a una confrontación que puede escalar muy fácilmente. No obstante, teniendo en cuenta el ambiente internacional y mi desconocimiento de las costumbres finlandesas y frenando el fastidio que me provocó la respuesta a mi comentario, le pedí que me explicara cuál era el problema que presentaba mi propuesta. Aabo elaboró una serie de argumentos que apoyaban su opinión y dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que yo había comentado.

Al terminar la reunión, mi jefe, nacido y criado en Estados Unidos, pero con gran experiencia internacional, ante mi evidente molestia, se me acercó y me dijo estas palabras:

”Gustavo, Aabo es finlandés y para él es normal decir que una idea es estúpida. Simplemente son personas directas y no da las vueltas que nosotros damos para dar una opinión negativa.”

Le di las gracias a mi jefe por la aclaración y me dediqué a pensar en todo lo que, tanto Aabo como yo, habíamos dicho acerca del tema en cuestión. Con el correr de la reunión, todo se fue acomodando y a la noche ya éramos grandes amigos que compartían una bebida (con alcohol la suya) y algo de comer.

Ese fue mi primer choque cultural y fue altamente enriquecedor, porque me introdujo al mundo de la gestión cultural. A partir de ese momento entendí que iba a tener que estudiar y comprender la forma de relacionarme con personas de otras culturas si quería tener éxito en una multinacional.

Con Aabo seguimos trabajando a lo largo de los años en distintos proyectos y todavía estamos en contacto a través de las redes sociales. Y si quieren saber qué ocurrió con el tema de los sistemas operativos de código abierto, después de varios años de darle vuelta al asunto, se realizaron instalaciones de prueba con bastante éxito, que no se continuaron por la venta de la empresa donde yo trabajaba.

La cultura nacional

A lo largo de mi carrera he recibido la gracia de Dios de poder viajar por muchos lugares en el mundo y de trabajar y enseñar en varios de ellos. Dejando de lado la anécdota de la introducción, siempre me han interesado los comportamientos que percibía en las personas con las que interactuaba, que, como muchas otras experiencias, quedaron guardadas en las famosas cajas de Mark Gungor[3]. Así, los cursos dictados y los proyectos desarrollados en distintos países fueron ampliando esas experiencias, incorporando vivencias, opiniones y comentarios.

La palabra clave del párrafo anterior es “interactuaba”. El impacto cultural se aprecia mucho mejor en las reuniones cara a cara, donde la posibilidad de entablar una conversación abre la puerta a

entender, con mayor o menor esfuerzo, el comportamiento cultural del interlocutor. En cambio, cuando se trata de enviar y recibir mensajes de correo electrónico y, más recientemente, de Whatsapp y otras tecnologías de mensajería instantánea, las sutilezas culturales desaparecen y solamente quedan las palabras, que pueden llegar a traer grandes desacuerdos si no se escriben y leen correctamente, y pensando en el interlocutor.

En los últimos años, se ha estado promoviendo el uso de la videoconferencia como un elemento que permite la reducción de costos, manteniendo las ventajas de la comunicación verbal y visual. Y esto es así. Si miramos los costos involucrados en hacer viajar a un grupo de personas de un lado a otro, la videoconferencia surge como una alternativa muy interesante, con impacto en el *bottom line* mucho menor, sobre todo si utilizamos los recursos que ya tienen incorporados las computadoras personales portátiles.

Sin embargo, de la misma manera que el correo y la mensajería electrónica, las videoconferencias limitan la inmersión cultural enormemente. La tecnología empleada tiene limitaciones. La imagen transmitida, sea de la calidad que sea, no permite captar los matices involucrados en la comunicación entre las personas. Y esto es un problema porque la videoconferencia es una práctica muy común en todos los ámbitos de la vida y en los negocios.

Imaginen la situación con Aabo si el intercambio se hubiese dado por medio de una llamada en conferencia o videoconferencia. Es bastante probable que el resultado hubiese sido completamente

diferente, debido a la muy pobre inmersión cultural que esta tecnología permite.

Hasta ahora, por lo que se puede apreciar, parecería que la cultura tiene que ver, casi exclusivamente, con la comunicación. Sin embargo, la comunicación es solamente una parte, muy importante, sí, pero solamente una parte de la cultura nacional y su impacto. Más adelante vamos a ver que la cultura es un fenómeno muy complejo y que, para estudiarla, se han desarrollado modelos que permiten tener una idea de comportamientos típicos de la sociedad en distintas situaciones.

La gestión de proyectos

Como consecuencia del trabajo realizado en la multinacional a la que me referí más arriba, desarrollé las capacidades necesarias para gestionar proyectos. Al estar en un ambiente multicultural, necesariamente tuve que prestar atención a los miembros del equipo e interesados de distintas culturas, y evaluar cómo trabajar con ellos para lograr los objetivos que me había propuesto.

Así, me tocó gestionar muchos proyectos tanto locales como internacionales, en especial de tecnología informática, cosa que sigo haciendo en estos días. Lo que me atrapa de esta profesión es la posibilidad cierta de obtener resultados en un plazo determinado, de ver cómo van ocurriendo cosas y cómo los resultados cambian la vida de las personas, casi siempre, para bien. No hay rutina, todos los días hay algo nuevo que gestionar y decidir.

En el año 2011 me certifiqué como Project Management Professional y he estado trabajando como director de proyectos, todos estos años, además de dictar cursos y clases en distintas organizaciones locales y en el extranjero.

En 2016 la oportunidad de realizar un doctorado actuó como disparador, y todos esos recuerdos, además de la lectura en profundidad de varios trabajos y tesis, hicieron que comenzase a estudiar, desde un punto de vista científico, el tema de la cultura nacional y cómo esta impacta en la gestión de proyectos.

El resultado de esos estudios está reflejado en este libro.

1. Hanko en Wikipedia↩

2. Todos los nombres utilizados en el libro son ficticios para proteger la privacidad de las personas involucradas.↩

3. Mark Gungor en YouTube↩

La cultura nacional

Hace algunos años, trabajando para una empresa taiwanesa de equipos para redes informáticas, tuve la ocasión de conocer a Clive. Clive era un norteamericano expatriado que vivía en Taiwán. Debido a mi interacción con personas de su misma nacionalidad, tenía una idea clara de cómo trabajar con él y de cómo interactuar desde el punto de vista cultural. Sabía qué iba a querer, cómo lo iba a querer y en qué momento lo iba a querer. O, al menos, así lo creía.

Su primera visita a Buenos Aires fue normal, sin mayores inconvenientes logísticos, — tan típicos de nuestra ciudad —, pero se notaba su incomodidad al comienzo de cada visita que habíamos programado para él. Se ponía nervioso antes de entrar en las reuniones, pero, una vez comenzada, se relajaba y todo salía muy bien. Tanto Alberto, gerente de ventas, como yo comentábamos este tema, sin encontrarle una explicación, aunque, por una cuestión de respeto y de no entrometernos en su vida privada, no le preguntábamos nada. La privacidad es un bien muy precioso para las personas de EEUU.

Finalmente, luego de varios días de trabajo, muchas reuniones y muchas cenas, terminó su viaje y, para despedirlo, me acerqué al hotel donde se hospedaba. Cuando Clive bajó de su habitación para

saludarme, le di la mano y, para mi sorpresa, su cara mostró una expresión de alivio increíble.

“Gracias por no darme un beso y darme la mano”, fueron sus palabras. Y ahí entendí su incomodidad. La costumbre en Argentina, totalmente normal para nosotros, de darnos un beso, tanto hombres como mujeres, era una verdadera tortura para él y lo ponía en tensión en cada reunión.

Uno podría preguntarse dos cosas: ¿por qué no expresaba su incomodidad? y ¿en qué cabeza cabe que en una reunión de negocios, todos, hombres y mujeres, tengamos que saludarnos con un beso? Ambas son buenas preguntas y, justamente, tienen que ver con la cultura y el comportamiento de cada uno de los involucrados en esta situación. En cuanto a la primera, mi interpretación es que él, al ser aquel su primer viaje y querer construir relaciones con los empleados y empresarios locales, estaba dispuesto a soportar la violación de su espacio personal, representado por el beso, aunque no podía evitar el reflejo en su comportamiento de la incomodidad que le causaba este hecho. Por otro lado, era evidente que no había realizado ninguna investigación acerca de nuestras costumbres, más allá de sus visibles ganas de comer carne argentina.

Con respecto a la otra pregunta, el problema se producía por la poca inmersión y respeto cultural que tenían las personas con las que nos entrevistábamos. Esto se reflejaba en que, en muchos casos, se excedían en el saludo, creyendo que una mayor familiaridad aumentaba las posibilidades de realizar buenos negocios.

En los viajes posteriores Clive se sintió más cómodo, en general, pero todavía agradecía que le dieran la mano y no un beso.

¿Qué es la cultura?

Difícil trabajo definirla. Kroeber y Kluckchohn (1952) realizaron un estudio donde revisaron la literatura acerca del tema y encontraron más de 166 definiciones y conceptos diferentes, lo que demuestra su complejidad. Mucha agua ha corrido bajo el puente y muchas definiciones antropológicas, sociológicas y psicológicas han aparecido. Solamente como ejemplo voy a citar las siguientes:

> La cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. (Geertz, 1973, p. 89)

> …la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias… (UNESCO, 1982)

> La suma total de todos los supuestos compartidos y dados por sentado, que un grupo ha aprendido a través de la historia. (Schein, 2010, p. 29)

> La programación colectiva de la mente que distingue los miembros de un grupo o categoría de personas de otros.(G. H. Hofstede et al., 2010, p. 6)

La cultura importa. Es parte de las interacciones personales que tenemos todos los días y a las que estamos acostumbrados. Hemos crecido, nos hemos educado y desarrollado en nuestra cultura y esta forma parte de nosotros. Las creencias, prejuicios, mitos e ideologías a los que hemos estado expuestos nos moldean. No les prestamos atención, porque están dentro de nosotros pero influyen, en forma automática, en la forma en que nos comportamos. Tenemos elementos en común que nos caracterizan como grupo.

La cultura afecta la forma en que ejercemos el poder, así como la relación entre superiores y subordinados; la autonomía con la cual nos desenvolvemos; la forma como nos relacionamos con los grupos a los que pertenecemos; el modo como encaramos lo que hacemos en nuestra vida profesional y personal; nuestra visión de la vida y la manera de disfrutarla; y nuestra perspectiva del pasado y del futuro, entre muchas otras cosas.

Cada uno de estos temas influencian nuestros comportamientos en todo lo que emprendemos y, por ende, los proyectos en los que participamos.

La cultura y la personalidad

Una de las preguntas que surgen cuando hablamos del comportamiento de una persona con la que interactuamos es el

siguiente: ¿estamos viendo comportamientos culturales o un reflejo de la personalidad?

Si somos de la misma cultura, es posible que nos enfoquemos en cómo es la personalidad del individuo con el que interactuamos. El problema se presenta cuando las culturas de las personas involucradas son distintas. ¿Una persona es callada porque su cultura lo influencia o porque tiene una personalidad introvertida? ¿Una persona controla constantemente a un grupo de subordinados porque es un fanático del control o porque en su cultura los subordinados precisan de ese comportamiento? ¿Consideramos a una persona asertiva como autoritaria o es el comportamiento natural en su cultura?

El peligro de no tomar en cuenta la cultura en nuestras interacciones es que podemos llegar a ver a los otros a través de nuestros filtros, lo que de Campoamor (1892) refleja tan poéticamente en su poema "Las dos linternas", y terminar confundiendo las actitudes culturales con rasgos personales.

Esto no quiere decir que los individuos estén fabricados en serie de acuerdo con una norma cultural a la que se van a ceñir en todo momento y lugar. Al contrario, cada uno de nosotros es una individualidad que se expresa de diferentes maneras y debe ser considerada así en cualquier interacción que tengamos. No obstante, esta individualidad tiene un soporte cultural que debe ser entendido para poder gestionar las relaciones con esa persona.

Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que la cultura afecta lo que vemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y ese

comportamiento es lo que debemos conocer para poder interactuar efectivamente.

La cultura y las organizaciones

Los argentinos tenemos algunas pautas culturales con las que, extrañamente[1], estamos de acuerdo. Una de ellas es la impuntualidad. Invitamos para las 21:00, sabiendo que nuestros invitados llegarán, seguramente, entre las 21:30 y 22:00. Y, si por casualidad llegamos a la hora convenida, provocamos un verdadero problema para los dueños de casa, que probablemente tengan que hacer malabarismos para atendernos y terminar de preparar lo necesario para la reunión.

Esto también se refleja en las reuniones de negocios, donde, incluso si uno es puntual, sobre todo en casos en los que queremos vender algún producto o servicio, la persona a la que queremos ver seguramente nos hará esperar algunos minutos.

Ahora bien, toda esta introducción tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿qué es más importante, la cultura nacional o la cultura organizacional?

Si revisamos la literatura, hay trabajos que concluyen que es más importante la primera que la segunda y otros que aseveran exactamente lo contrario.

Sin intentar dirimir este conflicto, recuerdo una situación que se produjo cuando, en 1996, una empresa norteamericana de

biotecnología compró el negocio de enzimas industriales a una empresa europea, que tenía una planta en Argentina.

La primera reunión virtual por conferencia telefónica que realizaron los gerentes norteamericanos, comenzó 15 minutos tarde, justamente por el atraso en llegar por parte de los empleados argentinos. Los norteamericanos estaban, comprensiblemente, bastante molestos por esta situación y la cosa se puso peor cuando, al llegar los argentinos, ninguno pidió disculpas por la tardanza.

Por supuesto, al terminar la reunión, el jefe del equipo que iba a tomar control de la filial argentina realizó una "bajada de línea"[2] bastante fuerte, indicando que tal comportamiento no estaba de acuerdo con la cultura de la nueva organización, que eso no era aceptable según los estándares que ellos manejaban y que la repetición de esa actitud no iba a ser tolerada. La situación ocasionó una verdadera preocupación en todos los argentinos, quienes, rápidamente, se acomodaron a los requerimientos indicados y comenzaron a llegar puntualmente a todas las reuniones.

Si bien este ejemplo parece sustentar la idea de que la cultura organizacional es más fuerte que la nacional, hay que ver la otra cara de la moneda. Los argentinos, con miedo de perder el puesto, se adaptaron rápidamente a las nuevas normas… cuando estaban presentes los norteamericanos. Sin embargo, todas las reuniones locales continuaron comenzando entre 10 y 15 minutos más tarde, por supuesto, comentando los partidos de fútbol de la semana y, en realidad, tratando los temas pertinentes recién después de otros 10 minutos de charla.

Basándonos en este ejemplo, ¿qué es más fuerte? ¿La cultura nacional o la cultura organizacional? Tal como lo manifesté anteriormente, hay estudios que sustentan una u otra posición. Sin embargo, lo que queda claro es que no se puede dejar de lado ninguna de las dos en el estudio de los impactos que la cultura tiene sobre el comportamiento de los miembros de una organización.

Modelos de cultura nacional

Ya hemos visto que la cultura nacional es un tema complejo. Hay diferentes visiones de lo que es la cultura lo cual complica el análisis. Debido a eso, diferentes investigadores han tratado, de alguna manera, de enmarcar en dimensiones los comportamientos de las personas de las diferentes culturas a nivel mundial, entendiendo por dimensión un aspecto de la cultura que puede ser medido en relación con otras culturas (G. H. Hofstede et al., 2010).

Estos esfuerzos son, frecuentemente, conflictivos entre sí, por lo que necesariamente se debe elegir alguno de ellos para realizar los análisis que el científico desee realizar.

Morden (1999), en su trabajo acerca de modelos de cultura nacional y su relevancia para las prácticas de gestión internacional, comenta que existen tres categorías de modelos:

- Modelos de una sola dimensión.
- Modelos de múltiples dimensiones.
- Modelos histórico-sociales.

De estos tres, el que más nos interesa es el de múltiples dimensiones, dado que brinda una mayor riqueza para el análisis. En su trabajo "The culture theory jungle: divergence and convergence in models of national culture", Nardon y Steers (Bhagat y Steers, 2009, p. 3) detallan los más ampliamente utilizados:

- Kluckhohn and Strodtbeck (1961).
- Hofstede (2010).
- Hall (1959).
- Trompenaars (1993).
- Schwartz (1994).
- House y sus colegas de GLOBE (2001).

Cada uno de ellos tiene fortalezas y debilidades, pero el más citado y utilizado es el de Geert Hofstede; y es este el que voy a desarrollar, someramente, en la próxima sección.

El modelo de las seis dimensiones de Geert Hofstede

Todo lo referente a este modelo, incluyendo un muy extendido análisis en aspectos que tienen que ver con la familia, el estado y la sociedad, el trabajo, las ideas, internet y otros tópicos, está desarrollado en el libro *Cultures and Organizations: Software of the mind* (G. H. Hofstede et al., 2010) y recomiendo su lectura si desean adentrarse en el estudio de la cultura nacional. A continuación, desarrollo un brevísimo resumen de este como para sentar las bases de lo que sigue.

A principios de la década de los años 70, Gert Hofstede, un psicólogo de IBM, comenzó a analizar una encuesta realizada en 72 países,

con un total de más de 116.000 cuestionarios respondidos.

El propósito de ese trabajo era explorar las diferencias en actitudes e interacción social que tenían los gerentes de diversas culturas para con su entorno con el fin de desarrollar políticas laborales para el futuro. Es decir que el objetivo no era determinar aspectos culturales, sino generar bases para un mejor ambiente laboral en la organización.

Sin embargo, y por medio del análisis estadístico, Hofstede identificó una serie de temas en común, pero con soluciones diferentes para cada país, para cada una de estas categorías:

- Inequidad social, incluyendo la relación con autoridad.
- La relación entre el individuo y el grupo.
- Conceptos de lo masculino y lo femenino: las implicaciones sociales y emocionales de haber nacido hombre o mujer.
- Maneras de enfrentar la incertidumbre y la ambigüedad, que resultaron estar relacionadas con el control de la agresión y la expresión de emociones.

Estas áreas se transformaron, en un primer momento, en cuatro dimensiones de tipo bipolar, con atributos opuestos en los extremos de una escala, sin querer con esto definir que hay valores que son positivos o negativos. Son, simplemente, comportamientos sociales que se dan en distintas culturas.

Dichas dimensiones son las siguientes:

- Power distance index (PDI) o índice de distancia al poder.
  El grado en el que los miembros menos poderosos de instituciones, organizaciones y estructuras familiares, esperan y aceptan que el poder está distribuido en forma desigual.
- Uncertainty avoidance index (UAI) o índice de evitación de la incertidumbre.
  El grado en el que los miembros de una cultura se sienten amenazados por situaciones ambiguas o desconocidas.
- Individualism vs. collectivism (IDV) o individualismo vs. colectivismo.
  El individualismo corresponde a sociedades en las cuales los lazos entre individuos son débiles y se espera que cada persona se cuide a sí misma y a su familia inmediata. El colectivismo corresponde a sociedades donde las personas, desde su nacimiento en adelante, se integran en grupos cohesivos y fuertes que los cuidan durante toda su vida, a cambio de una lealtad incuestionable.
- Masculinity vs. femininity (MAS) o masculinidad vs. femineidad.
  Una sociedad es llamada masculina cuando los roles emocionales de género son claramente distintos: se supone a los hombres asertivos, duros y enfocados en el éxito material mientras que se considera a las mujeres más modestas, tiernas y preocupadas con la calidad de vida.
  Una sociedad es femenina cuando los roles emocionales de género se superponen: se supone que tanto hombres como mujeres son modestos, tiernos y preocupados con la calidad de vida.

En 1988, un estudio liderado por Michel Bond (Geert Hofstede y Bond, 1988), con la participación de Geert Hofstede y de estudiantes de 23 países, identificó una nueva dimensión:


- Long term orientation (LTO) u orientación al largo plazo.
  La orientación al largo plazo se basa en promover las virtudes orientadas a las recompensas futuras, la perseverancia y el ahorro. El opuesto, la orientación a corto plazo, se basa en promover las virtudes relacionadas con el pasado y el presente, en particular, el respeto por la tradición, la preservación de la imagen o reputación y el cumplimiento de obligaciones sociales.

Por último, Minkov (2007), identificó una nueva dimensión, llamada Indulgence vs. Restrain o indulgencia vs. contención (IVR).

- Indulgence vs. restrain (IVR) o indulgencia vs. contención.
  La indulgencia representa la tendencia a permitir la libre gratificación de los deseos humanos básicos y naturales, relacionados con disfrutar la vida y divertirse. La contención refleja la convicción de que esas gratificaciones necesitan ser frenadas y reguladas por estrictas normas sociales.

Hofstede utilizó las seis dimensiones para explicar el comportamiento de grupos culturales en diferentes ámbitos. Cada una de ellas tiene asociada una escala con valores que van desde 0 (bajo) a 120 (alto)[3], ubicando cada país de acuerdo con un valor obtenido por el análisis estadístico de los cuestionarios respectivos. Los valores de 50-60 son considerados valores medios, mientras que por debajo de 50 son bajos y por encima de 60 son altos. A

continuación pueden observarse los valores para la República Argentina.

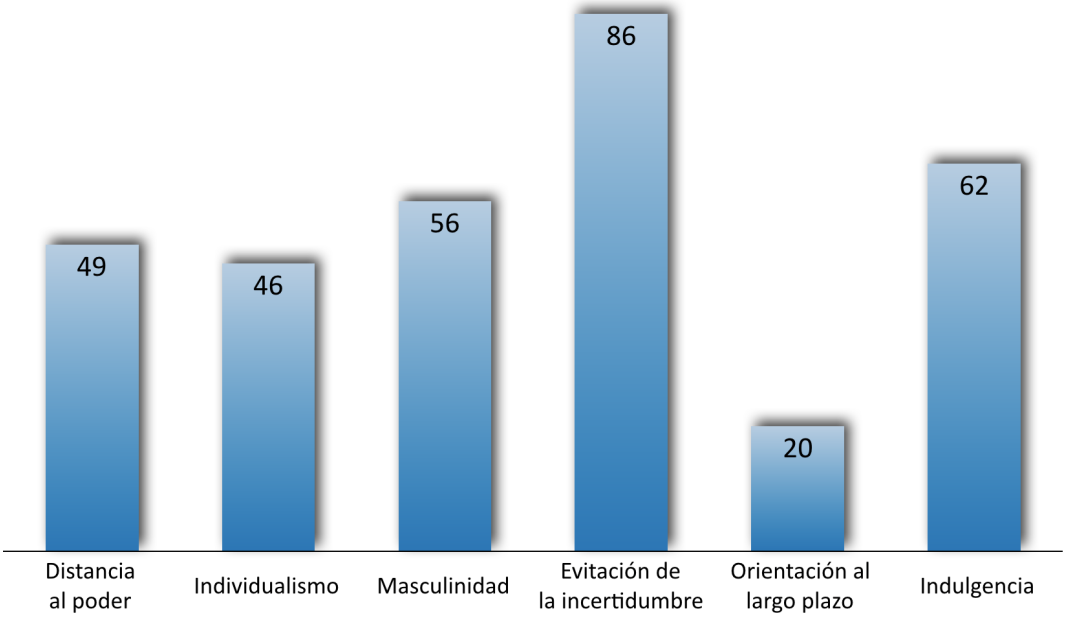

Valores de las dimensiones de Hosftede para la Argentina. Fuente: Hosftede (2018) y elaboración propia.

La Argentina tiene valores levemente bajos en PDI e IDV, medio-alto en MAS, muy alto en UAI, muy bajo en LTO y alto en IVR. De acuerdo con lo definido por Hofstede para cada dimensión, podríamos interpretar los valores de la siguiente manera:

- La cultura argentina acepta una distancia relativamente media entre quienes ejercen el poder y quienes no. Llevado esto a una estructura organizacional, la diferencia de autoridad entre jefes y subordinados no debería ser demasiada. Sin embargo, existen jerarquías definidas. (PDI).
- La cultura argentina es levemente colectivista, aunque se pueden apreciar rasgos individualistas, particularmente en

grandes conglomerados urbanos[4] (IDV).

- La cultura argentina adopta un comportamiento masculino con asertividad y orientación al éxito (MAS).
- La cultura argentina es netamente adversa a la incertidumbre, y elige crear un sistema normativo complejo para estructurar su vida y demandar claridad en toda acción a corto, mediano y largo plazo (UAI).
- La cultura argentina busca resultados a muy corto plazo, con poca propensión a pensar en el futuro. Además, tiene una tendencia a respetar las tradiciones y a recordar constantemente el pasado (LTO).
- La cultura argentina le da preponderancia a tener tiempo libre, a actuar libremente y a gastar su dinero como le parezca. (IVR).

Estas seis dimensiones son la base sobre las cuales se han construido, y se siguen construyendo, una gran cantidad de trabajos de investigación aplicados a múltiples aspectos empresariales, financieros, contables y económicos.

1. ¿Porqué extrañamente? Porque nos encanta polemizar sobre cualquier tema, sentados a una mesa de comedor, un bar o una reunión de amigos. Nos dedicamos a “arreglar el mundo” y siempre van a existir opiniones contrarias que se van a defender con fuerza y pasión, como si nos jugásemos la vida. Sin embargo,, en general, somos impuntuales.↩

2. No hay una definición en el *Diccionario de la Real Academia Española* ni en Diccionario del habla de los argentinos, de acuerdo con Luis Gregorich (La Nación, 4 de marzo de 2009). Gregorich define la expresión como “dar una instrucción u orden a otra persona o personas, antecedida por una explicación de la realidad y un relato ejemplar” La Nación recuperado el 2/12/2019.↩

3. El límite superior varía según la dimensión de la que se trate.↩

4. Esta aseveración la realiza Geert Hofstede en su sitio web, pero no se ha encontrado ningún trabajo científico previo que la sustente. De todas formas, algunas respuestas obtenidas en la investigación parecen apoyar esta idea.↩

La gestión de proyectos

El primer proyecto que recuerdo en mi vida laboral fue la implementación de un sistema de administración. Previamente, había hecho programación, desarrollando sistemas para el mercado agropecuario y análisis funcional, trabajando dentro de un banco.

La dirección de la organización multinacional donde yo trabajaba, grande en el mundo pero pequeña en la Argentina, quería imponer la idea que se debía utilizar SAP, que era el sistema corporativo que se empleaba en sucursales mucho más grandes que la nuestra.

A medida que el gerente general y el de finanzas fueron evaluando sistemas de información, junto con sus costos y el esfuerzo involucrado en la iniciativa, se fueron convenciendo de que debían bajar sus expectativas y optar por una solución más modesta, pero perfectamente adaptada a nuestras necesidades. Este proceso tomó su tiempo, dado que SAP era propuesto por la sede central con bastante fuerza, y requirió un esfuerzo importante para explicar nuestra elección.

Por fin, nos decidimos por uno en particular y comenzó la implementación. Para ir directo al grano, el resultado fue un desastre. Yo no tenía experiencia y cometí todos los errores posibles, incluido el irme de vacaciones justo en el momento en que se comenzaba a


utilizar. La organización, que tampoco tenía ninguna experiencia en esto de gestionar proyectos, tampoco quiso contratar apoyo posterior, ni un abono de soporte mensual, decisión que pagó con creces cuando las cosas no funcionaron. No hubo una planificación razonablemente detallada. No hubo — no hablemos de una gestión de riesgos — una simple lista de riesgos a considerar. Tampoco una lista de los recursos aplicados al proyecto y el detalle de cómo iban a ser utilizados. Todo se dejó en manos de la consultora que vendía el sistema, que era muy profesional en lo técnico pero no en la gestión de proyectos. Por nuestra parte, no se realizó un seguimiento detallado de lo que se estaba haciendo y las pruebas fueron más que someras. En suma, toda la situación es para un caso de estudio de lo que no se tiene que hacer en la gestión de un proyecto.

Después de evitar por un milímetro el despido — simplemente porque la persona que era mi jefe me apoyó, dado que él me había dado la autorización de irme de vacaciones — me puse a ver qué cosas había hecho mal y aprendí una serie de lecciones que ayudaron posteriormente. ¿La primera? No he vuelto a tomar vacaciones justo en la fecha de implementación de un proyecto. Respecto de las otras lecciones que aprendí, muchas de ellas tienen en cuenta elementos que tienen que ver con la cultura nacional, como, por ejemplo, la planificación o la gestión de los riesgos. Más adelante hablaré largo y tendido sobre estos temas. Y, nuevamente, si quieren saber cómo terminó la historia, sobreviví a la experiencia y el sistema se utilizó por más de tres años, para tres divisiones y dos plantas de producción. Se dejó de usar cuando nos compraron, al ser reemplazado por Oracle 11i en todos los sitios de la Argentina, proyecto que, entonces sí, dirigí con éxito. Pero eso es otra historia.

Los proyectos han sido una parte fundamental de mi vida. La búsqueda de trabajo, mis certificaciones de inglés, los viajes a distintas partes del mundo hasta la obtención de mi maestría y doctorado, todo esto lo he gestionado como un proyecto. Este libro, por ejemplo, ha sido gestionado como un proyecto, con un alcance[1] de alto nivel bien definido que incluye los aspectos más relevantes de lo que pretendo transmitir al lector.

Estrategia y proyectos

Cuando una organización, pública o privada, planifica sus acciones para obtener sus objetivos, utiliza lo que se llama el ciclo estratégico.

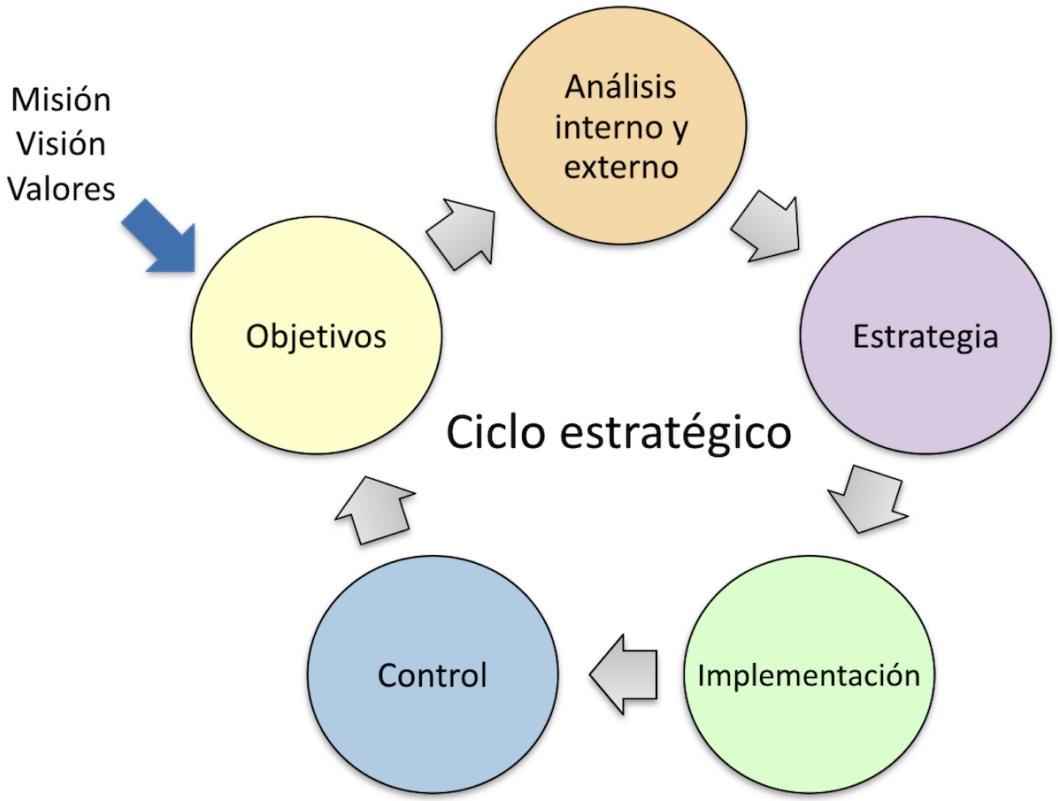

Ciclo estratégico. Fuente: Elaboración propia.

En este ciclo, hay una etapa llamada implementación, donde se ejecutan las iniciativas que sustentan las estrategias decididas por la organización. Estas se denominan proyectos y, cada vez más, le debemos prestar mucha atención a su correcta gestión si queremos que la organización sobreviva.

Sobre la planificación estratégica hay muchos libros escritos, de modo que no voy a comentar mucho más, pero recomiendo profundizar en el tema si se dedican a la gestión de proyectos, para entender su génesis.

Una de las causas de que los proyectos fracasen o se cancelen es que no estén alineados con la estrategia o que la estrategia haya cambiado. Por eso es muy importante para el director de proyecto conocerla, para saber si la iniciativa en la que está trabajando tiene futuro o no.

¿Qué es un proyecto?

Existen muchas definiciones de lo que es un proyecto, pero básicamente piensen en un trabajo que empieza y termina y que genera un resultado específico.

Al utilizar la palabra *trabajo* incluyo a los recursos, tanto humanos como no humanos, que se utilizan durante el proyecto. Tanto "comienza" como "termina" implican una fecha de inicio y una fecha de fin. Y, por último, "resultado" implica que vamos a obtener algo de ese proyecto.

Entonces, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños puede ser un proyecto.

Tiene un comienzo, el momento en que decidimos hacerla y un final, el momento en que se realiza[2].

Se requiere trabajo, tanto el del director de proyecto (DP)[3], como el de cada uno de los recursos que él haya utilizado, tanto internos como externos (por ejemplo, comida, mozos, mago y payaso, *disk jockey*, salón donde se hace la fiesta, etc.) y además se requiere dinero para pagar los servicios contratados. Y, por último, la fiesta en sí misma, que es el resultado del proyecto.

Existen innumerables ejemplos y tamaños de proyectos, desde elegir un colegio o instituto educativo donde aprender, hasta el viaje a la luna o la construcción de grandes obras de ingeniería, pero llevándolo a la vida de cada uno de nosotros, también son proyectos, por ejemplo, la compra de una casa o un auto, irse de vacaciones, elegir una carrera, casarse, buscar un nuevo trabajo, mudarse, emprender nuestra propia empresa, etc.

Los proyectos son parte de nuestra vida y, si decimos que nuestra cultura influye en cómo nos comportamos, lo que hacemos y lo que vemos, es natural pensar que influye en cómo vamos a gestionar los proyectos que realicemos.

Breve historia de la gestión de proyectos

Los proyectos han sido una parte fundamental de los grandes logros de la humanidad. En efecto, si revisamos la historia desde sus

inicios, las grandes construcciones, los eventos históricos significativos, los grandes descubrimientos, la creación de las obras más exquisitas de arte y literatura, y su reconstrucción después de los desastres no han sido, ni más ni menos que proyectos, en el más estricto sentido de la palabra.

A partir de los comienzos del siglo XX, se inician estudios que dan como resultados una serie de herramientas para aplicar en la incipiente gestión de proyectos. Por ejemplo, en 1917, Henry Gantt (1913) crea el diagrama Gantt, utilizado para la gestión de la represa Hoover, que permite, a simple vista, no solamente conocer las actividades por realizar, sino también la fecha de inicio y terminación y si existen o no atrasos en su realización, además de otros datos.


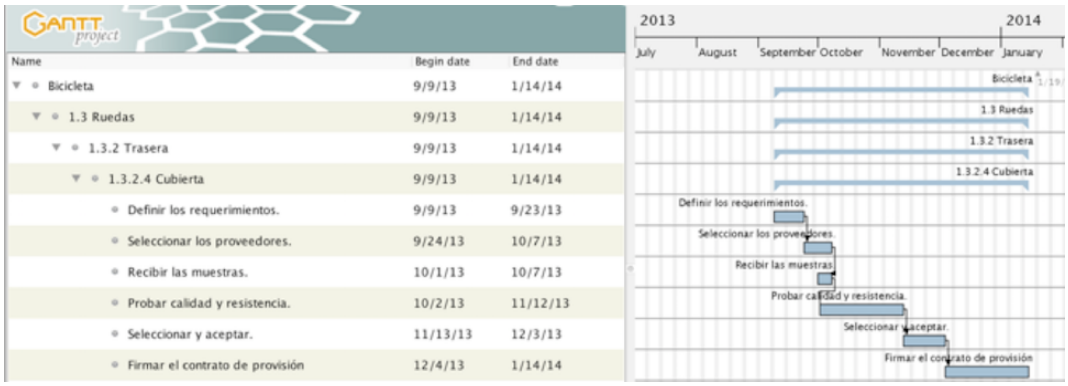



Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia.

Hacia la década del 50, se desarrollan dos modelos matemáticos, llamados Critical Path Method (CPM) (Kelley y Walker, 1959) y Program Evaluation and Review Technique (PERT) (United States. Bureau of Naval Weapons. Special Projects Office., 1958) que dan origen a la era moderna de la gestión de proyectos. Estas herramientas comienzan a utilizarse en todo tipo de proyectos que se gestionan desde un punto de vista técnico.

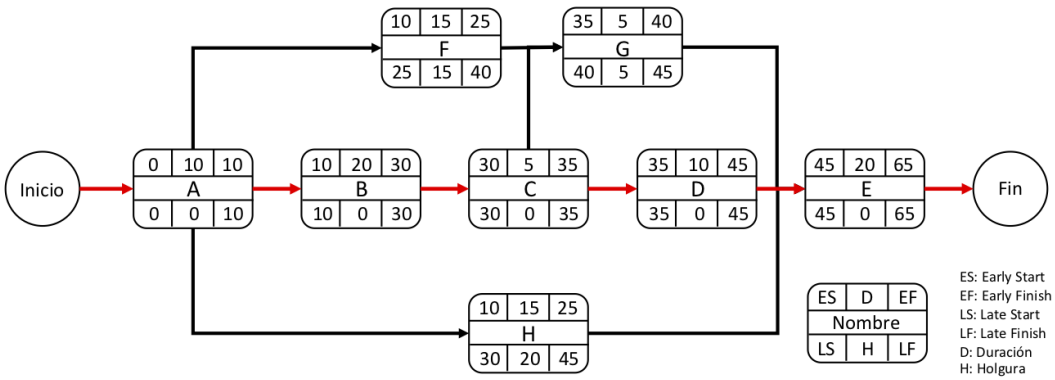

PERT y CPM en un mismo gráfico. Fuente: Adaptado de Wikipedia,

En la siguiente década, aparece una de las herramientas más utilizadas, la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT, WBS en inglés) (Department of Defense, 1998), que permite representar los entregables[4] del proyecto.

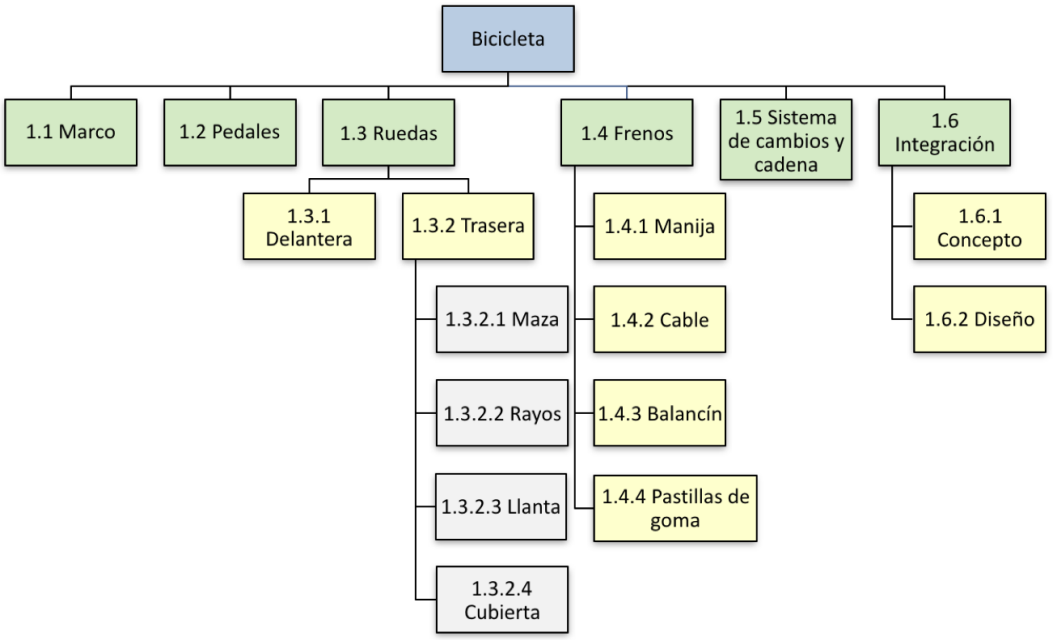

Ejemplo de EDT. Fuente: Adaptado de Practice Standard for Work Breakdown Structure, 3ra edición, p. 43.

A lo largo de los siguientes años, y hasta la actualidad, aparecen distintas asociaciones profesionales (International Project Management Association y Project Management Institute, entre

otras), teorías y herramientas de gestión (por ejemplo, la teoría de las restricciones y cadena crítica de Eliyahu M. Goldratt), metodologías y buenas prácticas (PRINCE2® y PMBOK®), estándares (ISO 21500, por ejemplo) y nuevas formas ágiles de trabajo.

Esta breve enumeración de hitos nos muestra la gestión de proyectos como una profesión viva, en pleno desarrollo y llena de oportunidades.

¿Qué es gestionar un proyecto?

Buena pregunta que tiene muchas respuestas, sobre la base de lo que se puede ver en la bibliografía. En mi caso, considero que gestionar un proyecto es trabajar con personas. Todo el resto es técnico y se puede llegar a aprender de alguna u otra manera. Aspectos que tienen que ver con herramientas tales como el valor ganado, el cronograma, la tormenta de ideas, como, por ejemplo, conocer cómo es la organización, cómo se estructura, cómo son los procesos de las distintas áreas, y cómo se produce, se distribuye, se vende, se cobra, etc., se llegan a comprender a través del estudio, la revisión de documentación y la experiencia.

Trabajar con personas es otra cosa. Es tener en cuenta sus culturas, sus personalidades, las cosas que las motivan, qué tipo de liderazgo aprecian, cómo se deben gestionar los conflictos, cómo se debe negociar con ellas, cómo nos comunicamos efectivamente, etc. Se requieren, lo que en la profesión llamamos habilidades

interpersonales. Y un buen director de proyectos **debe** ser muy bueno en este tema si quiere llegar a tener éxito.

He conocido profesionales muy detallistas y otros no tanto, líderes carismáticos cuya sola presencia energiza al equipo y otros muy tranquilos, que hacen y dejan hacer. Algunos tienen carácter fuerte y otros son callados, pero todos, repito, todos los que tienen éxito, son muy buenos en habilidades interpersonales.

Y, ya que estamos con el tema de la cultura, un buen director de proyectos debe entender tanto la cultura organizacional como la cultura nacional de su equipo, de su patrocinador y de sus interesados.

¿Quiénes intervienen en la gestión de proyectos?

Esta historia que les voy a contar no es mía y, sinceramente, no recuerdo quién me la contó. De todas formas, como ejemplo de los problemas que puede traer el no identificar bien a los interesados, tiene mucho valor.

Como primera medida, definimos al interesado como aquella persona o grupo de personas u organización que puede afectar el proyecto o ser afectada por este. Y antes que me lo pregunten, un competidor no es un interesado. Es, en todo caso, un riesgo. La razón es que un interesado va a recibir información del proyecto y sería realmente estúpido, como decía Aabo, proveer información acerca del proyecto a un competidor.

Volvamos a la historia. Esta persona, profesional con experiencia en la gestión de proyectos, a la que llamaremos Alicia, llegó a una empresa en la querían contratar a alguien para llevar adelante una iniciativa que era estratégica para la organización. Después de que aceptaron sus condiciones, Alicia comenzó con una de las actividades más importantes en la gestión de los proyectos, que es la identificación de los interesados.

Como es correcto hacerlo, Alicia comenzó a entrevistar a todas las personas preguntando, además de los datos requeridos para entender las necesidades, requerimientos y expectativas: "¿A quién cree usted que puede interesarle o afectarle el proyecto?".

Así, con este procedimiento tan sencillo, fue hablando con todos los directores, incluido el director general de la organización, y recabó la información necesaria para gestionar el proyecto.

Con el transcurso del tiempo, el proyecto fue tomando forma y los entregables pasaron por todos los niveles de aprobación necesarios para ser aceptados. Cuando el proyecto se finalizó, el director general convocó a una reunión donde se firmaría su aceptación y puesta en funcionamiento. Esto no quería decir que el trabajo de Alicia estaba terminado, pero si era un paso fundamental para las etapas que seguían en relación con la puesta en marcha y la transferencia de los conocimientos.

Al llegar a la sala de reuniones, Alicia observó una persona que no conocía, que estaba sentada en una esquina de la sala. Le llamó la atención, porque nunca la había visto, pero rápidamente apartó ese pensamiento para concentrarse en lo que venía.

El director general entró y la llamó a Alicia para presentarle a esa persona, quien resultó ser… ¡el dueño de la empresa! En ninguna conversación con ninguno de los interesados había aparecido esta figura y Alicia, dando por sentado que no había nadie por encima del director general, no había preguntado por él. De más está decir que lo que ustedes están pensando es lo que efectivamente ocurrió. Cuando le explicaron de qué se trataba el proyecto, el dueño lo miró realmente mal al director general, le dijo que le tenía que dar explicaciones de por qué había realizado un proyecto de esa magnitud sin su consentimiento y ordenó no firmar la aprobación.

Resumiendo, el proyecto se canceló y Alicia se quedó sin el trabajo que había por delante. Su único consuelo es que no dudaron en pagarle lo que le debían, pero el proyecto fue un fracaso.

¿De quién fue la responsabilidad de este grave error? ¿De Alicia? Puede ser. ¿Del director general? También. ¿De la metodología empleada para identificar interesados? También. ¿De la situación general de la empresa, de su cultura, de su organización? También. En todo caso, fue una suma de situaciones que conspiraron para que la iniciativa fracasara.

Hay mucho para aprender de situaciones como esta, pero lo más importante es que fallar en identificar un interesado puede ser, en ocasiones, letal para el proyecto.

Un interesado puede ser cualquier persona de la organización, desde el director general hasta un cadete. Todo depende del proyecto del que se trate.

Una precaución que hay que tener es que no se dejen de lado a los interesados por su nivel jerárquico. Recuerdo un curso que tuve que dar en una empresa que encaraba un proyecto de cambio de línea de producción con un costo de € 6.000.000. En un momento, hablando de los interesados, les pedí a los asistentes que los identificaran. Surgieron respuestas tales como el gerente de producción, el director financiero, el director general, etc. Extrañamente, nadie nombró a obreros o supervisores de línea. Cuando les pregunté porqué no los habían identificado, el director de producción me respondió: “Esos tienen que trabajar y hacer lo que se les dice. No se preocupe por ellos.”.

Esa respuesta, a mi juicio, representaba una forma de pensar que, posiblemente, les hubiera podido traer serios problemas durante la instalación de la línea. En mi respuesta, le indiqué que esas personas podían tener información valiosa para el proyecto. Si bien mi interlocutor no estaba dispuesto a dar el brazo a torcer, vi tres o cuatro caras de participantes que asintieron, de modo que espero que hayan tomado en cuenta mi comentario.

Entonces, sobre esta base, todas las personas de la organización pueden ser interesados. Todo depende del proyecto. A medida que crece su magnitud, también crece el número de involucrados.

La siguiente lista enumera, en general, los interesados típicos:

- Equipo de proyecto.
- Dueños.
- Directores.
- Socios de negocios.

- Inversionistas.
- Bancos.
- Gerentes funcionales.
- Gerentes de operaciones.
- Especialistas y técnicos.
- Obreros y empleados.
- Clientes.
- Proveedores.
- Organismos municipales, provinciales y nacionales.
- Sindicatos.
- Grupos de presión (ambientalistas, conservacionistas, etc.).
- Organizaciones no gubernamentales.

Todos ellos deben ser gestionados y atendidos, recabando sus expectativas, necesidades y requerimientos. El éxito de un proyecto está en relación directa con la identificación y gestión de los interesados. Y, como decíamos con anterioridad, los proyectos se hacen con las personas, por lo que todo lo comentado acerca de las habilidades interpersonales tiene valor en la relación con los interesados.

El patrocinador y el director del proyecto

Hay dos roles que son fundamentales para el proyecto, sin los cuales este irá, seguramente, al fracaso.

Patrocinador

El patrocinador es la persona que tiene la idea del proyecto. Entre sus funciones, podemos mencionar las siguientes:

- Representa al proyecto ante los estamentos superiores de la organización.
- Defiende la iniciativa.
- Consigue los recursos humanos, financieros, tecnológicos, de espacio, etc.
- Provee la dirección general del proyecto en lo que se refiere a la estrategia del negocio.
- Identifica los beneficios del proyecto y asegura que se cumplan.
- Participa, con consultor, de las etapas iniciales del proyecto, ayudando a desarrollar el acta de constitución[5] y el alcance del proyecto.
- Revisa los cambios propuestos por otros interesados y los acepta o rechaza, según sea su impacto en el proyecto.
- Negocia con los interesados cuando existen diferencias de opiniones acerca de temas del proyecto.
- Evalúa el éxito del proyecto al terminarlo.

El apoyo del patrocinador es fundamental y una de las causas de fracaso del proyecto es la falta de apoyo de su parte.

Director de proyecto

Es quien dirige el proyecto, desarrollando todo el plan y, luego, llevándolo a la práctica. Algunas de sus responsabilidades son:

- Planificación en general.

- Organización, gestión y motivación de los recursos humanos del proyecto.
- Gestión del cronograma del proyecto.
- Estimación, desarrollo y control del presupuesto.
- Gestión de los interesados, en especial aquellos que son claves.
- Gestión de los riesgos.
- Monitorización de progreso del proyecto.
- Gestión de los informes, presentaciones y reportes solicitados por los interesados.

La presencia del director de proyectos es fundamental para su correcta gestión. Un proyecto sin DP es similar a un barco sin timón. Va a moverse, pero sin seguir un rumbo y, tarde o temprano, va a sucumbir cuando las fuerzas a su alrededor lo afecten.

Aspectos para considerar en la gestión de proyectos

Cuando se habla de proyectos, usualmente, lo que primero viene a la cabeza del profesional que lo va a liderar es ¿qué es lo que tengo que hacer?, ¿cuánto tiempo tengo? y ¿cuál es el presupuesto?. Yo le agrego una pregunta más: ¿como va a ser la gente con la que voy a tener que trabajar?

Como respuesta a estas preguntas, podríamos enumerar algunos de los temas que las distintas metodologías y las buenas prácticas suelen abarcar:

- Alcance: El trabajo que se va a realizar en el proyecto y las características que tiene el resultado.

- Calidad: Si bien hay muchísimas definiciones de *calidad*, siempre utilizo la misma: la satisfacción de los requerimientos del usuario. Este aspecto está muy ligado con el alcance. Muchas veces se confunden y es importante tener en cuenta que no son la misma cosa.
- Duración del proyecto: Fecha de comienzo y fecha de final.
- Costos: La inversión que va a ser necesaria para finalizar el proyecto.
- Interesados, comunicación y recursos humanos: todo lo que tenga que ver con la gente del proyecto y cómo nos vamos a comunicar entre nosotros.
- Riesgos: Tema fundamental al que no le prestamos atención en Argentina. Zwikael y Ahn (2011) dicen que hay tres países con un alto UAI que no le prestan debida atención a la gestión de los riesgos; Rusia, Italia y… Argentina.
- Compras: Todo tipo de contratación que se realice en el proyecto.

Todo esto, y algunas cosas más, dependiendo de la industria y del proyecto, debemos tener en cuenta para aumentar las posibilidades de éxito. Y esto último es muy importante. Aquella persona que le diga que tal o cual metodología es indispensable para garantizar el éxito… ¿cómo decirlo?… le está vendiendo un buzón[6].

La realidad es que, como en todas las profesiones, el éxito se logra utilizando los conocimientos, habilidades, experiencias propias y ajenas y también teniendo un poco de suerte, aunque haya algunos que no lo acepten. Se alcanza con todo esto y con trabajo

inteligentemente aplicado para conseguir el objetivo que nos propusimos.

Hablando de riesgos

Riesgo es todo aquello que puede llegar a ocurrir y que tiene impacto, tanto positivo como negativo, en el proyecto. Esto implica que existe la posibilidad de que no ocurra y, por lo tanto, de que no tenga consecuencias. Esta es una distinción importante. Si tenemos la seguridad de que ocurra o vaya a ocurrir, no es un riesgo.

Las causas de los riesgos son múltiples, dado que su origen puede deberse a cuestiones que hacen a la organización, al tipo de proyecto, al ambiente PEST[7], a las herramientas utilizadas, al trabajo contratado, al objetivo del proyecto, etc. Por ejemplo, los riesgos pueden surgir a partir de las siguientes situaciones, entre otras:

- La interacción entre los integrantes del equipo.
- La aparición de un proyecto más importante que retire recursos del propio.
- La ocurrencia de un evento climático, económico, político y catastrófico, entre otros, que afecte al ambiente del proyecto.
- Huelgas y sabotajes.
- Problemas técnicos y humanos.
- La forma en la que se gestiona el proyecto.
- La estructura organizativa.

Taleb (2007) difundió la noción del cisne negro, la que definió como un evento totalmente inesperado que puede tener un impacto masivo

y que luego de ocurrido tiene una explicación que lo hace aparecer menos aleatorio y más predecible. La realidad es que el ser humano se concentra en lo que conoce y en las vivencias que ha sufrido a lo largo de su vida y deja de lado hipótesis que no coincidan con su experiencia.

Un cisne negro puede tener un impacto capaz de descarrilar lo que venía siendo una gestión impecable, pero esto no es una excusa para no realizar una correcta gestión de los riesgos. Tenemos demasiados ejemplos en la Argentina de pobre planificación y de riesgos materializados con, muchas veces, consecuencias trágicas, cuyas explicaciones, *ex post* pertenecen más al realismo mágico que a la vida cotidiana de cada uno de nosotros.

Nuevamente, hay muchos libros que tratan sobre este tema, pero lo cito porque no prestarle atención a la gestión cultural de las personas es un generador de riesgos.

¿Cómo se desarrolla un proyecto?

Un proyecto comienza cuando la organización así lo indica. Puede haber muchas maneras de darle inicio; desde un mensaje formal, con documentación legal y asignaciones de los recursos humanos a tiempo completo, hasta un simple mensaje de correo electrónico o una conversación en la máquina de café; pero, sea cual sea la alternativa elegida, comienza una serie de acciones que va a transformar una idea, el trabajo de mucha gente y un esfuerzo financiero importante en un resultado que, esperamos, sea beneficioso para la organización.

A partir de ese inicio, el director de proyecto se encarga de llevar adelante todas las actividades necesarias para ejecutarlo. La más importante es la planificación, donde desarrollamos planes que tienen que ver con el uso de los recursos y la forma en que vamos a transformar una visión en una realidad. Así, la ejecución del proyecto sigue una hoja de ruta definida que, como todo en la vida, tiene sus cambios. El secreto es no cambiar constantemente, para poder llegar a alguna parte.

Los planes van a permitirnos entender qué queremos hacer y cómo, cuándo, por qué y dónde lo vamos a realizar. Hay metodologías que les dan mucha importancia a los planes y otras cuyos planes tienen formas distintas de las usuales, casi como si no fuesen importantes…, pero lo son.

Cuando estamos inmersos en la vorágine del proyecto, deberemos tomar decisiones y construir lo que el proyecto va a entregar[8].

Así, el proyecto será una secuencia de cosas que se deben entregar hasta llegar al objetivo final. Durante ese período vamos a estar controlando costos, cronogramas, planes y listas. Trabajaremos con los proveedores, con los miembros del equipo y con los interesados en general. Informaremos a quienes deban ser informados y buscaremos las aprobaciones necesarias para continuar el trabajo. Negociaremos recursos, requisitos y dinero y convenceremos para seguir un determinado curso de acción. Nos reuniremos y presentaremos reportes. Desarrollaremos procesos, métodos, mecanismos y procedimientos. Escribiremos manuales y dibujaremos diagramas. Verificaremos los riesgos y la seguridad del

equipo de trabajo. Y, al final, entregaremos el resultado, festejaremos y nos felicitaremos por un trabajo bien realizado.

Y de este modo finaliza mi somero resumen de cómo se desarrolla un proyecto.

1. Se denomina alcance al trabajo necesario para obtener los objetivos del proyecto.↩

2. Si vamos a ser puristas, en realidad el proyecto termina una vez que la fiesta termina, se cierra toda la parte administrativa y se generan las lecciones aprendidas, aunque todo depende del alcance que hayamos acordado↩

3. Es la persona que dirige el proyecto.↩

4. Todo aquello que el proyecto entrega que sea de utilidad para los interesados o el mismo proyecto.↩

5. El acta de constitución es el documento que la da inicio al proyecto y que lo guía durante su desarrollo.↩

6. Frase que surge de una “avivada” porteña del siglo pasado.. Recuperado el 14 de diciembre de 2019↩

7. Político, Económico, Social y Tecnológico. Existen variaciones a esta sigla, que incorporan aspectos legales y ambientales.↩

8. En inglés, esto que vamos a entregar se denomina *deliverables* que no tiene una traducción al español. Usualmente se utiliza el neologismo “entregables”, pero no está reconocido por la Real Academia Española.↩

Sugerencias culturales para la dirección de proyectos en Argentina

Hemos visto, en la primera parte de este libro, aspectos generales de la cultura nacional y de la gestión de proyectos. Ahora llegó el momento de unirlos y de ver cómo la cultura nacional, específicamente, impacta en la gestión de proyectos en la Argentina.

Durante las décadas del 50 y del 60 del siglo pasado, prosperó la idea de que la gestión era un tema universal, aplicable a todas las naciones en el mundo. Las naciones pobres se beneficiarían de las prácticas utilizadas por las naciones ricas y tenderían a converger en una riqueza universal, desapareciendo todas las diferencias. Así, un negocio se desarrollaría y se mantendría en el tiempo utilizando mecanismos ya probados en los países desarrollados. Los procesos, los procedimientos, la gestión de los recursos, la forma de hacer negocios, todo ello sería mundialmente uniforme, simplemente copiando la forma de gestionar los negocios y aplicándola en todas partes.

Esta situación utópica, un tanto arrogante, desapareció hacia los años 70 cuando entró en conflicto con la realidad, marcada por

procesos separatistas que buscaban la defensa de su propia identidad y por el reconocimiento por parte de las organizaciones supranacionales de las diferencias entre una nación y la otra (G. Hofstede, 1983). Se vio, en ese momento, que no hay una sola forma de gestionar y que lo que funciona en una cultura puede no funcionar en otra. Estos procesos diferenciadores se produjeron al mismo tiempo que la globalización, lo que produjo tensiones entre identidades nacionales y la sutilización de las líneas de frontera tanto en procesos económicos como políticos y culturales. En este estado de cosas, se realizan varias investigaciones con el objetivo de generar modelos para poder estudiar la cultura nacional, entre ellos el de G. Hofstede.

La sinergia entre la situación internacional y el desarrollo de modelos, provocó un marcado interés en entender el impacto de la cultura nacional en muchísimas áreas de negocios (proyectos, *marketing*, operaciones, atención al cliente, contabilidad, estrategia, etc.) que generaron diversos trabajos científicos. Un aspecto especialmente importante, que fue y sigue siendo muy estudiado, es el desarrollo de proyectos internacionales que llevan a cabo empresas de varios orígenes. Dentro de la bibliografía se pueden encontrar ejemplos de estudios sobre la colaboración de organizaciones en distintos lugares del mundo, tales como Medio Oriente, Asia y Europa. De estos ejemplos surgen una serie de inconvenientes provocados por las diferencias culturales entre los miembros de los equipos de proyecto y una serie de lecciones aprendidas que los autores proponen para futuras iniciativas.

Sin embargo, la bibliografía sobre el impacto de la cultura nacional en los proyectos en Latinoamérica es muy escasa. De hecho, no pude encontrar un solo trabajo sobre el tema para la República Argentina, lo que me llevó a considerar la posibilidad de realizar una investigación sobre el tema.

Entre los años 2016 y 2019, realicé una revisión bibliográfica sobre la cuestión, desarrollé un instrumento de investigación y llevé a cabo las entrevistas a directores de proyecto argentinos que generaron un material muy rico acerca de los comportamientos culturales en la gestión de proyectos en Argentina. Las siguientes secciones reflejan las sugerencias culturales sustentadas en las respuestas de esta investigación, con el agregado de comentarios basados en mi experiencia como profesional.

Es de hacer notar que cada sección tiene sugerencias que coinciden con lo esperado según el modelo cultural de G. Hofstede, pero también otras que tienen origen en comportamientos que se apartan de lo esperado. Estas últimas se van a denominar sugerencias no coincidentes, para que usted pueda identificarlas. El origen de estos comportamientos no está explicado ni en la tesis ni en este libro. Para ello, se va a requerir mayor investigación sobre el tema.

El poder

Algunos años atrás, en la empresa donde trabajaba, recibimos a Robert, el CEO, cuando decidió visitar a los sitios en Argentina. Acostumbrado a nuestra cultura, donde esto no es común, me sorprendió su invitación a todos los gerentes a acompañarlo en la cena. De más está decir que esta comenzó muy formalmente, más que nada por nuestra parte, porque no estábamos acostumbrados a esa cercanía tan común en los norteamericanos.

Poco a poco, y gracias a los esfuerzos de mi jefe nos fuimos distendiendo y comenzando a hablar de cosas que no tenían que ver con el trabajo. Pero el punto más divertido de la reunión fue cuando el gerente de RR. HH., Sergio, decidió pedir dos bochas[1] de helado, y, para beneficio de Robert, tradujo al inglés su pedido. El diálogo se desarrolló más o menos así:

"*What did you order for desert, Sergio*?"[2]

"*I asked for two…*"[3] Sergio se quedó pensando qué decir, porque no sabía cómo traducir "bocha".

"*I asked for two… balls of ice cream.*"[4]

Acá tenemos que hacer un paréntesis para explicar que *ball* es una pelota para jugar a algún juego en particular, pero también es una palabra vulgar para testículo.

Robert pensó en la segunda acepción y largó una carcajada que llamó la atención de las mesas de alrededor. Por supuesto, todos comenzamos a reírnos y el pobre Sergio tuvo que soportar una clase de inglés de Luisa, la gerente de Logística, que le explicó el correcto uso de *ball* y *scoop*[5].

De más está decir que a la mañana siguiente, todos comentábamos la forma en que Robert se había comportado con nosotros, muy llano y cordial, sin imponer ningún tipo de distancia. Sin embargo, pronto descubrimos que esa cercanía, rara para nosotros y probablemente mal interpretada, no implicaba una disminución del poder y autoridad real que Robert tenía, sobre todo cuando, más tarde en una reunión, le ordenó al director comercial, en términos muy claros, que bajara los días en la calle de las facturas emitidas, dado que esa métrica no estaba de acuerdo con estándares de la organización. Allí entendí una importante diferencia entre la relación con los subordinados y el ejercicio del poder.

La Real Academia Española define el poder como el 'dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo.'. En su trabajo clásico sobre autoridad y poder, French y Raven (2001) describen el poder como la capacidad de influir sobre un determinado sistema a lo largo del tiempo. También comentan que el poder que ejerce un individuo es la resultante de dos fuerzas contrapuestas: una que desarrolla la influencia y la otra que se resiste.

La distancia al poder representa el grado de desigualdad entre quien ejerce el poder y quién debe recibir la influencia de ese poder. Esto

afecta temas importantes como los siguientes, entre otros:

- La innovación.
- La autonomía.
- La comunicación.
- La estructura de la organización del proyecto.
- La toma de decisiones.
- Los roles y responsabilidades.
- La participación en la planificación del proyecto.
- El liderazgo.

Volviendo a la anécdota del principio, es importante resaltar que debido a determinados comportamientos, se puede llegar a confundir cercanía personal con distancia al poder. Por ejemplo, los norteamericanos, con un bajo nivel de distancia al poder, tienen un trato cercano con sus subordinados, sin que esto sea una limitación para el ejercicio del mismo. En cambio, los belgas tienen una distancia al poder mayor que los anteriores y, a la vez, son muy distantes en lo personal.

En el caso de la gestión de un proyecto, hemos visto que el patrocinador es quién tiene la idea, provee los recursos y defiende el proyecto. Por lo tanto, su poder proviene tanto de la posición que ocupa en la organización, como de las acciones que ha tomado para iniciar el proyecto. Por eso, es importante entender la posición relativa del poder en una organización.

Supongamos una línea de producción, donde hay un grupo de obreros con un supervisor que los gestiona. Quien tiene el poder es el supervisor. Si continuamos escalando en la organización, el

siguiente escalón podría ser el ingeniero de procesos, que supervisa todo el proceso de fabricación, y que tiene bajo su control una serie de supervisores. A su vez, más arriba, podríamos tener un jefe de turno y por sobre él, el gerente de planta.

A medida que crece la responsabilidad, va aumentando el poder y a mayor distancia entre los distintos puestos, mayor es la diferencia de poder que pueden ejercer cada uno de los cargos mencionados.

No obstante, de ninguna manera es necesario que el patrocinador sea, siempre, el gerente de planta o el que tiene más poder. Si un ingeniero de procesos tiene una idea, la "vende" a su jefe, consigue los recursos y defiende el proyecto, si bien su nivel de poder no es demasiado alto, se convierte en el patrocinador del proyecto.

Entonces, para entender la distancia al poder y su impacto sobre la gestión del proyecto, es importante entender que el patrocinador no siempre va a ser la persona con más poder en el área organizativa en la que se lleva a cabo la iniciativa, aunque sí lo será en el proyecto.

A continuación, voy a detallar una serie de sugerencias que tienen que ver con el poder y los interesados.

Roles y responsabilidades

Se define el rol de una persona como la función que desempeña en la organización; y a la responsabilidad como las actividades que debe realizar en cumplimiento de ese rol.

En un proyecto, es muy importante tener claros los roles y responsabilidades en la estructura de gestión. El conocimiento de las relaciones de poder y autoridad, además de brindar certidumbre, permite entender quiénes son los actores que gestionan y toman las decisiones en el proyecto, cuáles son los canales apropiados para comunicarse y qué actitud se puede esperar de ellos ante un determinado tipo de interacción.

Por otro lado, el tener clara esta información da una idea del nivel de autonomía que puede llegar a tener un determinado rol. Si bien la autonomía es valorada, y en esto coinciden todos los DP entrevistados, esta debe estar necesariamente limitada por los siguientes aspectos:

- Roles y responsabilidades existentes en el proyecto.
- Tipo y alcance del proyecto. Es más común, por ejemplo, tener mayor autonomía en proyectos que tengan que ver con innovación que en aquellos en los que se está construyendo una represa.
- Incertidumbre del objetivo. Este concepto puede ser enfocado desde dos puntos de vista. El primero, como el objetivo es muy incierto, la autonomía debe estar limitada porque agrega incertidumbre. Sin embargo, desde otra perspectiva, la autonomía agrega valor al buscar nuevos puntos de vista que pueden hacer al proyecto menos incierto.
- Estructura, tanto del proyecto como de la organización que lo lleva a cabo.
- Tipo de trabajo del equipo.

Entonces, es importante evitar situaciones que puedan traer confusión en cuanto a las relaciones de poder en una iniciativa.

> **Sugerencia cultural**
> Les sugiero al patrocinador y al DP, desarrollar el organigrama y los roles y responsabilidades, con el mayor detalle posible, compatible con el tipo de proyecto por realizar y, sobre todo, comunicarlos y mantenerlos actualizados. Así, se disminuye la incertidumbre en el proyecto y se definen, con claridad, las estructuras de poder y autoridad y las relaciones entre los distintos niveles.

Toma de decisiones

Los niveles de decisión en un proyecto están en relación directa con las normas y regulaciones de la organización donde este se realiza y las de la organización que lo realiza, que no necesariamente es la misma.

De acuerdo con una distancia al poder media, y respetando las reglas antes mencionadas, cuando el proyecto está en marcha las decisiones diarias son de la competencia del DP, que debería tener la necesaria autonomía para realizarlas.

Debido a las características de la gestión, es necesario tomar decisiones y, muchs veces, aplicar discrecionalidad a las actividades y a la gestión del proyecto. Si todo esto modifica el plan que se consensuó previamente, las mismas normas anteriormente mencionadas pueden brindar una guía de cómo llevar adelante las consultas y qué canales deben utilizarse.

Sin embargo, si el trabajo sigue el plan que se aprobó, el DP debe tener la autonomía necesaria para desarrollar sus actividades.

Por otro lado, un comportamiento muy dañino para la salud del proyecto es el del interesado que hace valer su poder actuando directamente sobre un miembro del equipo para obtener algún tipo de beneficio personal en lo que respecta a la iniciativa. Esto provoca tensiones entre los integrantes del proyecto, incluido el DP y puede traer inconvenientes a corto y largo plazo.

Debido a que las estructuras de gestión existen en las organizaciones, el patrocinador es quien va a tomar las decisiones que van más allá del plan y el DP va a tomar las decisiones que se ajustan al plan o aquellas para las que ha sido autorizado.

> **Sugerencia cultural**
> Les sugiero al patrocinador y a los interesados clave del proyecto que tomen en cuenta que la responsabilidad del DP es llevar a cabo la iniciativa y tomar las decisiones necesarias para lograr el éxito y que, por ello, este deberá contar con la necesaria autonomía.
>
> Es también importante entender que toda interferencia por parte de patrocinador y de los interesados clave por fuera de los procesos determinados en conjunto puede impactar sobre el liderazgo del DP, así como influir negativamente sobre el equipo, aumentar el riesgo y minimizar las posibilidades de éxito.

Autonomía e innovación

Anteriormente comenté que ambos aspectos son afectados por el grado de distancia al poder. En este caso es importante resaltar que la autonomía influye en el modo en que se van a desarrollar las actividades del proyecto. Debido a que los miembros del equipo son los que, efectivamente, van a llevar a cabo la actividad, es bueno tener en cuenta que ellos pueden agregar valor al proyecto, si pueden ejercer un cierto grado de autonomía.

Esto implica que es posible realizar tareas técnicas de distintas formas y encontrar nuevas maneras de obtener los resultados esperados. Por otro lado, es posible que existan nuevas herramientas o métodos que estén disponibles y una pequeña inversión de tiempo de investigación en su uso puede significar un gran impacto positivo en el proyecto.

En otro orden de cosas, debido a que es imposible llegar a un $100\ \%$ de especificaciones en el alcance, y a que hay actividades cuyos aspectos técnicos no son del conocimiento del DP, es necesario confiar en el sentido común de quien realiza la actividad y permitirle actuar con una cierta discrecionalidad. Además, es fundamental la buena comunicación dentro del equipo y con el DP, así como una clara visión estratégica, informada oportunamente, para no coartar el aporte de los miembros del equipo.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al DP promover, desde el comienzo del proyecto, la autonomía de los miembros del equipo y la confianza en sus decisiones, mediante la buena comunicación de la estrategia que da origen a la iniciativa, los objetivos acordados con el

> patrocinador, las especificaciones técnicas del producto y la creación de canales que permitan, con la suficiente anticipación, el aviso de toda innovación en las actividades del proyecto, para que sea tomada en cuenta por el DP, quien, de ser necesario, podrá aplicar los procedimientos de cambio establecidos.

Estrategia de participación

El equipo de proyecto valora el rol de guía del patrocinador, su apoyo a la iniciativa y la mayor comunicación y claridad que su involucramiento trae. La atención de este a lo que está ocurriendo es una señal positiva importante para los interesados en general y para el equipo en particular.

Sin embargo, uno de los inconvenientes que se pueden encontrar en los proyectos tiene que ver con su grado de su participación. A veces, el patrocinador no participa o participa en muy poca medida. Esto trae numerosas dificultades, dado que, como ya vimos anteriormente, este rol es fundamental para el proyecto, en función de la guía que puede brindar y su llegada a los máximos estamentos de la organización. Por otro lado, esto trae confusión acerca del futuro de la iniciativa, dado que se considera que, si no le presta atención, es porque esta no tiene viabilidad desde el punto de vista de la organización.

En contrapartida, el patrocinador puede llegar a participar demasiado, interviniendo en reuniones o decisiones que corresponden al DP o comunicándose en forma directa con los

miembros del equipo, sin involucrar al DP. Este tipo de comportamiento es negativo para el proyecto porque diluye la función del DP, genera desorientación entre los miembros del equipo y aumenta el riesgo del proyecto.

> **Sugerencia cultural**
> Les sugiero al patrocinador y al DP que consensúen una estrategia de participación para obtener los beneficios antes mencionados, minimizando la superposición de roles y clarificando la autonomía del DP y del equipo de proyecto. Esta estrategia deberá incluir aspectos tales como la toma de decisiones, la participación en reuniones, las interacciones directas con el equipo de proyecto, y todo otro aspecto necesario para evitar confusiones y aclarar las relaciones entre ellos.

Liderazgo e interesados

Lewis (1939) identifica las distintas características de un liderazgo autoritario.

- Todo está determinado por el líder.
- Usualmente, el líder determina, para cada integrante del equipo, qué cosas debe hacer y quiénes lo deben ayudar.
- El líder critica, tanto positiva como negativamente, en forma personal. Actúa en forma fría y distante.

El liderazgo autoritario no es aceptado por la cultura argentina. Tanto los miembros del equipo como los interesados, rechazan este tipo de comportamiento.

Uno de los interesados que están comúnmente presentes es el proveedor, cuyo interés es el negocio que pueda realizar dentro del proyecto. Su relación con el DP es especial. El proveedor busca ser elegido y el DP busca que el proveedor complete su trabajo en tiempo y forma.

El autoritarismo por parte del DP puede llegar a dañar esta relación mutuamente beneficiosa por lo que, cuando se realiza la contratación de proveedores es preferible utilizar algún otro tipo de liderazgo, que deje claras las reglas de juego y promueva la colaboración entre ambos.

Es importante, también, tener en cuenta que, si bien esta sugerencia está enfocada en la relación entre proveedores y DP, se puede extrapolar a cualquier tipo de interesado.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al DP que desarrolle una relación de confianza y cooperación con los proveedores, dejando claro de antemano el alcance del trabajo que este deberá prestar, y que tenga en cuenta, como guía de la relación, la importancia de la acción del proveedor para el proyecto, el desarrollo de una organización del proyecto que integre al proveedor como parte del equipo y la provisión de valor para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Calidad

Uno de los factores importantes en relación con la distancia al poder es la decisión de escuchar, o no, al interesado en cuanto a los

requerimientos para el proyecto. Cuanto mayor es esa distancia, más decisiones se tomarán en forma inconsulta y menos se tendrá en cuenta a los interesados. Debido a que la calidad implica la satisfacción del cliente, esta actitud tiene un impacto importante sobre cómo puede llegar a ser visto el éxito del proyecto o cuánto puede llegar a ser utilizado por los interesados.

En nuestra cultura, con una distancia al poder media, considero que es importante involucrar a todos los interesados, escuchando a los usuarios, relevando sus necesidades y requerimientos, priorizando en función de parámetros establecidos por la estrategia del proyecto y los comentarios del patrocinador e interesados clave, y acordando el alcance final. Los requerimientos construyen el valor del proyecto, por lo que es fundamental gestionarlos.

> **Sugerencia cultural**
> Les sugiero al patrocinador y al DP realizar una gestión cercana a las necesidades, las expectativas y los requisitos de los interesados. Además, de acuerdo con las buenas prácticas y en coincidencia con la cultura, se recomienda realizar un plan de gestión de la calidad que contenga los lineamientos generales para dotar de claridad al proyecto, en lo que se refiere a la gestión de los requisitos.

Comunicación

La comunicación en el proyecto es uno de los temas más importantes que existen. En nuestra cultura, con un PDI medio, demandamos comunicaciones específicas, precisas y claras, con

responsables establecidos y destinatarios identificados. Si bien existe distancia jerárquica, tal como lo mencioné antes, la relación entre el patrocinador, el DP y los interesados es fundamental para la salud del proyecto. A tal efecto, es conveniente tener en cuenta la estructura organizativa en el plan de comunicaciones para evitar malos entendidos y gestionar la difusión correcta de los datos e información del proyecto, sobre la base de las necesidades de los interesados.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al DP que desarrolle un plan de comunicación basado en la estructura organizativa y en el relevamiento de los requerimientos de los interesados, incluyendo responsables y destinatarios, mecanismos y métodos, datos e información por comunicar y periodicidad, entre otras cosas. También sugiero que se realice una evaluación de la tecnología por aplicar, considerando que todo medio, incluyendo el papel, es viable para ese objetivo.

Participación del equipo

Una de las alternativas que tiene el DP para comenzar a planificar el proyecto sin que su equipo esté completo, es definir y estimar las actividades por su cuenta o bien requerir la ayuda de un experto o de otro DP. Sin embargo, cuando su equipo está completo, las estimaciones deben hacerlas quienes van a realizar dichas actividades. En países con alta distancia al poder, esto no necesariamente ocurre.

Por otro lado, un DP no necesariamente debe conocer técnicamente el proyecto. Si bien es positivo un cierto conocimiento, lo importante es que se dedique a su gestión y no a la resolución de problemas técnicos.

En la Argentina, que tiene una distancia al poder media, los DP coinciden en que es fundamental la participación del equipo de proyecto para determinar el trabajo por realizar. Esto se debe a los siguientes motivos:

- Conocimiento técnico.
- Más ajustada estimación técnica de la duración de las actividades.
- Mejor gestión de los riesgos.
- Mayor compromiso del equipo con algo que este mismo definió.
- Mejor comunicación entre los miembros.
- Mejor gestión del equipo por parte del DP.

Por ello:

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al DP que involucre al equipo de proyecto en la determinación del trabajo por realizar, por cuestiones que van más allá del tema técnico y que tienen que ver con nuestra cultura.

Lo individual y lo colectivo

Hace ya muchos años, tuve la suerte de liderar el proyecto de implementación de un ERP unificado de primer nivel en la empresa donde trabajaba. Este proyecto, muy deseado por todos —sobre todo por la contadora general, que estaba cansada de enviar reportes contables a casa matriz— implicaba una serie de desafíos, entre los cuales estaba gestionar dos equipos de trabajo, uno argentino y uno norteamericano, con participación de algunos perfiles europeos. Si bien había desafíos técnicos, estos no eran tan grandes como aquellos que tenían que ver con la gestión, tales como planes de cuenta unificados, acceso en línea a existencias en depósitos en distintos países, compatibilización de procesos comerciales y administrativos y de logística. Esto implicaba que los grandes jugadores en este partido eran los usuarios funcionales y no tanto los especialistas técnicos.

Un rol clave era el de Cloe, una analista funcional que trabajaba tanto con los expertos técnicos como con los funcionales, transformando los requerimientos de los usuarios en reglas de negocio que se configuraban en el sistema.

Durante cuatro meses Cloe, en Estados Unidos, y yo, en Argentina, trabajamos fuertemente en entender las necesidades locales para compatibilizarlas con las de casa matriz. El resultado de este trabajo fue una implementación impecable, pero, con mucha tensión entre los integrantes de los equipos. Nunca hubo una pelea, pero hubo situaciones en las que tanto mi jefe como yo, tuvimos que intervenir

para calmar los ánimos y llegar a consensos que permitiesen continuar con el proyecto.

Esta tensión dio lugar a que reflexionáramos con Cloe sobre los distintos modos de abordarla por parte cada cultura. En Argentina, trabajábamos y nos distendíamos en grupo. Teníamos algún presupuesto para actividades en conjunto y periódicamente las realizábamos. En Estados Unidos, un país individualista, estas actividades eran más limitadas y más enfocadas en el trabajo.

Debido a la importancia del proyecto, se decidió que el equipo de Estados Unidos vendría a Argentina para la última semana de implementación. Resolvimos, entonces, realizar nuestro tipo de actividades con ellos, para que pudieran relajarse y disfrutar de buenos momentos.

El evento fue una sorpresa. Los invitamos a cenar a un lugar con un espectáculo de tango realmente bueno y una comida de primera. Lo disfrutaron enormemente. Se relajaron, contaron anécdotas personales y cumplieron con el dicho: si querés conocer a una persona, hacelo con un trago y una buena comida de por medio.

Sin embargo, lo que me dio la pauta de la diferencia entre el manejo de la tensión entre el equipo norteamericano y el argentino fue lo que ocurrió al día siguiente. Eran las seis de la tarde, la mayoría de la gente se había ido de la empresa y yo estaba en mi oficina terminando algunos documentos de la implementación, cuando se abrió la puerta y entró Cloe. Me preguntó si podía conversar conmigo unos minutos a lo que respondí que sí; al sentarse, se largó a llorar de una manera desgarradora. Durante 20 minutos me estuvo

contando todos los problemas que tenía, tanto personales como de trabajo, desahogándose de todo aquello que no podía contar a nadie. Al finalizar, se secó las lágrimas, me agradeció y se retiró.

Al día siguiente, convoqué a una reunión de todo el equipo y les comenté que estaba a su disposición, como líder del proyecto, para que conversaran conmigo acerca de cualquier tensión que existiese y cualquier problema que tuviesen. La respuesta fue muy interesante, dado que varios vinieron a contarme cosas, que luego se transformaron en acciones para resolver los cuestionamientos, y recibí comentarios positivos tanto de mi jefe local como de mi jefe en Estados Unidos.

En el contexto de esta anécdota, el tratamiento grupal de las tensiones y problemas resultó, sobre la base de lo antes comentado, más sano para el proyecto y, al final, permitió desarrollar relaciones interpersonales más duraderas que se siguen manteniendo hasta hoy en día.

La cultura argentina es levemente colectivista. Esto implica que en una situación en la que estén involucradas dos o más personas, lo grupal va a ser considerado antes que lo individual. Sin embargo, esto no implica que las capacidades individuales no sean tenidas en cuenta. De hecho, la responsabilidad del DP es individual y está bien que lo sea, pero el enfoque que le tienen que dar a su gestión debe ser, culturalmente, grupal.

Este aspecto de la cultura afecta lo siguiente:

- La gestión del DP.

- La comunicación con el equipo de proyecto y los interesados, específicamente en cuanto a los reportes y a las reuniones de trabajo.
- Las capacidades de los equipos de trabajo.

La gestión del director de proyecto

Desde un punto de vista de las buenas prácticas de gestión de proyectos, es evidente que el DP es el responsable de la iniciativa y, como tal, debe gestionar todo lo que sea necesario para lograr el éxito del proyecto. Esta responsabilidad incluye la preocupación por los interesados en general y por los miembros del equipo en particular, buscando generar espíritu de equipo, no solo en aquellos involucrados en temas técnicos, sino en todos los interesados. Esto debe ser encarado teniendo en cuenta la tendencia cultural a la visión grupal de las cosas.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al patrocinador que, cuando deba seleccionar un DP para su proyecto, elija un profesional con un fuerte compromiso para con la formación de equipos y la creación de relaciones interpersonales y que tenga la capacidad de integrar visiones distintas, como temas para destacar en el comportamiento del DP.

La comunicación y las reuniones

Existen, en el mundo, múltiples alternativas de comunicación en un proyecto. Algunos prefieren conversaciones personales; otros,

reportes escritos; otros, presentaciones; y otros, reuniones grupales, seguidas de reportes escritos. Muller y Turner (2004) clasifican las preferencias de comunicación en función del nivel de individualismo de la sociedad.

Para nosotros, los argentinos, que somos levemente colectivistas, las reuniones de proyecto y los reportes de situación son importantes. Sin embargo, cada vez que pregunto en un curso si consideran que las reuniones son una pérdida de tiempo, la respuesta es, invariablemente sí, con muy pocas personas que dicen que no, pero que inmediatamente agregan "si se manejan bien".

Tal como comenté en la anécdota de las reuniones con los norteamericanos, somos impuntuales. Además de impuntuales, nos dedicamos a hablar, durante los primeros diez o quince minutos de la reunión, de cualquier cosa —en general, fútbol, política y algún otro tema de actualidad— menos del tema previsto. Cuando se han agotado estos temas, alguien, casi siempre el que tiene más que perder si no se realiza la reunión, comienza a conversar sobre el asunto que originó la convocatoria.

Si bien la forma como se realizan las reuniones tiene que ver con la cultura, existe un componente muy importante de gestión, por lo que es evidente que es necesario algún tipo de lista de las principales acciones por realizar en la convocatoria a fin de manejar la reunión. Entonces, como *bonus track* de este libro, les comparto lo que yo tengo en cuenta para convocar una reunión.

1. Fecha, horario y duración de la reunión

Si son reuniones periódicas, elijo una fecha y hora que se repita, de modo que produzca acostumbramiento en las personas que deben asistir. Esto es, típicamente, aplicable a las reuniones con el equipo de proyecto. Para reuniones *ad hoc*, elijo una fecha y hora que dé tiempo a los invitados a prepararse. No hay peor cosa que invitar a alguien a una reunión con una hora de anticipación y pedirle que prepare un informe especial que requiere tres horas de elaboración. Esto es una mala práctica que puede tener consecuencias importantes y negativas para el tema que se esté tratando.

2. Temario o agenda

   Toda reunión debe tener un temario, una guía de lo que se va a tratar en ella. Esto va a permitir su mejor gestión y va a dar información de lo que pueden esperar las personas invitadas.

3. Invitación

   La invitación debe contener, como mínimo, la fecha y hora, el lugar, la agenda, y, si son reuniones virtuales, toda la información necesaria para realizar la conexión con la tecnología utilizada. Tanto el lugar como la parte virtual de la reunión, es fundamental gestionarlos con la antelación suficiente.

   Hablando de tecnología, es esencial revisar todas las alternativas tecnológicas para conectarse. La gente de TI (asumo la culpa de ser uno de ellos), se enamora de lo nuevo, de lo que se denomina *cutting edge*[6] y se olvida de que no

necesariamente va a funcionar para el objetivo para el que se lo utiliza. Entonces, todo elemento tecnológico debe ser probado en todas las condiciones y situaciones posibles que pueden darse en la reunión, para evitar problemas.

4. Invitados

   No invite porque sí o por si acaso. Debemos ser respetuosos con el tiempo del otro, sea superior o subordinado. Es muy común escuchar: “Estuve sentado una hora sin abrir la boca. No sé porqué me invitaron”. Todo invitado debe tener que ver con el tema tratado y con el aporte que puede realizar.

5. Puntualidad

   ¡Qué tema!, sobre todo para los argentinos. El comienzo de la reunión debe ser a la hora acordada. Las razones son varias:

   - Respeto a los que llegaron puntuales.
   - Respeto a aquellos que necesiten la sala a continuación de la reunión.
   - Respeto por las responsabilidades de los invitados.
   - Respeto hacia quien convocó la reunión.
   - Eficiencia en el uso de los recursos.

6. Preparación

   La reunión debe ser preparada, es decir que tanto los invitados como el organizador deben tener toda la información necesaria y entregarla para que sea analizada a fin de llegar a conclusiones que justifiquen el tiempo dedicado.

Si la reunión involucra un viaje o movimiento entre edificios, tengan en cuenta el tiempo del traslado y de la eventual búsqueda de estacionamiento. Si surgiese un contratiempo, avisen.

7. Gestión de la reunión

   Apenas comenzada la reunión, presenten a las personas nuevas y sigan el temario enviado por correo. Algunas de las cosas que pueden ocurrir son las siguientes:

   - Surgen temas que no están en la agenda, pero que requieren acción. Para estos casos, yo uso la técnica del *parking lot* o estacionamiento. En un lugar del pizarrón blanco o del rotafolio utilizado, escribo estos temas y luego dela reunión los analizo para tomar acción. Si hay alguna urgencia, actúo en consecuencia.
   - Alguna persona va a comenzar a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con el tema propuesto. Expresiones como “Y ya que estamos…”, “ahora que me acuerdo”, “algo que no está dentro del temario”, etc., son riesgosas para la gestión del encuentro. En ese momento, y con mucha diplomacia, utilizaremos el *parking lot* para demostrar que estamos considerando lo que expresa esta persona, pero que lo analizaremos en otro momento. Después, volvemos a tratar los temas de la agenda.

8. Decisiones y acciones

Cada decisión que se tome en la reunión debe ser inmediatamente convertida en una acción, con una fecha de finalización y un responsable.

9. Minuta

   Durante la reunión el DP o quien él defina, va tomando notas de lo conversado, de las decisiones, acciones, fechas y responsables y, al finalizar, las comparte en forma de minuta. Esta consiste en un resumen de todo lo conversado y decidido, de la más mínima longitud posible, con las fechas acordadas y los responsables asignados. Una vez finalizada, la distribución debe realizarse lo más rápidamente posible.

Una reunión bien gestionada tiene, entre otras ventajas, las siguientes:

- El intercambio de opiniones entre los participantes, luego de la presentación del tema.
- El contrapunto entre los miembros del equipo.
- La aparición de problemas ocultos.
- Los distintos puntos de vista sobre la misma situación.
- La participación de todos los miembros del equipo.
- Las interacciones que no se dan en el día a día.

Para una cultura con un individualismo medio, tanto las reuniones de proyecto como los reportes de situación son importantes.

> **Sugerencia cultural**
> Con respecto a los reportes, y teniendo en cuenta los

> comentarios del anterior ítem, sugiero al DP que desarrolle e implemente un proceso de creación y distribución de la información en reportes, cuyo contenido sea consensuado con los interesados que lo van a recibir.
>
> Con respecto a las reuniones, mi recomendación al DP es desarrollar e implementar un protocolo que contenga entre otros, los siguientes puntos:
>
> - Desarrollo y envío de la agenda con anticipación a la reunión.
> - Invitación a los interesados correspondientes.
> - Desarrollo y aplicación de reglas de conducta, incluyendo el tema de la puntualidad.
> - Identificación de responsables de alguna acción, con fecha de cumplimiento.
> - Realización y distribución de la minuta.
>
> Además, se sugiere gestionar y conducir la reunión y el uso de la técnica *parking lot*, para registrar asuntos fuera de agenda que deben ser considerados en otra oportunidad.

Los intereses del director de proyecto

Al contrario de lo esperado, teniendo en cuenta un leve colectivismo de nuestra cultura, el DP analiza la posibilidad de no participar en el proyecto si los objetivos no coinciden con sus intereses particulares. Por lo tanto, desde el punto de vista de la organización, patrocinador o cliente, es conveniente buscar una alineación entre los objetivos personales del DP y los objetivos del proyecto. Los resultados

indican que, dada esa coincidencia, hay una mayor sensación de bienestar, y un mayor compromiso e interés.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al patrocinador buscar un director de proyecto cuyos objetivos e intereses sean congruentes con los del proyecto.

Conformación de equipos de alto rendimiento

A pesar de que la cultura argentina tiene cierto grado de colectivismo que favorece la conformación de los equipos, los comentarios de los DP coinciden en que existe una gran dificultad en armar aquellos que son de alto rendimiento. Las causas son variadas y comentan que, para lograrlo, se requiere tiempo, sacrificio, comunicación, paciencia, persistencia, encontrar las personas adecuadas y lograr la sinergia entre ellas.

Como consecuencia, la formación de equipos de alto rendimiento requiere una dedicación sustancial por parte del DP.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al director de proyecto que planifique el tiempo necesario y le dedique su atención al tema para lograr los resultados deseados.

¿Masculinidad o femineidad?

Es importante aclarar que esta dimensión no hace referencia a temas de género o aspectos biológicos. Simplemente describe las expectativas culturales en distintas partes del mundo, indicando comportamientos generales. En efecto, hay culturas en las que el comportamiento masculino está relacionado con la asertividad y la búsqueda del éxito, mientras que el comportamiento femenino está relacionado con la ternura y la preocupación por los demás. En cambio, en otras, tanto el comportamiento masculino como el femenino tienen que ver con la preocupación por el otro. Nuestra cultura está más cerca del primero que del segundo.

Este aspecto de la cultura afecta lo siguiente:

- El comportamiento del DP.
- Los tipos de liderazgo del DP.
- La relación entre el DP y los interesados del proyecto.

Comportamiento del Director de Proyecto

El comportamiento masculino de la cultura argentina sustenta la consideración de que el DP debe tener un comportamiento asertivo, con objetivos claros. Esta característica disminuye la incertidumbre ya que es lo contrario a la duda y a la indecisión. El DP debe ser firme, entendiendo la firmeza como empatía; sólido en sus convicciones; auto-disciplinado; motivador; claro en sus objetivos; dispuesto a escuchar; y con un estilo más libre de colaboración,

orden y organización, donde haya lugar para el disenso y el intercambio de ideas.

Se rechaza el autoritarismo, representado por la imposición; el exceso de orden, de regulaciones y de reglamentos; la inflexibilidad; la falta de humildad para reconocer el error y de palabras de agradecimiento, entre otras cosas.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al Patrocinador que elija un perfil para su director de proyecto que tenga las siguientes características:
>
> - Asertividad, representada por la firmeza en defender el proyecto, con convicción y claridad de pensamiento y objetivos.
> - Empatía para con el equipo de trabajo.
> - Flexibilidad, para evitar el autoritarismo, la rigidez y el exceso de regulaciones.
>
> Asimismo, les sugiero al patrocinador y al DP que busquen un equilibrio entre las normas y regulaciones de la organización y las necesidades del proyecto para evitar una carga burocrática sin sentido.

Relaciones con los interesados

El DP debe proteger el alcance del proyecto, comunicarse sin dudas ni vacilaciones y definir claramente el momento y lugar de la participación del interesado. También es importante saber discernir el

momento en ser flexible para adecuarse a sus requerimientos o demandas.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al DP que mantenga una actitud de firmeza con respecto a lo ya mencionado, sin nunca perder el respeto necesario para mantener una buena comunicación. Por otro lado, le sugiero evaluar a los interesados desde el punto de vista de las relaciones interpersonales para evaluar el menor o mayor grado de flexibilidad en el trato con ellos.

La incertidumbre

Hace algunos años, la empresa donde trabajaba fue comprada por un grupo dinamarqués. Esto significó un terremoto cultural, dado que pasamos de ser una empresa multinacional norteamericana a una multinacional dinamarquesa. Había que acostumbrarse a la nueva cultura organizacional y a las nuevas culturas de quienes serían los encargados de la transición y, posteriormente, de la gestión.

El problema que inmediatamente se presentó fue el sistema ERP[7] utilizado. Nosotros empleábamos Oracle 11i. Ellos SAP. Son totalmente diferentes, en concepción y en tecnología.

Mi primer encargo en la nueva gestión fue mudar todo nuestro pequeño centro de cómputos a las oficinas de los compradores en Puerto Madero. Pequeño proyecto, pero había que trasladar equipos de red, UPS y servidores y dar de baja servicios y no se podía interrumpir el trabajo de la organización. La iniciativa se realizó sin mayores inconvenientes con las dos oficinas funcionando a la vez y, en relativamente poco tiempo, estábamos todos trabajando en el mismo lugar.

Mi segundo encargo, un tanto extraño porque ya había un director de TI para Sudamérica, fue realizar una revisión de los sitios de la empresa dinamarquesa en Sudamérica. Los primeros meses realicé una serie de viajes y al terminar presenté un informe acerca del estado de la tecnología de la información (TI) en los países donde había subsidiarias. Uno de los temas recurrentes, claramente

reflejado en mi reporte, fueron las dificultades de adaptar SAP a las peculiaridades de cada país.

Basado en este reporte, Flavio, el director de TI, de origen brasileño, recomendó esperar un tiempo para hacer la migración hasta que el negocio en Argentina se estabilizara. Pero Sven, director financiero de Sudamérica, no estaba de acuerdo.

Hablemos de Sven. Era un expatriado que se había acostumbrado a Brasil, aunque no le gustaba, según sus propias palabras. Un dinamarqués alto, de buen porte, pero muy poco amigable, muy cerrado en sí mismo, al que raras veces vi sonreír. No compartía nada con el personal y, según me comentaban, tampoco lo hacía en Brasil. Sus únicas relaciones eran el presidente para Sudamérica y algún otro expatriado dinamarqués.

Por el otro lado teníamos a Flavio, nativo de su país, expansivo, de buen carácter, divertido, hincha de Palmeiras, con el que amistosamente nos peleábamos por el fútbol, típica situación cuando un argentino y un brasileño se encuentran socialmente.

Las culturas de Argentina y de Brasil evitan la incertidumbre. No nos gusta. Queremos las cosas claras y nos tapamos de leyes y normas para lograrlo. Claro que se nos va la mano y, la mayoría de las veces, resulta contraproducente. Para la cultura dinamarquesa la incertidumbre es parte de la vida. Sven, por lo tanto, decidió que SAP se debía implementar de inmediato, sin importar mucho los riesgos, para estupor de su director de TI.

Vamos a hacer un paréntesis acá, para comentar un poco mi situación. A esta altura de los acontecimientos, yo ya estaba "despedido". En realidad, yo sabía que, en poco tiempo, ya no iba a trabajar más en la empresa, lo que me ponía en un estado de un cierto desapego del trabajo, aunque por una cuestión personal seguía haciéndolo bien. Por eso, cuando Flavio me pidió que realizara una evaluación de los riesgos de una instalación, lo hice profesionalmente, sin tener en cuenta cuestiones políticas como lo quería Sven, aunque eso me pudiera afectar. Simplemente enumeré y describí todos los riesgos asociados a semejante migración en una forma clara y concreta, sin suavizar en nada las conclusiones. El reporte fue enviado y, como precaución, lo copié a Mark, el director de TI de la región Américas, al que conocía desde hacía varios años.

Durante dos días hubo silencio de radio. Para mi sorpresa, al tercer día, Sven apareció por la oficina de Buenos Aires y me indicó que quería hablar conmigo.

"Gustavo, este reporte es demasiado negativo. Para evitar estos problemas, ¿no hay forma de migrar los datos inmediatamente, utilizando la instalación que tenemos en Brasil?".

Para quienes conocen algo de sistemas, saben que esa pregunta encierra una serie de peligros tan grandes como estar descalzo en un nido de yararás, con los ojos vendados. Le expliqué que existían una serie de inconvenientes, tanto técnicos como funcionales para hacer lo que él quería y le dije que, si tenía alguna duda sobre mis conclusiones, las enviara a Copenhage para que ellos las evaluaran.

Después me hizo la siguiente pregunta: “¿Y si creamos una nueva empresa en Oracle 11i con exactamente los mismos parámetros que la actual y trabajamos desde allí?”. Nuevamente, le respondí que la implementación de una nueva empresa en Oracle no era una cuestión de un fin de semana, como él pensaba, y que requería un análisis del negocio para poder reflejar sus reglas y las sutilezas (dicho irónicamente) de gestión, tales como plan de cuentas, tablas de precios, reportes e informes, clientes con su situación crediticia, etc.

Me escuchó, no dijo nada y se fue. Al poco tiempo, Flavio me llamó y me comentó que TI central había apoyado mi reporte en un 100% y que recomendaban esperar hasta después del cierre del primer balance de la nueva sociedad. Además, supe después que Mark había rechazado el plan de Sven y había recomendado no realizar la migración hasta que la situación en Argentina se hubiese estabilizado. Hubo otra serie de capítulos en esta saga, pero, a los efectos del ejemplo, con esto es suficiente.

Culturalmente hablando, Flavio y yo estábamos en las antípodas de Sven con respecto a la incertidumbre. Sven había participado en la implementación de SAP en Brasil, pero creía, desde un punto de vista cultural, que la incertidumbre es parte de la vida y consideraba que nuestra posición era extremadamente conservadora y frustrante para él. A su vez, Flavio y yo creíamos que su posición era demasiado arriesgada y que los que iban a pagar el precio por los problemas que se iban a presentar éramos él y yo. O, simplemente, él, porque yo ya no estaría en lo organización. Por otro lado, todos

los involucrados teníamos una mirada de corto plazo y Sven, siendo el jefe, quería resultados rápidos.

Al final, TI central tomó el liderazgo y envió una serie de consultores que implementaron SAP en Argentina, recién después del primer cierre de la nueva sociedad. Para aquel momento, yo ya me había ido de la empresa, pero seguía recibiendo información de los amigos que quedaron.

La Real Academia Española define a la incertidumbre como la 'falta de certidumbre'; a esta última como 'certeza' y esta, a su vez, como el 'conocimiento seguro y claro de algo. La cultura argentina tiene un alto grado de evitación de la incertidumbre, lo que indica que, en general, desea ´tener las cosas claras, contar con la información necesaria para tomar decisiones y evitar todas aquellas situaciones donde el desenlace no está explícitamente establecido.

Este aspecto de la cultura afecta lo siguiente:

- Las reglas de juego del proyecto.
- Las normas y regulaciones por desarrollar y aplicar.
- Los roles y responsabilidades.
- La forma en que vamos a planificar y controlar los costos y la calidad.
- La toma de decisiones.
- La innovación y la planificación.
- La libertad de expresión.
- La visión del proyecto y la actitud del DP.

Reglas claras

Como sociedad, esperamos reglas de juego claras. No hay nada peor, para los argentinos, que no saber qué es lo que va a pasar. Nos sentimos impotentes, nerviosos, malhumorados, agresivos. Los chismes y rumores funcionan a toda máquina, porque tenemos la necesidad de tener algo de información, que haga el futuro menos incierto, aunque después todo lo dicho no sea cierto. Creamos escenarios en nuestra mente, pero no los documentamos ni buscamos respuestas para evitar que se cumplan o gestionarlos en caso de que ocurran. Como nuestra necesidad de certidumbre es tan grande, creamos normas, leyes, regulaciones, limitaciones para encorsetar la realidad. Sin embargo, casi siempre, este corsé que fabricamos para evitar la incertidumbre es tan asfixiante que buscamos formas "alternativas" de hacer las cosas.

La claridad, en un proyecto, tiene que ver con varias cosas. ¿Adónde vamos con este proyecto? ¿Cuáles son las cosas que van a ser nuevas y aquellas que van a cambiar? ¿Cómo me va a afectar, ya sea positiva o negativamente? ¿Qué beneficios va a traer para mí y para la organización? ¿Me va a permitir crecer o voy a perder mi trabajo? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Voy a tener que trabajar más? Todas estas, y muchas más, son preguntas válidas que nos hacemos en cualquier situación donde la incertidumbre es importante y no hay información clara. Entonces, es importante que el DP sea capaz de contestar estas preguntas, porque son totalmente válidas.

Por eso, hay que tener en cuenta la gestión de los recursos y de los interesados. La comunicación con ellos debe ser transparente e, incluso cuando el proyecto es altamente innovador, el DP debe esforzarse para, dentro de lo posible, ser claro en lo que va a

comunicar. El DP es como un faro que provee luz en la noche. Ilumina el rumbo y marca los peligros. Es la persona de consulta en lo que se refiere al proyecto.

También hay que tener en cuenta las expectativas. La Real Academia Española, define la expectativa como 'la esperanza de realizar o conseguir algo', 'la posibilidad razonable de que algo suceda' o 'la posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé'. Las expectativas son motores en el proyecto. Si una persona espera obtener algo para sí, puede decidir involucrarse más en la iniciativa, que si no hubiese tenido expectativa alguna. No obstante, esto es un arma de doble filo. Si un director de proyecto gestiona mal las expectativas, no solamente va a crear incertidumbre, sino que va a perjudicar el proyecto. En efecto, si no cumple con lo que prometió o los resultados que fueron acordados no aparecen o no cumplen con lo convenido, la incertidumbre comienza a crecer y aparecen comportamientos negativos que necesitamos evitar.

Como si esto fuese poco, está el problema/oportunidad del cambio. Todos habitamos nuestra zona de confort, lugar en el que nos sentimos seguros, donde todo está en orden, donde es razonablemente predecible el día a día y donde las cosas suceden como uno espera. Un proyecto hace temblar esa zona. Ese temblor, automáticamente, se transforma en incertidumbre y comienzan a aparecer los comportamientos negativos.

Por último, está la confianza. La confianza es uno de los bienes más preciados en una relación de trabajo. El hecho de poder confiar en la

otra persona impacta directamente en la certidumbre de la relación, lo que, a su vez, evita la aparición de los comportamientos negativos comentados anteriormente.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero a la organización, especialmente al patrocinador del proyecto y al DP, que ponga a disposición de todos los interesados toda aquella información que traiga claridad al proyecto, incluyendo cuestiones tales como organigramas, roles y responsabilidades definidos, relaciones jerárquicas, alcance bien desarrollado, presupuesto y riesgos precisamente establecidos, entre otras. Toda información que se pueda hacer disponible debe ser comunicada, siempre dentro de un plan establecido y teniendo en cuenta la natural confidencialidad que cierta información tiene. Además, el patrocinador y el DP deben estar dispuestos a responder preguntas de superiores y subordinados y a actuar con rapidez cuando aparecen cuestiones que afectan la claridad buscada.
>
> Incluso si el proyecto es extremadamente incierto, es importante no ocultarlo y ser proactivo en la comunicación de las decisiones que se van tomando durante el transcurso de este.
>
> En los casos en que un proyecto debe cerrarse anticipadamente, cualquiera sea la razón, el DP debe comunicar, por iniciativa propia, a los interesados y al equipo de proyecto la situación y los motivos de la decisión. Cuanto

> antes desaparezcan las razones de la incertidumbre, más pronto se podrá continuar con el proceso, aunque este pueda ser negativo para algunos de los interesados.
>
> Asimismo, es conveniente, a los fines de la claridad, crear sistemas de control de cambio, por lo menos para metodologías predictivas, que permitan el seguimiento y comunicación de las modificaciones en el proyecto.
>
> Por último, sugiero que tanto el patrocinador como el DP hagan todo lo posible por generar una relación de confianza entre todos los integrantes del proyecto, con el fin de reducir, al máximo posible, todo posible desarrollo de comportamientos negativos que actúen en desmedro del proyecto. La clave pasa por no prometer nada que no se pueda hacer, no mentir y si se promete algo, cumplirlo.

Normas y regulaciones

Un aspecto ciertamente positivo, en la medida que no sea excesivo, es el desarrollo de reglas y normas que auxilien a la gestión del proyecto. Estas deben estar cuidadosamente formuladas e implementadas para evitar que se restrinja la libertad de acción. En efecto, reglas demasiado estrictas, tales como las que pueden ser observadas en organizaciones públicas, pueden complicar la gestión, provocando frustración en los participantes en un proyecto.

Las reglas son beneficiosas si ayudan a:

- Definir comportamientos aceptables. Dentro de una organización tendremos comportamientos culturales y comportamientos organizacionales. Ambos deben ser gestionados, teniendo en cuenta las diferencias individuales y culturales y las necesidades del proyecto.
- Establecer conductas que potencian la dinámica y las posibilidades del proyecto. Por ejemplo, si se estimula la iniciativa y la innovación desde la organización, el DP, dentro de su proyecto, debe hacer lo mismo. El hecho de tener dos estándares de comportamiento provoca incertidumbre, que es particularmente nociva para nuestra cultura. Asimismo, si dentro del proyecto se genera un comportamiento que es positivo para este, el DP debe comunicarlo a la organización para poder evaluar su implementación en esta. Por otro lado, toda iniciativa que se ponga en práctica en el proyecto y no tenga valor debe ser eliminada rápidamente. No hay peor incertidumbre que la de no saber si se debe cumplir con algo o no.
- Incrementar la seguridad y la confianza en la ejecución. La ejecución de un proyecto es una etapa particularmente especial. Es en esta instancia donde el trabajo que se realiza va a generar las cosas que el proyecto debe entregar. Las normas que permitan mejorar la confianza y la seguridad son fundamentales para la certidumbre.
- Contener y encauzar la libertad de acción. La libertad de actuar en un proyecto es importante, en la medida en que la acción sea beneficiosa para este. Toda norma que vaya en ese sentido debería ser tenida en cuenta por el DP para ser evaluada e implementada desde las primeras etapas del proyecto.

- Dar un marco de referencia para la gestión. Dan sustento a las decisiones por tomar. Por ejemplo, normas que definan niveles de aprobación para realizar compras o para contratar personal así como la forma de llevar adelante el control del presupuesto o cómo administrar un cambio.
- Alejar el caos. El caos es la incertidumbre al máximo. Cada quién hace lo que quiere y el estado de caos en un proyecto es lo peor para su devenir. Las reglas y normas dan un marco de referencia y auxilian a las personas que se encuentran en una situación desconocida o no usual, para entender el curso de acción que se debe tomar.
- Poner en claro los límites. Sin límites, caemos en el caos y en la ley del más fuerte. Desafortunadamente, tenemos una cantidad de desgraciados sucesos en la historia argentina por falta de límites. En el proyecto, es importante poner límites, sobre todo ante la natural tendencia a cambiar cosas para beneficio individual, lo que no siempre es bueno para el proyecto. Un ejemplo de este tipo de normas es el proceso de control de cambios, que regula la forma en que van a realizarse los cambios en el proyecto.
- Ordenar, organizar e incrementar las probabilidades de éxito del proyecto. Las normas, al determinar lo que se puede hacer y lo que no, permiten ordenar la toma de decisiones adecuadas para el proyecto. De esta manera se generan las condiciones necesarias para llegar al éxito.
- Definir el rol de las personas y enfocar la energía. La definición del rol es sumamente importante. Roles mal definidos o difusos generan incertidumbre. Un buen esquema de roles y

responsabilidades, además de contribuir al bienestar del equipo aclara las líneas jerárquicas y los canales de comunicación.
- Mantener un ambiente prolijo dentro del proyecto, incluso en proyectos inciertos e innovadores. Cuanto más inciertos sean los proyectos, más importante es construir un sistema de soporte para los miembros del equipo. Esto se puede lograr con esquemas de acción que indiquen el comportamiento que se debe seguir en determinadas circunstancias o el tipo de información que se puede distribuir y cómo distribuirla.

Una buena práctica es mantener un canal de comunicación abierto con el equipo de proyecto y con los interesados respecto a las reglas y normas aplicadas. De estos intercambios surgen, muchas veces, cambios beneficiosos o comentarios referidos a lo que se aplica, que pueden mejorar el clima del proyecto. Por otro lado, esto puede ayudar a evitar que se cree un clima burocrático que disminuya o anule las capacidades y habilidades del equipo de proyecto y que agobie de responsabilidades al DP y a los interesados.

Por último, las normas son fundamentales en los proyectos internacionales. La cantidad de personas, culturas, jerarquías, canales de comunicación y decisión involucrados hace que este tema sea muy importante. El DP debe tener en cuenta este tema para poder gestionar adecuadamente todos los recursos del proyecto.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero a la organización, especialmente al patrocinador del proyecto y al DP, que cree normas dentro de los proyectos,

> incluyendo cuestiones culturales, complementando las que usualmente se desarrollan en el área de RR. HH., Finanzas, Compras, etc. Por ejemplo, se pueden diseñar normas que guíen la distribución de información, reglas básicas de comportamiento y recompensas, y lineamientos referentes a la colaboración entre miembros del equipo, entre otras. El patrocinador y el DP tienen la responsabilidad de crearlas y de aplicarlas, para ayudar al éxito del proyecto.
>
> Asimismo, sugiero que se dedique una reunión en forma periódica a la revisión de la normativa utilizada, a fines de mejorarla, de comunicar aquellos cambios que sean beneficiosos para la organización y de eliminar todo aquello que sea nocivo para el proyecto.

Roles y responsabilidades

Los roles y las responsabilidades en un proyecto son importantes para entender las relaciones entre las personas y permiten realizar consultas y escalar las decisiones al nivel adecuado. Es bastante común que los integrantes de una organización consideren que su nivel de decisión y sus responsabilidades son mayores que las que corresponden a su posición. Esto puede darse, entre muchas otras causas, por desconocimiento de la estructura, por la falta de claridad en la comunicación o por, simplemente, la búsqueda del individuo en cuestión de mayor poder por ambición personal. La claridad en los roles y responsabilidades evita que lo antes mencionado se manifieste en el proyecto y ayuda a disminuir la incertidumbre.

Otra herramienta fundamental es el organigrama, que se utiliza junto con los roles y las responsabilidades para proporcionar claridad a los interesados. Ayuda a entender, a simple vista, la estructura de una organización, sea permanente, como una empresa establecida, o temporaria, típica de la gestión de proyectos. Representa los recursos involucrados, sus relaciones jerárquicas y permite una gestión adecuada de estos.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero a la organización, especialmente al patrocinador del proyecto y al DP, que desarrolle el organigrama y los roles y responsabilidades, con el mayor detalle posible, compatible con el tipo de proyecto por realizar y, sobre todo, que lo comunique y lo mantenga actualizado. Así, se disminuye la incertidumbre y se definen, con claridad, las estructuras de poder y autoridad y las relaciones entre los distintos niveles.
>
> Asimismo, le sugiero que mantenga actualizados ambos documentos para evitar problemas y pérdida de claridad en momentos en los que puede haber cambios de integrantes del equipo, por ejemplo, por cambio de proveedores, por nuevos proyectos, etc.
>
> Por otro lado, enfatizo la importancia de comunicar adecuadamente cualquier cambio que ocurra, recordando que la información oportuna permite disminuir la incertidumbre y la toma de decisiones correctas.

Costos

En general, los costos son una de las variables a las que se les presta más atención en los proyectos, aun en aquellas organizaciones que no utilizan metodologías de gestión. Los costos deben desarrollarse lo más profesionalmente posible, teniendo en cuenta no solamente el proyecto, sino las metodologías de control utilizadas. Desde el punto de vista de la incertidumbre, se busca el mayor detalle posible, que genere claridad, entendiendo que la información puede estar impactada por el plazo, el tamaño y la incertidumbre del proyecto. Aun en condiciones de incertidumbre, el hecho de contar con un flujo de caja estimado brinda, por lo menos, una idea de los egresos y, eventualmente, ingresos que pueden ocurrir en el proyecto.

> **Sugerencia cultural**
> Les sugiero al patrocinador y al DP que creen reglas claras en cuanto al detalle y al tratamiento de los costos, generando consenso con el resto de los interesados clave, teniendo en cuenta que el mayor detalle requiere mayor control y que los recursos deben estar disponibles para ello.

Calidad

Como lo mencioné atentamente, la calidad se entiende como la satisfacción de los requerimientos del cliente. Para ello, el DP debe ser claro en la forma en que va a tratar estos requerimientos, a través de normas específicas y de un plan de gestión de la calidad. Esto brindará tanto al equipo de trabajo como a los interesados correspondientes, la certidumbre necesaria para interactuar entre sí y la seguridad de que los requerimientos van a ser considerados,

ordenados por prioridad y aceptados o, con la justificación correspondiente, rechazados o pospuestos para una nueva oportunidad.

Por otro lado, la presencia de expertos en calidad brinda certidumbre en el aseguramiento de procesos y en el control de los entregables, haciendo el proyecto más previsible y controlable.

Por ello:

> **Sugerencia cultural**
> Les sugiero al patrocinador y al DP que involucren al área de Calidad de la organización y que generen un plan de gestión de la calidad que contenga las normas correspondientes al producto del proyecto y al modo de gestionar este aspecto en lo que se refiere a los requerimientos de los interesados, con el fin de mitigar la incertidumbre sobre la calidad.

Toma de decisiones y riesgos

Las personas que lideran deben, tarde o temprano, lidiar con la toma de decisiones que conllevan riesgos. Para una cultura como la nuestra, la toma de decisiones riesgosas en el proyecto, si bien es inevitable y parte de la profesión, no deja de ser un tema de preocupación.

Ahora bien, recordemos que Argentina es uno de los muy pocos países con alta evitación de la incertidumbre, que no hace una buena planificación de los riesgos, por lo que existe una contradicción entre nuestro deseo de tener todo claro y la falta de, aunque menos sea,

una lista de los riesgos del proyecto. Esto es una incoherencia que los investigadores han sugerido que se investigue, de modo que si usted, estimado lector, está buscando un tema para investigar, acá tiene uno.

Siguiendo con el asunto, es importante la identificación y definición sin ambigüedades de los riesgos del proyecto. Esto implica que estos deben definirse en forma específica, dejando de lado generalidades (Project Management Institute, 2019, p. 33). Por ejemplo, no es lo mismo declarar un "riesgo de enfermedad", donde una enfermedad puede ir desde un resfrío hasta un trastorno muy serio de salud, como declarar que existe el riesgo de una epidemia de gripe por las condiciones climatológicas esperadas durante el transcurso del proyecto.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al DP que realice un muy buen análisis del riesgo del proyecto, para disminuir la incomodidad resultante de la toma de decisiones. También, le sugiero al patrocinador que busque la compatibilidad del perfil de riesgo del DP con el del proyecto.
> Por último, recomiendo que el DP dedique el tiempo necesario para la identificación precisa de amenazas y oportunidades, siguiendo la teoría expresada en textos acerca de gestión de riesgos de proyectos tales como el *PMBOK®* y el *The Standard for Risk Management of Portfolios, Programs and Projects* del PMI.

Contratos

Los contratos deberían servir para disminuir la exposición al riesgo en una relación comercial. Para que eso ocurra, estos deben fijar un marco claro en el que el contratado desarrollará su actividad, incluyendo su responsabilidad, el alcance de la tarea, el plazo y los entregables. Además, el DP debe asegurar una buena gestión del contrato y del proveedor para ayudar al éxito del proyecto. Todo esto aporta claridad a la relación entre el contratante y el contratado, muy importante para que el proyecto llegue a buen puerto.

Ahora bien, existen situaciones en las cuales el tipo de trabajo por realizar no requiere de un documento formal firmado por ambas partes. En estos casos el DP debe garantizar la precisión en la transmisión de la información para evitar malos entendidos con respecto del alcance de la tarea y de aspectos de honorarios y financieros.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al DP que involucre al área de legales de la organización en toda tarea que tenga que ver con la confección y análisis de contratos. Le recomiendo también que, aunque haya un contrato firmado, este se considere como una fuente de riesgos que se debe gestionar.
>
> Por otro lado, sugiero que en el caso de que no exista contrato con el proveedor, por tratarse de algún ítem menor, se deje asentado en algún documento del proyecto el motivo de la contratación y lo que este debe suministrar.
>
> Por último, y fuera de las sugerencias culturales, recomiendo que todo período de tiempo asignado a las actividades de

> confección y revisión de contratos sea considerado como fuente de riesgos por retrasos. Les aseguro que me lo van a agradecer.

Innovación

En contradicción con la necesidad de evitar la incertidumbre y de tener todos los aspectos del proyecto bajo control, los DP, dentro del marco general de la iniciativa, consideran la innovación como un elemento para fomentar. Este comportamiento es interesante, porque el proceso de innovación implica algo nuevo, cambios, la falta de reglas, lo que es fuente de incertidumbre.

Sin embargo, contrariamente a lo esperado, ellos opinan que esta elección potencia el rendimiento, innovando las formas de trabajar; que dota de riqueza al proyecto, generando nuevas oportunidades; que aporta ideas creativas para la solución de problemas y que ayuda a adaptarse y a confluir hacia objetivos cambiantes.

Por supuesto, dado que, después de todo, nos gusta evitar la incertidumbre, los DP recomiendan tener en consideración la planificación, la capacitación del equipo, la evaluación de riesgos, el soporte a las actividades de innovación, la etapa del proyecto en que estas se produzcan y la metodología utilizada, todo esto para dar un marco y encauzar las novedades que se pudiesen producir.

Desde un punto de vista técnico, en general, los DP consideran que las metodologías ágiles y las etapas iniciales de un proyecto son las más proclives a la innovación.

> **Sugerencia cultural no coincidente**
> Le sugiero al DP que se tenga en cuenta la creación de un marco de gestión de la innovación, dado que este se considerada un elemento importante para lograr el éxito del proyecto.

Planificación

En oposición a la necesidad de controlar y planificar en detalle para evitar la incertidumbre, la preferencia generalizada es trabajar con una planificación no muy pormenorizada, de más alto nivel, con mayor flexibilidad. Sin embargo, esta decisión depende del objetivo y tipo de proyecto. Los factores que afectan son la metodología que se va a utilizar, dado que la metodología ágil tiene otra forma de gestionar las actividades que se realizan en el proyecto; el alcance; los recursos con los que se cuenta; el dinamismo de la organización; y el contexto de la iniciativa.

> **Sugerencia cultural no coincidente**
> Le sugiero al cliente o al patrocinador que, si desean una planificación detallada, deben ser específicos en este requerimiento y deben tener en cuenta los factores anteriormente comentados. Es importante entender que esta va a necesitar de mayores recursos o de más tiempo para ser desarrollada y deben tener en cuenta que esos requerimientos van a tener que ser provistos por la organización que realiza el proyecto.

Libertad de expresión

En una cultura con un UAI alto, la tolerancia de opiniones diferentes es baja. Sin embargo, la mayoría de los DP concuerdan en que la libertad de expresión para con el patrocinador o el DP es fundamental para lograr acuerdos, obtener mejores ideas y tomar mejores decisiones y evitar tanto pensamientos grupales; —cuya uniformidad va en desmedro del proyecto— como callar lo que a los jefes les disgusta. Lograr esta libertad corresponde al DP, debido a su rol en el proyecto.

Por otro lado, algunos DP proponen que debe haber algunas limitaciones, pero consideran que es muy importante poder expresarse libremente, teniendo en cuenta que la retroalimentación es fundamental. Así, aseguran que la entrevista personal es la mejor herramienta para lograr esto y que el destinatario debería ser el DP, comportamiento que coincide con un PDI medio.

De todas formas, ya sea grupal o individualmente, la forma en que se exprese esa opinión es importante para enriquecer el trabajo en equipo y no generar conflicto. En este sentido, las reglas de comportamiento ya mencionadas en una sección anterior son un buen instrumento para implementar en el proyecto.

> **Sugerencia cultural no coincidente**
> Le sugiero al DP que desarrolle una cultura de libertad de comunicación que permita la expresión de ideas, con respeto y tolerancia, hacia él mismo y, eventualmente, hacia el patrocinador del proyecto.
>
> Además, es importante que, dentro de este contexto, aplique las habilidades interpersonales de escucha activa y

> aceptación de la retroalimentación para que todo el ejercicio de libre comunicación tenga sentido.

Visión positiva

En una cultura como la argentina, es característico el enfoque en lo que puede salir mal. Esto provoca que la visión del riesgo de un proyecto sea más pesimista de lo esperado y que se retroalimente en forma negativa ante cualquier riesgo materializado. Sin embargo, los DP coinciden en que se debe tener una visión positiva, enfocándose en lograr los objetivos y protegiendo el valor del proyecto para lograr el éxito, sin descuidar, mediante la gestión de los riesgos, lo que puede, potencialmente, salir mal.

> **Sugerencia cultural no coincidente**
> Le, sugiero al DP que mantenga, por un lado, una actitud positiva, enfocándose en el trabajo y en encontrar oportunidades de mejora y, por otro lado, una fuerte orientación a la planificación y gestión de los riesgos.
>
> Asimismo, es importante que el DP sostenga una comunicación con el equipo de trabajo, con los interesados en general y con el patrocinador en particular, transmitiendo esa visión positiva, pero involucrando a las partes en todas las actividades de gestión de los riesgos.

La planificación y los resultados

A partir del año 2011, desarrollé un ejercicio para determinar la capacidad de planificación de los asistentes a los cursos que yo dictaba. En todos los de Argentina, los resultados fueron, invariablemente, malos. Los alumnos dejaban de lado esa etapa y se enfocaban en la ejecución del proyecto, con los problemas que eso trae en la gestión profesional de los proyectos.

La tendencia era buscar el resultado inmediato y terminar, de cualquier manera, el ejercicio. Una vez terminado, con un par de preguntas, literalmente les destruía el marco de trabajo que habían desarrollado y les mostraba la importancia de la planificación. Desafortunadamente, tenemos numerosos ejemplos de este problema en la historia reciente de Argentina.

La planificación es fundamental para lograr los resultados deseados y, para ello, necesita que se le dé el tiempo que corresponda. Debido a que tenemos una orientación al corto plazo, muchas veces queremos que los resultados sean inmediatos y no se madura la forma de llegar a ellos, lo que trae, como consecuencia, problemas tales como cambios no deseados, conflictos con interesados, incremento de los riesgos, mayores costos, baja calidad, etc.

Este aspecto de la cultura impacta sobre lo siguiente:

- El apoyo al DP.
- El agotamiento físico en el proyecto.
- Los reconocimientos y recompensas.

- Los costos.
- Las presiones en el proyecto.
- Los cambios.
- La formación de equipos.

Las siguientes sugerencias toman en cuenta aspectos puntuales que tienen que ver con la planificación, pero es importante que tanto el patrocinador como el director de proyecto, tengan en cuenta que es necesario dedicar el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar la planificación apropiada del proyecto.

Amigos o expertos

Todos los DP entrevistados coinciden en que todo tipo de consultas técnicas deben ser realizadas a expertos. Una excepción a este comentario ocurre cuando lo que se consulta tiene que ver con la relación con otras personas. En ese punto, ellos coinciden en que un amigo va a proveer mayor y mejor información acerca del tema que un experto.

> **Sugerencia cultural**
> Les sugiero tanto a la organización como al patrocinador que se abstengan de contratar —o imponer— individuos como expertos por ser “amigos de” o “recomendados por”. No solamente puede ser disruptivo para el DP y para el equipo de proyecto, sino que puede incrementar el riesgo de este.

Agotamiento físico

Uno de los peligros que acechan al DP y a los miembros del equipo de proyecto, es el agotamiento físico por las exigencias a las que se enfrentan. En la cultura argentina, donde la mirada a corto plazo es dominante y la búsqueda de resultados inmediatos está generalizada, este peligro es claro y presente.

El agotamiento trae, como consecuencia, errores de análisis y de acción, falta de claridad, incremento de riesgos y costos, y conflictos. Nuevamente, existen demasiados ejemplos acerca de este tema en la historia argentina como para dejarlo de lado.

Si bien es posible que haya momentos en el proyecto en que sea necesario incrementar las horas de trabajo, esto no puede prolongarse mucho en el tiempo. Por ello, considero que el descanso y la libertad de elegir las tareas no son temas secundarios. En ambos casos, se genera compromiso y motivación y deben ser tomados en cuenta. Nuevamente, el exceso de trabajo puede existir por razones que tienen que ver con la situación del proyecto, pero debe ser totalmente coyuntural. Si se transforma en una costumbre, el equipo de trabajo sufrirá las consecuencias con el correspondiente aumento de riesgo del proyecto y la consiguiente desmotivación.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al DP que planifique períodos de descanso o reserve tiempo para ellos, para compensar momentos en que las circunstancias del proyecto obliguen a un aumento de la dedicación de los miembros del equipo. Además, debe tener en cuenta que puede llegar a ser necesario resistir las presiones de otros interesados para que el exceso de trabajo

> sea una constante en proyecto. Por otro lado, aconsejo dar una cierta libertad en la elección de las tareas por realizar, con el fin de aumentar la motivación y generar mayor compromiso con el proyecto.

Reconocimiento y recompensa

La ayuda reciproca de miembros del equipo debe reconocerse. En una cultura que espera que todo suceda de inmediato, ese reconocimiento debe realizarse a la mayor brevedad posible. Esto favorece la integración y formación del equipo.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al DP que desarrolle en el equipo una cultura de ayuda y de reconocimiento a la colaboración, con énfasis en la inmediatez, y que, en los casos en que lo considere necesario, realice la distinción él mismo.

Detalle de los costos

Si bien se pretenden resultados a corto plazo, eso no quiere decir que el detalle de los costos sea dejado de lado. Es por ello que se pretende que este tenga la información necesaria, en función del proyecto y del control que se deba realizar. Una posible guía de cómo actuar se encuentra en el CAPEX[8], que va a determinar cómo se pueden llegar a distribuir los costos.

> **Sugerencia cultural**
> Le sugiero al DP que el patrocinador y el DP determinen cuán

> detallados deberán ser los costos, en función del plazo y del control que se desee realizar.

Presiones

Las presiones de los interesados para obtener resultados de inmediato o en el corto plazo, comportamiento cultural típico de Argentina, son contraproducentes para los objetivos del proyecto. Los DP enfatizan que deben ser obtenidos en función de la planificación, ya sea en el corto, mediano o largo plazo y que la responsabilidad de lograrlos es del DP. Es importante que exista una congruencia entre ellos y el objetivo final del proyecto. Un aspecto fundamental es la perseverancia, entendiendo que los objetivos deben ser alcanzados en el momento apropiado.

> **Sugerencia cultural no coincidente**
> Por un lado, les sugiero al patrocinador y al DP tener en cuenta que los resultados deben ser obtenidos en función de la planificación. Cualquier presión por parte de los interesados en otro sentido va a resultar en detrimento del proyecto y en un impacto negativo sobre sus líneas base.

Cambios en el proyecto

A pesar de que la cultura argentina valora la previsibilidad y evita la incertidumbre, las modificaciones en el proyecto son aceptadas, con algunas consideraciones. Los DP entienden que existen elementos que pueden afectar el proyecto y que como consecuencia, impactan sobre sus actividades. Entre ellos se citan, en general, lo incierto del

objetivo del proyecto, el ambiente externo y cuestiones internas de la organización que afectan el devenir de este. Sin embargo, agregan que los cambios no pueden ser anárquicos, sino que deben seguir un proceso de control y justificación y que deben contribuir a mejorar el objetivo del proyecto, reducir riesgos, satisfacer al usuario y al patrocinador y bajar plazos y costos.

> **Sugerencia cultural no coincidente**
> El cambio va a ser aceptado por los DP, pero les recomiendo al patrocinador y al DP que diseñen y pongan en práctica un sistema de control de cambios que sea acordado y utilizado por todos los interesados.

Formación de equipos

Si bien los procesos estrictos son preferidos en culturas con un alto UAI, como la argentina, en general, los DP indican que los equipos los forman la gente y el líder. Aceptan que las normas pueden ayudar dado que generan un estándar de las vinculaciones entre personas, pero que la construcción de los equipos depende de las personas que lo dirigen y componen.

> **Sugerencia cultural no coincidente**
> Las normas no son rechazadas, pero le sugiero al DP que ponga énfasis en las relaciones humanas y su efecto en los equipos de trabajo.

Disfrutar de la vida.

A los argentinos nos gusta disfrutar de la vida. Las reuniones con amigos, las grandes comilonas en familia, una charla en un café, las salidas a jugar fútbol, la diversión y pasar un buen rato, son una constante en nuestra cultura. Nos encanta gratificarnos con una buena comida, un buen vino y una charla agradable. Disfrutamos una buena guitarreada aunque seamos desafinados. Tratamos de arreglar el mundo en charlas de café que llegan hasta altas horas de la noche. Y esto, que es parte de nuestra cultura, lo llevamos a todas las actividades que realizamos.

Los proyectos se desarrollan en ambientes donde las presiones y tensiones son considerables. Por eso, es conveniente que se planifiquen momentos de distensión para que estas se reduzcan.

Esto posibilita:

- Reducir tensiones.
- Generar espíritu de equipo.
- Cohesionar dar retroalimentación al equipo.
- Agradecer a las personas por su trabajo.

Las actividades pueden nacerse dentro o fuera de la oficina, ya sea festejando etapas, hitos y acontecimientos (cumpleaños, nacimientos y logros personales, entre otros), o realizando acciones en las que se enfatiza la construcción, mejora, consolidación y gratificación del equipo y se destaca la relación que se construye por fuera de las actividades técnicas del proyecto.

> **Sugerencia cultural**
>
> Les sugiero al DP y al patrocinador que incorporen dentro de la planificación del proyecto, especialmente dentro del cronograma y de los costos, actividades que gratifiquen a los miembros del equipo. Entre ellas, por ejemplo, se pueden considerar compartir un almuerzo, informar y festejar los cumpleaños del mes o realizar una salida fuera de horario para disfrutar de un buen momento.

1. Una bocha es una bola que se utiliza en un juego muy común en Argentina, llamado, justamente, bochas, pero también es la palabra utilizada para pedir una porción de helado.↩

2. ¿Qué pediste de postre, Sergio?↩

3. Pedí dos…↩

4. Pedí dos… bolas de helado.↩

5. Este es el término correcto para hablar de bochas de helado en inglés.↩

6. Expresión en inglés que se interpreta como la etapa más avanzada en el desarrollo de algo.↩

7. Enterprise Resource Planning - Planeamiento de los recursos de la empresa. Sistema integrado de *software* que permite gestionar la organización completa y automatizar determinado tipo de procesos.↩

8. *Capital expenditure* - Gasto de capital↩

Conclusiones

La cultura nacional, tal como lo comenté anteriormente, importa. Afecta las interacciones entre las personas y la forma en que gestionamos el proyecto. Impacta sobre el modo como consideramos los riesgos, desarrollamos los costos y gestionamos la calidad. Influye sobre la manera como asumimos nuestros roles y responsabilidades, aceptamos y rechazamos comportamientos en los otros y participamos en el proyecto.

Las sugerencias culturales aquí presentadas tienen el objetivo de darle a usted, estimado lector, elementos de juicio para poder gestionar los proyectos desde el punto de vista de la cultura, mitigando los riesgos del proyecto que pueden provenir de este aspecto.

Espero, sinceramente, que pueda aprovechar lo escrito en estas páginas y que logremos mejorar la forma en que gestionamos los proyectos en Argentina.

Bibliografía

Bhagat, R. S., y Steers, R. M. (Eds.). (2009). *Cambridge Handbook of Culture, Organizations, and Work*. Cambridge University Press.

de Campoamor, R. (1892). *Doloras: Vol. I* (11.ª ed.). Librería de Garnier Hermanos.

Department of Defense. (1998). *MIL-HDBK-881 Work Breakdown Structure.pdf*. Department of Defense.

French, J. R. P., y Raven, B. (2001). The Bases of Social Power. En Jay M. Shafritz, J. Steven Ott, y Yong Suk Jang (Eds.), *Classics of organization theory* (5.ª ed., pp. 319-328). Harcourt College Publishers.

Gantt, H. L. (1913). *Work, wages, and profits*. Engineering Magazine Co.

Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures - Selected Essays.* (1.ª ed.). Basic Books, Inc.

Hall, E. M., y Hall, T. (1959). *The silent language* (Vol. 948). Anchor books.

Hofstede, G. (1983). Cultural dimensions for project management. *International Journal of Project Management*, *1*(1), 41-48. https://doi.org/10.1016/0263-7863(83)90038-8

Hofstede, G. H., Hofstede, G. J., y Minkov, M. (2010). *Cultures and organizations: software of the mind* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Hofstede, Geert, y Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. *Organizational Dynamics*, *16*(4), 5-21. https://doi.org/10.1016/0090-2616(88)90009-5

House, R., Javidan, M., y Dorfman, P. (2001). Project GLOBE: An Introduction. *Applied Psychology: An International Review*, *50*(4), 489-505.

Kelley, J. E., y Walker, M. R. (1959). *Critical-path planning and scheduling*. 160-173. https://doi.org/10.1145/1460299.1460318

Kluckhohn, F. R., y Strodtbeck, F. L. (1961). *Variations in value orientations.* Row, Peterson.

Kroeber, A. L., y Kluckchohn, C. (1952). Culture - A critical review of concepts and definitions. *Papers of the Peabody Museum of American Archeology and Ethnology*, *XLVII*(1), 223. http://www.pseudology.org/Psyhology/CultureCriticalReview1952a.pdf

Lewis, K. (1939). Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created «Social Climates». *The Journal of Social Psychology*, *10*(2), 269-299.

Minkov, M. (2007). *What makes us different and similar: a new interpretation of the world values and other cross-cultural data*. Klasika i Stil Publishing House.

Morden, T. (1999). Models of national culture – a management review. *Cross Cultural Management: An International Journal*, *6*(1), 19-44. https://doi.org/10.1108/13527609910796915

Müller, R., y Turner, J. (2004). *Cultural Differences Project Owner Manager Communication*. https://www.pmi.org/learning/library/cultural-differences-project-owner-manager-communication-8329

Project Management Institute. (2019). *The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs and Projects*. Project Management Institute.

Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership*. John Wiley & Sons.

Schwartz, S. H. (1994). Beyond individualism/collectivism: New cultural dimensions of values. En U. Kim, H. C. Triandis, Ç. Kâğitçibaşi, y G. Yoon (Eds.), *Individualism and collectivism: Theory, method, and applications* (Vol. 18, pp. 85-119). Sage Publications, Inc.

Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House.

Trompenaars, A., y Hampden-Turner, C. (1993). *Riding the Waves of Culture. Understanding Cultural Diversity in Business (3rd ed)*.

UNESCO. (1982). *Declaración de México sobre las políticas culturales.* UNESCO. https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf

United States. Bureau of Naval Weapons. Special Projects Office. (1958). *Program evaluation research task (PERT) summary report: phase 1* (p. 35). Special Projects Office, Bureau of Naval Weapons, Dept. of the Navy.

Zwikael, O., y Ahn, M. (2011). The Effectiveness of Risk Management: An Analysis of Project Risk Planning Across Industries and Countries. *Risk Analysis*, *31*(1), 25-37. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2010.01470.x
